

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़

पत्रांक १३.१२.२० / बाढ़ / दिनांक २१.१२.२०.....
प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय :- शीर्ष पी०एम०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत अकबरपुर से रामपुर (पैकेज संख्या - बी०आर०-२६आर०-१९५ तक पथ निर्माण का समय-वृद्धि के संबंध में।

महाशय,


उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शीर्ष पी०एम०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत अकबरपुर से रामपुर (पैकेज संख्या - बी०आर०-२६आर०-१९५ तक पथ निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है। योजना का बिन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।

1. स्थाल विडियो ग्राफी का सी०डी०
2. (1) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि ०९.०६.२०१८ है।
(2) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि ०८.०६.२०१९ है।
3. कार्य विशेष्टियों के अनुरूप किया जा रहा है। अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।
4. संलग्न सी०डी०।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि का एम०आई०एस० में ऑनलाईन प्रविष्ट कर कर समय वृद्धि के प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़


APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1 Name of Contractor :- Anil Kumar Thakur
2 Name of Work :- Akbarpur To Rampur
3 Agreement No. & Date :- 03-SBD-2018-19
4 Agreement Value :- 81,58,649-00
5 Date of Commencement :- 09-06-2018
6 Original Date of Completion :- 08-06-2019
7 Extension Previously Granted or not :- Not
8 Extension applied for :- 20-12-2020
9 Head :- P.M. 5.54
10 Percentage of Work Done :- 90 %

11 Reason of Hindrance Land Dispute - Covid-19
12 Recommendation by J.E. The statement of contractor is true hence time extension may be recommended upto 20/12/20
13 Recommendation by S.D.O. Recommended for time extension up to 20.12.20
14 Recommendation by the Executive Engineer :- TE. may be granted.
15 Recommendation by S.E. :-
16 Final Order of the C.E. :-

Anil Kumar Thakur

Signature
of the Contractor

ANIL KUMAR THAKUR

At+PO- Bhura, PS- Triveniganj, Dist- Supaul
Mobile-8210084649

Ref. No.....

Date

सेवा में,

श्री मान कार्मपालक कमिश्नर

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रोडम राह

प्रमाणित
28.3.19

विषय - अक्बर पुर से रामपुर PMWSY Road
के निर्माण के संबंध में

केशव

28/3/19

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि
विभाग निर्माण कार्य स्वरानामा के अनुसार
08-06-19 को कार्य समाप्त करना था परंतु जमीन
विवाद के कारण निर्माण कार्य समाप्त पूर्ण नहीं
हो सका।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विभाग
निर्माण कार्य का समय तुरंत स्वीकृत करने की
कृपा की जाए।

विश्वास मान

Anil Kumar Thakur.

A. H. K.

09/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

साल: - अंचल अधिकारी, ब्योसवरी (पटना)

प्रेषक,

पत्रांक 73

दिनांक 22.01.2020

अंचल अधिकारी,
ब्योसवरी (पटना)

सोपाने,

सहायक अभियंता
ग्रामाज कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, ब्योसवरी (पटना)

विषय: - सड़क निर्माण हेतु जमीन की नक्की के संबंध में।

प्रसंग: - भवरीय पत्रांक 35 दिनांक 10.04.2019

महाशय,

उपरोक्त प्रस्ताविक विषय के सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि भौजा रामपुर बरायणपुर ग्रामां. नं० 5। खेतरा नं० 13 को सड़क सीमांकन के सम्बन्ध में अंचल अमीन से सीमांकन कराया गया है। एवं राजस्व कमिचारी से खजाना प्रमाण पत्र कराया गया है। राजस्व कमिचारी ने प्रतिक्रिया करते हुए कि अकबरपुर मोड़ से रामपुर गाँव तक सड़क निर्माण में भौजा-रामपुर बरायणपुर, ग्रामां. नं० 5। के खेतरा नं० 13 के पास सरकार की सीमांकन अंचल अमीन द्वारा की गई है। सीमांकन के दौरान सीमा रेखा परीक्षण जुड़ने के बाद साकिन रामपुर बिकाली द्वारा अतिरिक्त माप किया गया था। जो सीमा रेखा द्वारा अतिरिक्त माप रेखा की दी गई थी। अतिरिक्त माप भुक्त होने पर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस पर के साथ अंचल अमीन को नक्की प्रतिक्रिया एवं राजस्व कमिचारी को नक्की प्रतिक्रिया के आधार पर सौलजन का आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

सादर सूचना के त्रिषि।

विश्वास भाजन

अंचल अधिकारी
ब्योसवरी (पटना)

अतिरिक्त

00/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH



No. B - 2020

3132

Authorised u/s 8 (1) (C) of the
Notaries Act 1952 (Act LIII of 1952)

Before Notary/ Executive Magistrate

समक्ष लेख्य प्रमाणक/कार्यपालक दंडाधिकारी

Barh (Patna) बाढ़ (पटना)

AFFIDAVIT

शपथ-पत्र

27 NOV 2020

Book No. 02 Date..

मैं, अनिल कुमार ठाकुर पिता स्व० भोला ठाकुर, ग्रामीण कार्य विभाग-बिहार सरकार में रजिस्टर्ड कन्ट्रैक्टर हूँ, ग्राम+पो०-भूरा, थाना-त्रिवेणी गंज, जिला-सुपौल, निम्नलिखित बातों की घोषणा सत्य एवं निष्ठा पूर्वक करता हूँ।

1. यह कि मुझे अकबरपुर से रामपुर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण का कार्य घोसवरी प्रखंड के अंतर्गत मिला है।
2. यह कि मैं दिनांक-30.10.2020 तक पुलिया का कार्य पूर्ण कर दिया।
3. यह कि मैं दिनांक-10.11.2020 तक ग्रेड-3 का कार्य पूर्ण कर दिया।
4. यह कि मैं दिनांक-05.12.2020 तक कालीकरण का कार्य कर दूंगा।
5. यह कि मैं रोड फर्निचर और फ्लैंक दिनांक-20.12.2020 तक पूर्ण कर दूंगा।

6 - मुझे खराब वृद्धि के आभावा इल्ले संबंधित कोई आर्थिक दावा मेरे हवाए नहीं दिया जाएगा

शपथ पत्र में वर्णित सभी बातें मेरी निर्देशानुसार लिखी गयी है जिसे मैं ठीक ढंग से पढ़ कर व पढ़वाकर सुन व समझ लिया तथा अपनी जानकारी में इसे सत्य एवं सही पाकर हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता

Anil Kumar Thakur



Identify Signatory who has signed on Put L. 71

ASSOCIATE, EM
Civil Court Barh (Patna)

27.11.2020

Presy.

Name of Work - Const. of Rd. from Alkbarpur to Rampur

Schedule XLV-Form No. 134

Name of Agency → Anil Kumar Thakur
Vill + P. → Bhura,

DIVISION

PS - Trivenigang
Subpart

SUB-DIVISION

0.10% Below

Measurement Book

Date of work order → 9.6.18

Date of completion → 8.6.19

(315)

Attested

06/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
09/12/20

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work :- Construction of road from Akbarpur					
to Rampur					
PKR No - BR-26R-195					
Agency :- Anil Kumar Thakur.					
Agreement No - 03/SB/2018-19					
Date of commencement (as per work order) :-					09/06/18
Date of completion (as per work order) :-					08/06/19

T.G.No-01	Providing & Fixing of working benchmarks - - -	E/I
	4 L X 30.00 m =	1230.00 m
	1 X 12.00 m =	12.00 m
	Total =	1242.00 m
		= 1.242 Km
	By Kumar 10/10/18 J.E.	

<u>T.9.No-02</u>	Construction of embankment				
	with approved				E/I
	E/W Calculation sheet.				
	Change in (m)	Filling Area (m ²)	Filling mean Area (m ²)	Distance (m)	Filling volume (m ³)
	0.00	4.012	—	—	—
	50.00	7.239	5.626	50.00	281.275 m ³

Continuation Total = 281.275 m³

A. H. K.

04/12/20

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

4/12/20

3rd on A/c Bill. dt. 24/08/20

28

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of road from Akbarpur to Rampur					
Agency - Anil Kumar Thakur.					
Agreement No - 03/SBD/2018-19					
Date of commencement (as per work order): 09/06/18					
Date of completion (as per work order): 08/06/19					
Date of actual completion: - In progress,					
Abstract of cost:					
T-9-No-01 Providing & fixing of work.					
ing benchmark pillars ... etc.					
Qty V/P - 13 of TMA					
1.24 km @ Rs. 16630.72 per km = Rs. 20622.00					
T-9-No-02 Construction of embankment					
2 with approved ... E/I					
Lead upto 1000 m					
Qty V/P - 14 of TMB.					
2446.58 m ³ @ Rs. 103.88 per m ³ = Rs. 254151.00					
T-9-No-03 Construction of Subgrade &					
3 earthen shoulders ... E/I					
Qty V/P - 27 of TMB.					
24.00 m ³ @ Rs. 143.62 per m ³ = Rs. 3447.00					
T-9-No-04 Construction of embankment					
4 ment with materials.					
Lead upto 100 m.					
Qty V/P - 14 of TMB					
368.825 m ³ @ Rs. 103.88 per m ³ = Rs. 38314.00					
Continuation Total = Rs. 316534.00					

A/tes kel

14/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
5/12/20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B.F. = Rp.		316534.00
T.9.No-05	Construction of Subgrade				
	and earth shoulders - - EI				
	Lead upto 1000 m.				
	Qty V.P. 27 of TMB.				
454.46 m ³ @ B.	143.62	Per m ³ = B.			65270.00
T.9.No-06	Construction of embankment				
	with materials - - EI				
	Qty V.P. 14 of TMB				
1534.925 m ³ @ B.	103.88	Per m ³ = B.			159448.00
T.9.No-08	Construction of G.B.B.				
	- - - EI				

385.97 m ³ Qty V.P. 14 of TMB.					
83.24 m ³ V.P. 21 of TMB.					
8.25 m ³ V.P. 26 of TMB.					
474.46 m ³ @ B.	143.68	Per m ³ = B.			67679.80
472.75 m ³					683590.00
T.9.No-09	Providing, laying & spreading				
	of compacting of WBM Gr-II - - EI				
221.34 m ³ V.P. 14 of TMB.					
117.29 m ³ V.P. 25 of TMB.					
10.97 m ³ V.P. 26 of TMB.					
349.60 m ³ @ B.	2583.18	Per m ³ = B.			903080.00
T.9.No-10	Providing, laying & spreading				
	of compacting of WBM Gr-II - - EI				
115.88 m ³ V.P. 14 of TMB.					
193.23 m ³ V.P. 25 of TMB.					
309.11 m ³	Continuation				
	Total = Rp. 21,27,902.00				
	212130 =				

A. H. Keskar
 08/12/80
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. WORKS DIVISION
 BARH
 08/12/80

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
309.11 m ³			B.F = B.	2	1211302 2127902.00
6.75 m ³			V/P-27 of TMB.		
315.86 m ³			@ B. 231.66 Per m ³ = B.		730161.00
T.9.No-23			Providing & fixing of		
23			Typical pmsy information		
			sign board with logo. . . E/I		
			Qty V/P-26 of TMB.		
2 Nos.			@ B. 7475.43 Per m ³ = B.		14950.00
T.9.No-26			Dismantling of existing		
26			structures like culverts		
			bridges E/I		
			Qty V/P-19 of TMB.		
0.83 m ³			@ B. 1029.94 Per m ³ = B.		834.00 855.00
T.9.No-27			Dismantling of existing		
			structures like E/I		
			Qty V/P-19 of TMB.		
30.69 m ³			@ B. 219.14 Per m ³ = B.		6725.00
T.9.No-28			Removing all types of		
28			H.P. and stacking E/I		
			Qty V/P-20 of TMB.		
5.00 m ³			@ B. 209.12 Per m ³ = B.		1046.00
T.9.No-29			Earthwork in excavation		
29			for structures E/I		
149.29 m ³			V/P-15 of TMB.		
85.76 m ³			V/P-20 of TMB.		
85.32 m ³					
234.56 m ³			Continuation		
235.00			Total = B.		2881639.00 2874846=

Attested

04/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
4/12/20

Scp. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Limit 234.19			B.F. = B.		2874846 = 2881639.00
235.00 234.56 m ³ @ B.		238	65 Rm ³ = B.		55889 = 55978.00
T.O. No-30	Providing Concrete for				
30	plain reinforced concrete in				
	open foundation . . . E/I				
18.67 m ³	V/p. 15 of TMB.				
15.40 m ³	V/p. 20 of TMB				
34.07 m ³ @ B.		5309.34 Rm ³ = B.			177651 = 180889.00
Limit-33-46 T.O. No-31	Providing Concrete for plain/				
31	reinforced concrete . . . E/I				
62.91 m ³	V/p. 15 of TMB.				
45.76 m ³	V/p. 20 of TMB.				
108.61 m ³ @ B.		5309.34 Rm ³ = B.			576647.00
T.O. No-32	plain reinforced cement				
32	concrete in Substructure . . .				
29.67 m ³	V/p. 15 of TMB.				
21.86 m ³	V/p. 21 of TMB				
51.53 m ³ @ B.		6000.57 Rm ³ = B.			309209.00
T.O. No-33	plain/reinforced cement				
33	concrete in Substructure . . .				
	Complete . . . E/I				
2.77 m ³	V/p. 15 of TMB.				
3.01 m ³	V/p. 22 of TMB				
1.84 m ³ @ V/p. 26 of TMB.					
7.62 m ³ @ B.		6210.37 Rm ³ = B.			47323.00
Continuation					
Total = B. 4051685.00					
4041565 =					

After kel

00/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
00/12/20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
T.9.No-34			B.F=B.	40	41565=
34					40,51685.00
Providing & laying reinforced Cement Concrete. . . E/L					
5.080 m ³ V/P-16 of TMB.					
2.995 m ³ V/P-23 of TMB.					
0.720 m ³ V/P-24 of TMB.					
8.795 m ³ @ B. 7293.06 Per m ³ = B.					64142.00
T.9.No-35					
35					
Supplying Bitting and placing HYSD bar reinforcement . . . E/L					
1.354 M.T V/P-13 of TMB.					
0.348 M.T. V/P-22 of TMB					
0.424 M.T. V/P-23 of TMB.					
2.126 M.T. @ B. 53267.00 B. MT=B. 113246.00					
T.9.No-36					
36					
Backfilling behind abutment, wing wall . . . E/L					
Qty V/P-24 of TMB.					
75.32 m ³ @ B. 448.76 Per m ³ = B.					33778.00
T.9.No-37					
37					
Providing weepholes in brick masonry/stone masonry . . . E/L					
Qty V/P. 24 of TMB.					
100 Nos. @ B. 98.70 Each. = B.					9870.00
Total B.					42,29,994.00

Continuation

4262601=

Attested
 04/12/20
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. WORKS DIVISION
 BARH
 000919
 4/12/20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					42626012
			B.F.		B. 42,29994.00
Less @ 0.10% below as per					
tender agreement = (-) B.					4263 = 4230.00
					4258338 =
			Total B.		42,25,764.00
Deduction :-					
Payment upto 3rd on H.C. Bill.					
V/P. 18 of TMB = (-) B.					26,35,279.00
					1623059 =
			Net total = B.		15,90,485.00
Amount as per Ad-dmuk -					1462651 =
			B. Kumar		
			J.E.	08/20	

Continuation

Attested
 04/12/20
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. WORKS DIVISION
 BARH
 09/10/20

Basic Rate of Consumed Material.

34

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No. •	L.	B.	D.	
Exc (Self) = (24.00 + 454.46) m ³					
= 478.46 m ³ × Rs. 1.73 = Rs.					828.00
Well graded G.S.B.					
26.5 mm. to 9.5 mm.		41.30 m ³	× Rs. 548.37 = Rs.		22649.00
9.5 mm. to 2.36 mm.		29.30 m ³	× Rs. 398.67 = Rs.		11535.00
Sand. 2.36 mm. below		46.70 m ³	× Rs. 72.84 = Rs.		3402.00
Aggregate.					
3-2. 63 mm. to 45 mm.		155.20 m ³	× Rs. 357.03 = Rs.		55411.00
11.25 mm.		37.70 m ³	× Rs. 83.12 = Rs.		3134.00
3-3. 53 mm. to 2.4 mm.		242.00 m ³	× Rs. 390.30 = Rs.		94453.00
Stone Screening.		48.00 m ³	× Rs. 267.51 = Rs.		12840.00

Coarse sand. (7.40 + 22.00 + 9.90 + 2.20 +					
1.35 + 0.35) = 43.20 m ³ × Rs. 95.22 = Rs.					4119.00
40 mm aggregate (7.40 + 22.00 + 7.90 +					
1.80) m ³ = 39.10 m ³ × Rs. 371.63 = Rs.					14531.00
20 mm aggregate (3.70 + 11.00 + 7.90 + 1.80 +					
1.70 + 0.40) = 26.50 m ³ × Rs. 491.23 = Rs.					13018.00
10 mm aggregate (1.30 + 3.70 + 4.00 + 0.90 + 1.10 + 0.30)					
= 11.30 m ³ × Rs. 560.23 = Rs.					6333.00
Sand. 90.40 m ³ × Rs. 95.22 = Rs.					8608.00
Total = Rs.					250854.00

Billed on:					
24/08/20					
J.E.					
Total Amount × 10%					

Continuation

250854 = 250854

250854 =

Attested

09/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
4/12/20

Statement of Royalty

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① E.W. 478.46 m ² @ Rs 27.7/m ²					15789.5
② Stone - 64.29 m ³ @ Rs 150/m ³					9644.5
③ Stone 273.314 m ³ @ Rs 150/m ³					40997.5
④ Mason - 24.73 m ² @ Rs 83/m ²					2083.5
Surinder 177.45 m ² @ Rs 75/m ²					13309.5
					82922.5

320 on the Bank

Memo of Royalty

Work done in m ² -	4258338.5
Less: former Royalty -	2635279.2
Current Bank Amount -	1623059.2

Amount due for Adhar - 1462651.5

① By S.D. @ 5%	73133.5
② By P.S.D. @ 2.5%	36566.0
③ By G.T. @ 1%	14627.5
④ By L.W. @ 1%	14627.5
⑤ By C. & S.F. @ 1%	14627.5
⑥ By S. & S.F. @ 1%	14627.5
⑦ By S. Fee @	25085.5
⑧ By Royalty	82922.5
⑨ By T.I.E. @ 10% on former -	81586.5
Total	1092079.5
⑩ By on current Payment	370572.5
Total	1462651.5

Based on 1462651.5 (Product of 1462651.5 and two thousand six hundred and fifty nine hundredths)

Pay to the order of 14370572.5 (Three crore seventy thousand five hundred and seventy two and five hundredths)

Continuation

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
BARH


Attest

4/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

WORK PROGRAMME

Name of Work : - Akbarpur to rampur

	Up to Nov 20	December 2020
E/w	80%	20%
GSB	100%	
WBM Gr- II	100%	
WBM Gr- III	100%	
CD	100%	
Cold Premixing	70%	30%
Road Furniture	20%	70%

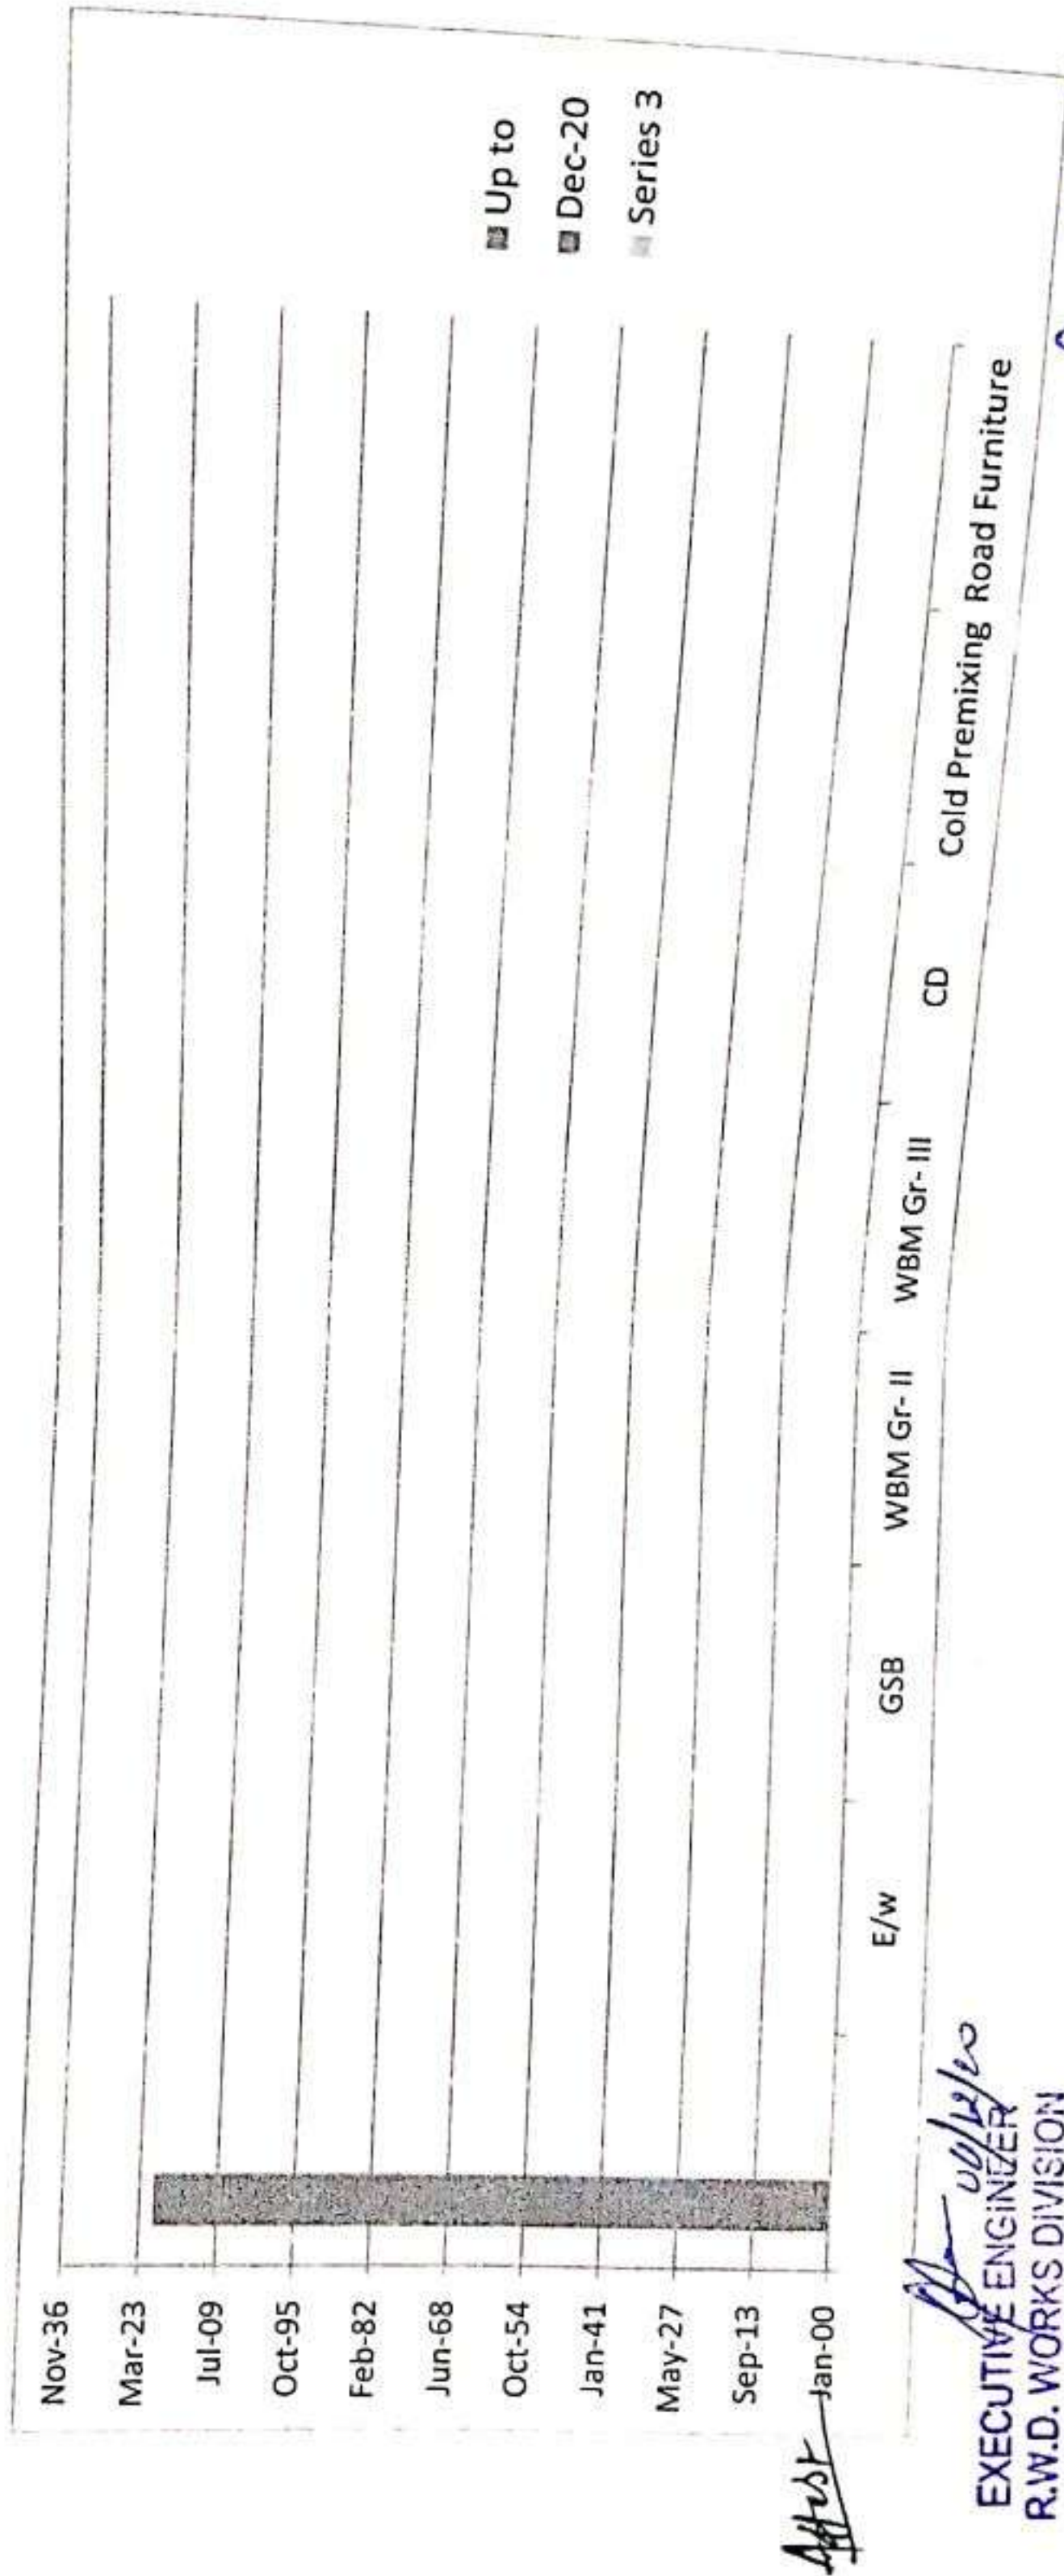

August

06/12/20

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION

BARH

4/12/20

Anil Kumar Thakur
Signature of Agency

Proforma for Hindrance

Name of Work - Akbarpur To Rampur

Package No.- BR-26R-195

Agreement No. - 03/SBD/2018-19

Contract date of the completion -09.06.2018

Extension applied for : - 20.12.2020

District - Patna

Division - Barh

Block - Ghoswari

Sl.No.	Type & Nature of Hindrance	Date of Start of Hindrance	Date of removal of Hindrance	No. of Days of Hindrance	Official evidence document regarding delay
1	पथ में जमीन विवाद होने के कारण	28.03.2019	22.01.2020	300	अंचलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रगति पर लाया गया तत्पश्चात् 22.03.2020 से पुरे देश भर में कॉविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था एवं उसके कारण कार्य पुर्णतः बद हो गये था
2	कॉविड-19 एवं लॉकडाउन	22.03.2020			लॉकडाउन संवेदको के लिए 15.04.2020 से खुल गया परन्तु कार्य करने वाले लोगो के आभाव में कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी इस कार्य को मेरे द्वारा 20.12.2020 तक पुर्ण कर लिया जायेगा।

Certified that above facts are true and correct in my belief and knowledge.

Executive Engineer
RWD Works Division Barh

Anil Kumar Thakur

भारत निर्माण



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
विषय: पंचायत



कार्यकाय विभाग, पंचायत

1. भारत सरकार, नई दिल्ली
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
3. विषय: पंचायत
4. योजना संख्या: 1/2017
5. योजना की तिथि: 1/1/2017
6. योजना की अवधि: 1/1/2017 से 31/3/2017 तक
7. योजना की लागत: ₹ 100 करोड़
8. योजना की प्रगति: 100%
9. योजना की प्रगति: 100%
10. योजना की प्रगति: 100%



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

यह योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विषय: पंचायत, योजना संख्या: 1/2017, योजना की तिथि: 1/1/2017, योजना की अवधि: 1/1/2017 से 31/3/2017 तक, योजना की लागत: ₹ 100 करोड़, योजना की प्रगति: 100%, योजना की प्रगति: 100%, योजना की प्रगति: 100%

ਸਰਕਾਰੀ - 31909292 29 218192

Stumme
04/12/20
13E

Karachi
4/12/20
A-E

04/12/20
1212




Scanned with CamScanner

Name of work :- Akbarpur to Rampur.

[Signature]
04/12/20
J.E.

[Signature]
04/12/20
J.E.

[Signature]
04/12/20
J.E.

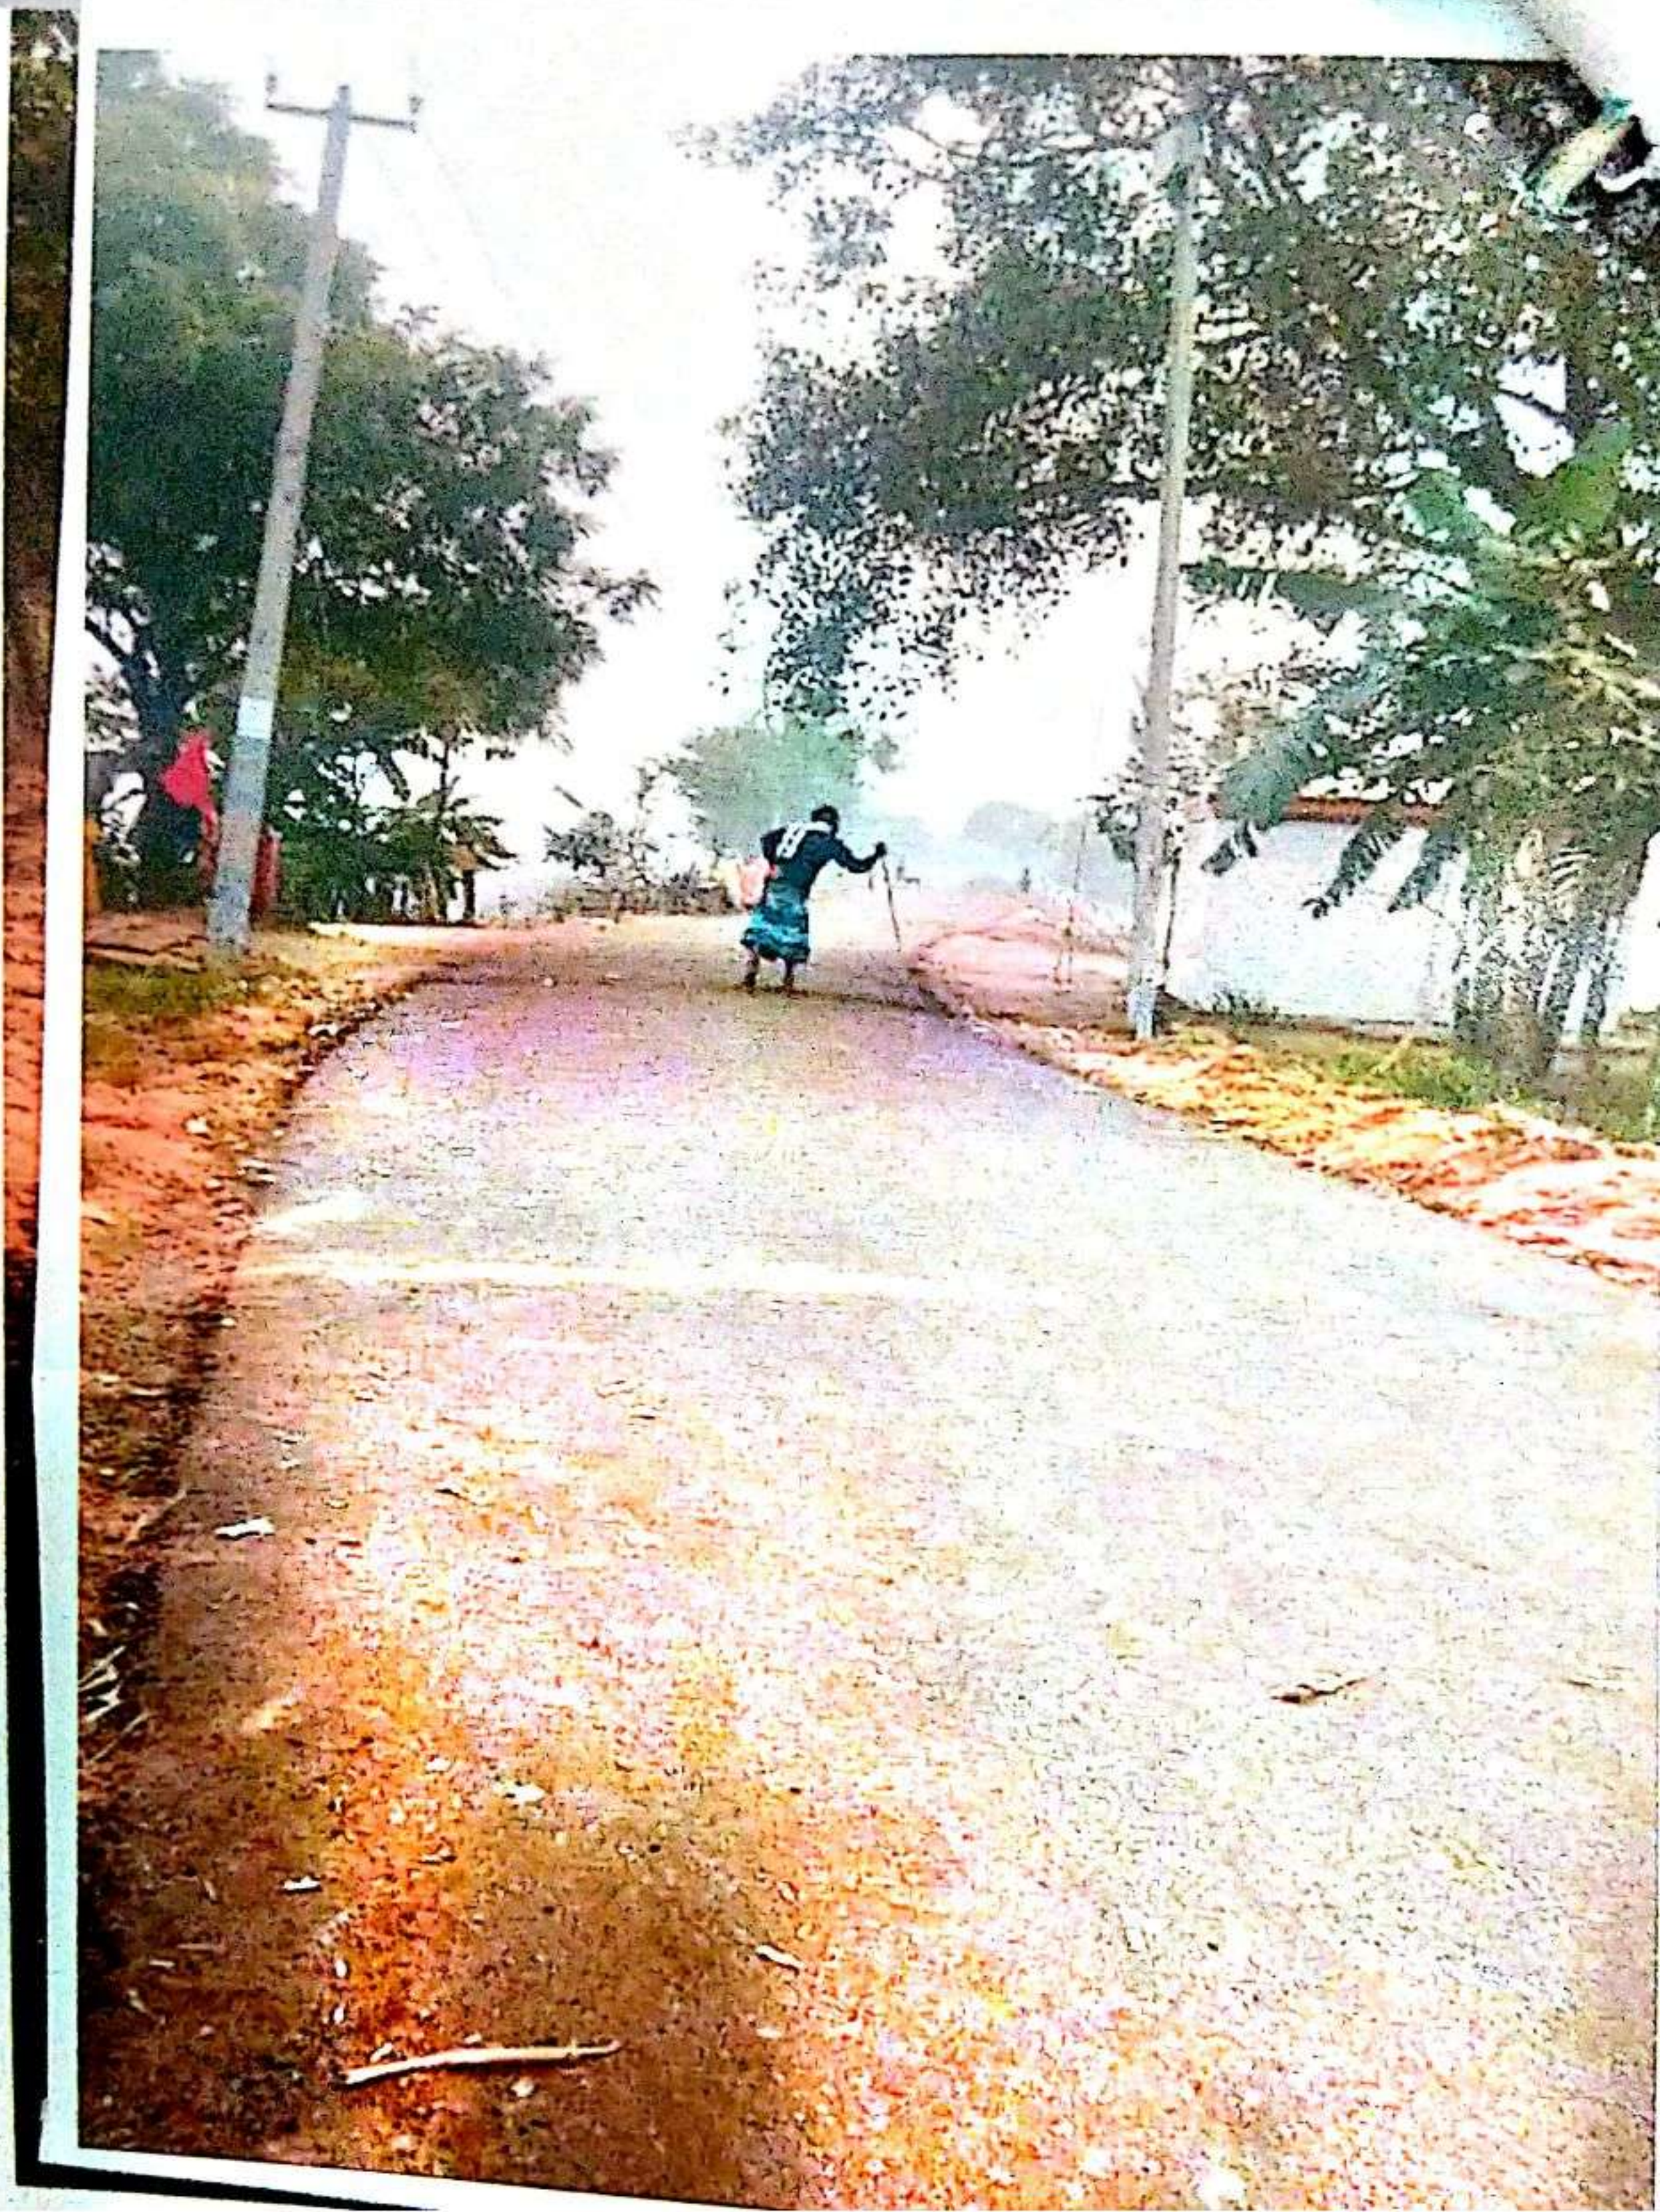

Name of work :- Akbarpur to Rampur.

BKumar
04/12/20
F.E

Prasad
4/12/20
F.E

Prasad
04/12/20
F.E



Name of work :- Akbarpur to Rampur.

BKumar
04/12/20
SE

Imat
4/12/20

Ghan
04/12/20
ER




Name of work:- Akbarpur to Rampur

Bikram
04/12/20
JE

Insd
4/12/20

04/12/20
132

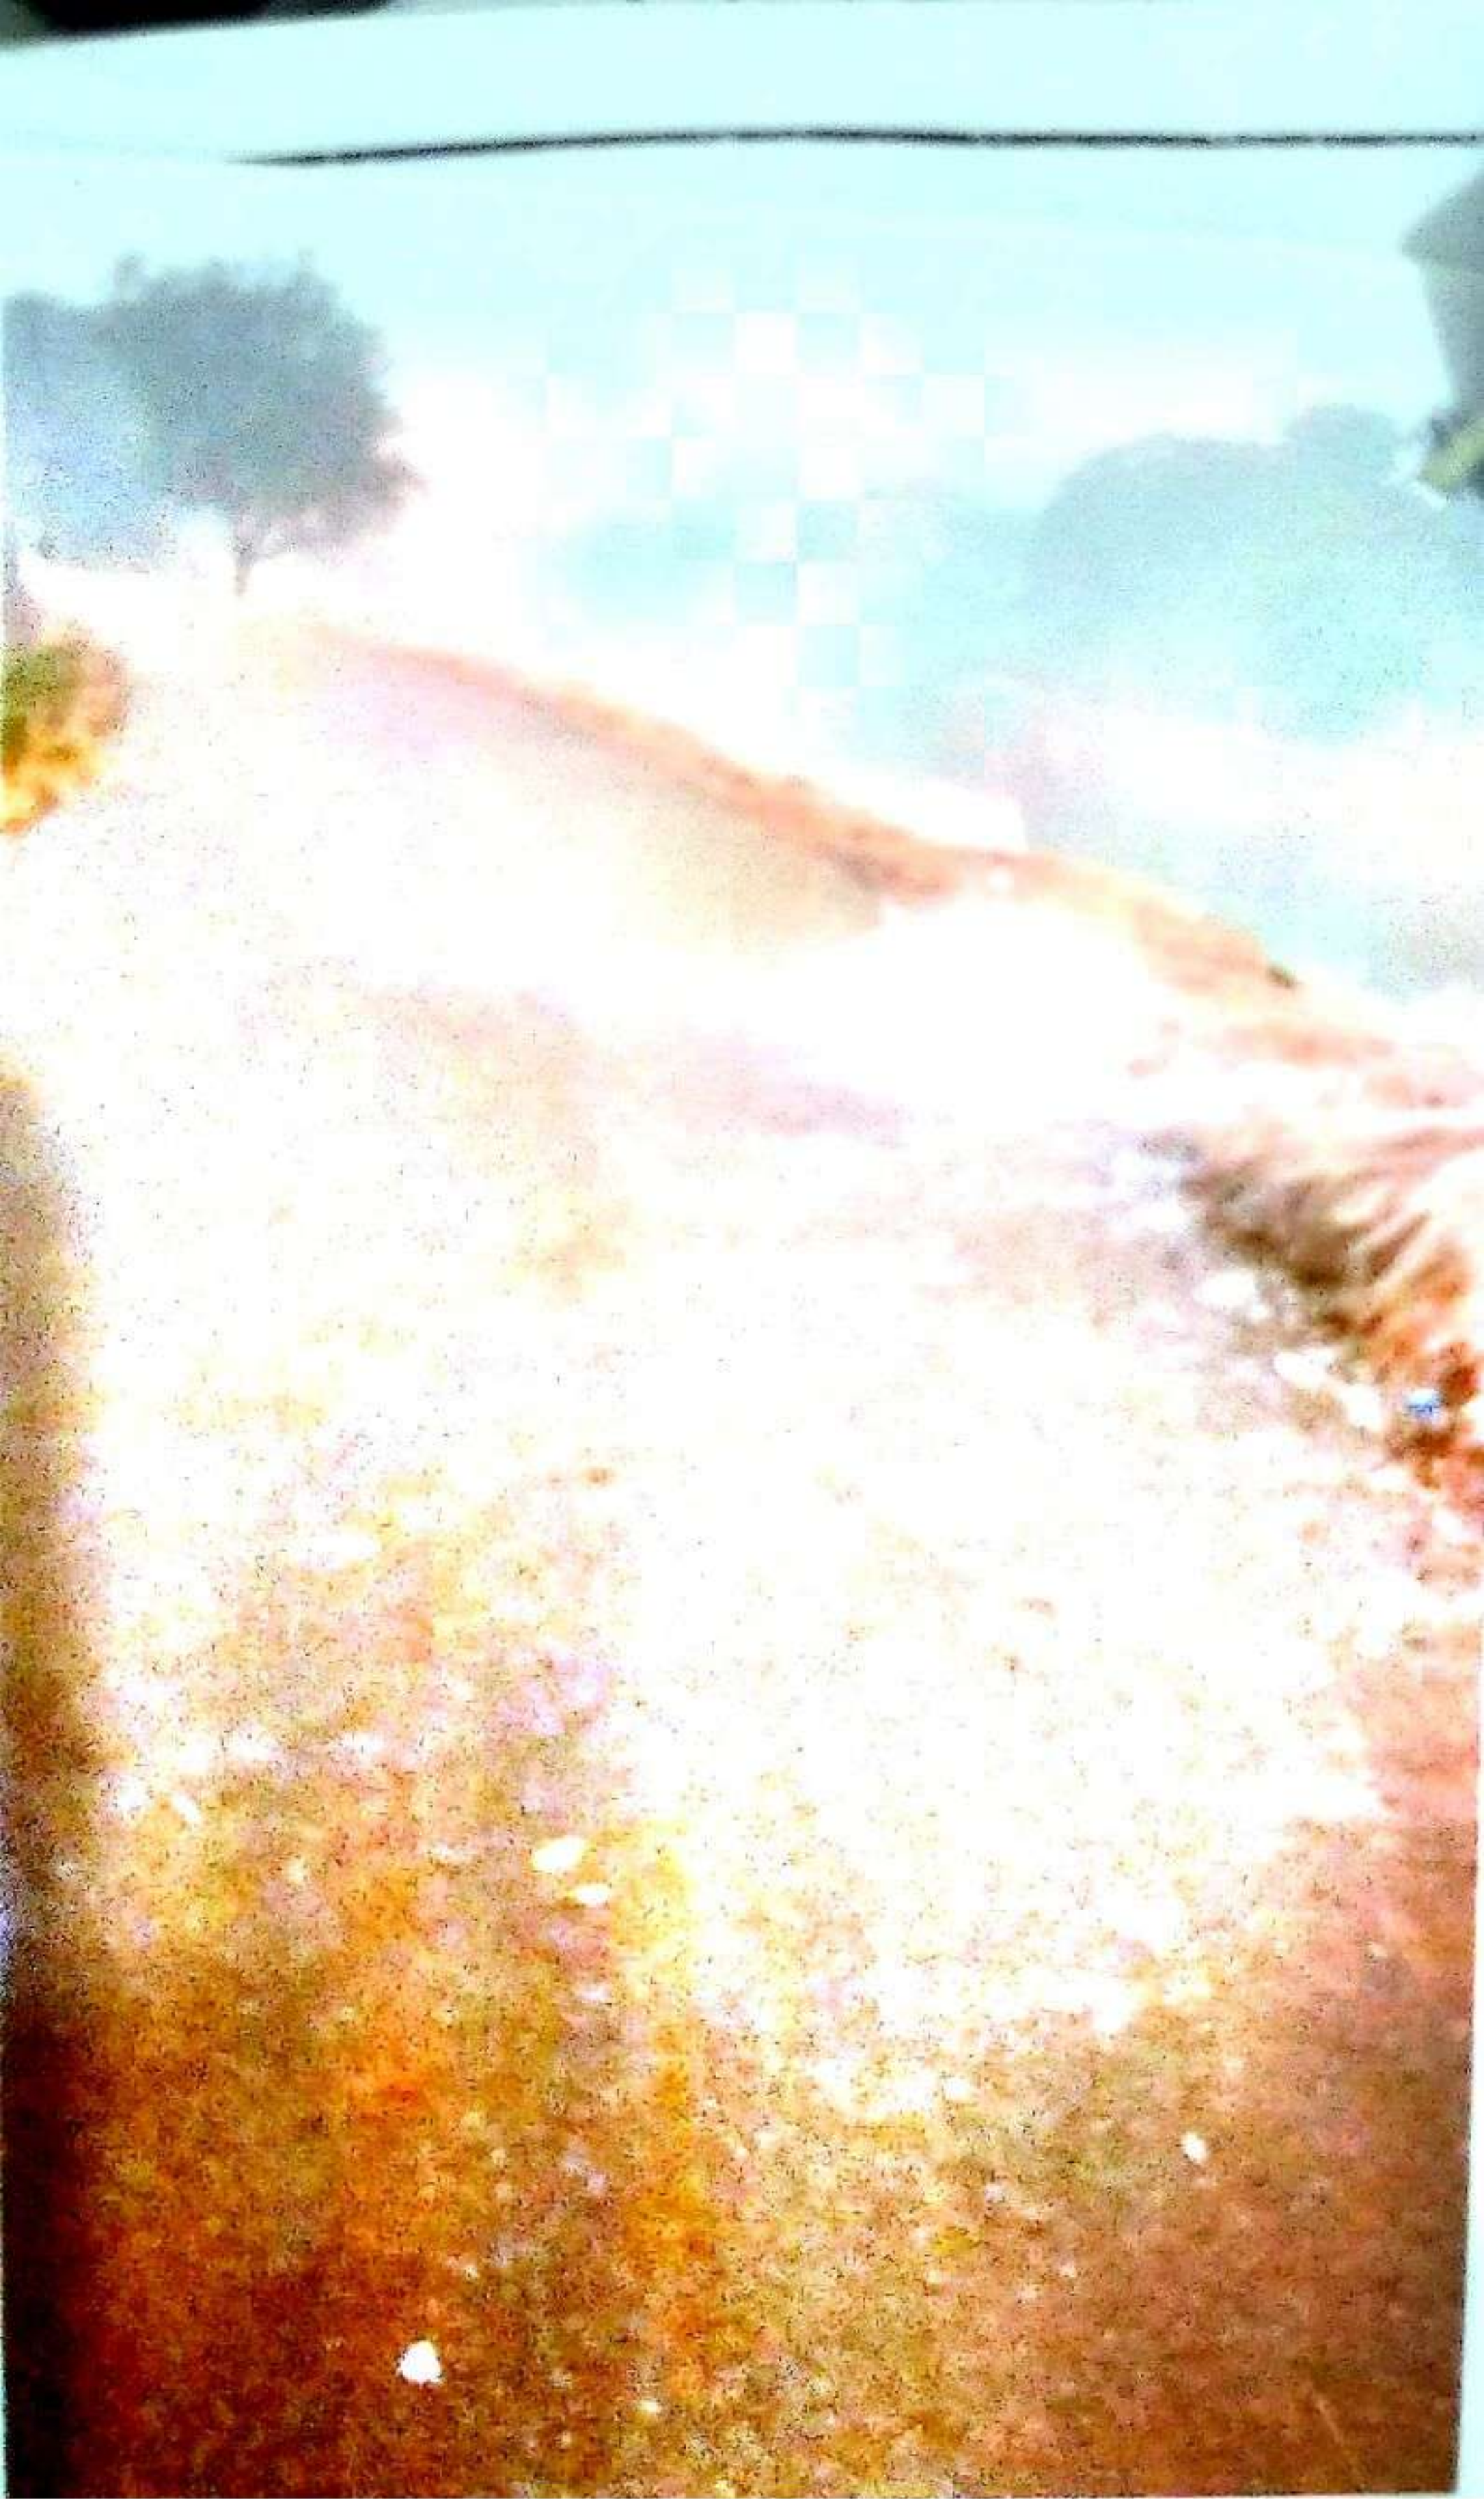

Name of work: Akbarpur to Rampur.

BKumar
04/12/20
J.E

Hand
4/12/20
A.E

04/12/20
82
