

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़

पत्रांक १३.१३.२०१९ बाढ़ / दिनांक २१.१२.२०

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय :- शीर्ष पी०एम०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत धोबिचक से डभवाँ (पैकेज संख्या - बी०आर०-२६आर०-१७७ तक पथ निर्माण का समय-वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शीर्ष पी०एम०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत धोबिचक से डभवाँ (पैकेज संख्या - बी०आर०-२६आर०-१७७ तक पथ निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है। योजना का बिन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।

1. स्थाल विडियो ग्राफी का सी०डी०
2. (1) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि ०३.०७.२०१८ है।
(2) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि ०२.०४.२०१९ है।
3. कार्य विशेष्टियों के अनुरूप किया जा रहा है। अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।
4. संलग्न सी०डी०।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि का एम०आई०एस० में ऑनलाईन प्रविष्ट कर कर समय वृद्धि के प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

०९/१२/२०
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़
२१/१२/२०

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

- 1 Name of Contractor :- GOPAL KUMAR SINGH
- 2 Name of Work :- DHOVILHAK TO DAYMA.
- 3 Agreement No. & Date :- 18/SBD/2018-19
- 4 Agreement Value :- 83,49,96,3.00
- 5 Date of Commencement :- 03-07-'2018
- 6 Original Date of Completion :- 02-04-2019
- 7 Extension Previously Granted or not :- NOT
- 8 Extension applied for :- 15-12-2020
- 9 Head :- P.M.U.SY
- 10 Percentage of Work Done :- 95 %
- 11 Reason of Hindrence :- Covid-19, Land dispute.
- 12 Recommendation by J.E. :- Recommended for time extension
- 13 Recommendation by S.D.O. :- Recommendation upto 15.12.2020. B.I.
for time extension only
20/11/2020
J.E.
- 14 Recommendation by the
Executive Engineer :- ~~20/11/20~~ A.E.
T.E. may be granted.
04/12/20
- 15 Recommendation by S.E. :-
- 16 Final Order of the C.E. :-

Gopal Kumar Singh

Signature
of the Contractor



Dhevi Chak To Dava Ma

25/11/20
7.15

25/11/20
20

25/11/20



Dhovi'chiaK To Davma
Package No- BQ-26R-177

~~B.B.~~ 20/11/20
A.C

128

Dhovich To N...

2 | Extension applied for




Dhovichair To Danna
package no - BR-26R-177

BP
200.11.030
2.5

BP
200.11.030
2.5
A.2

Dhovichair

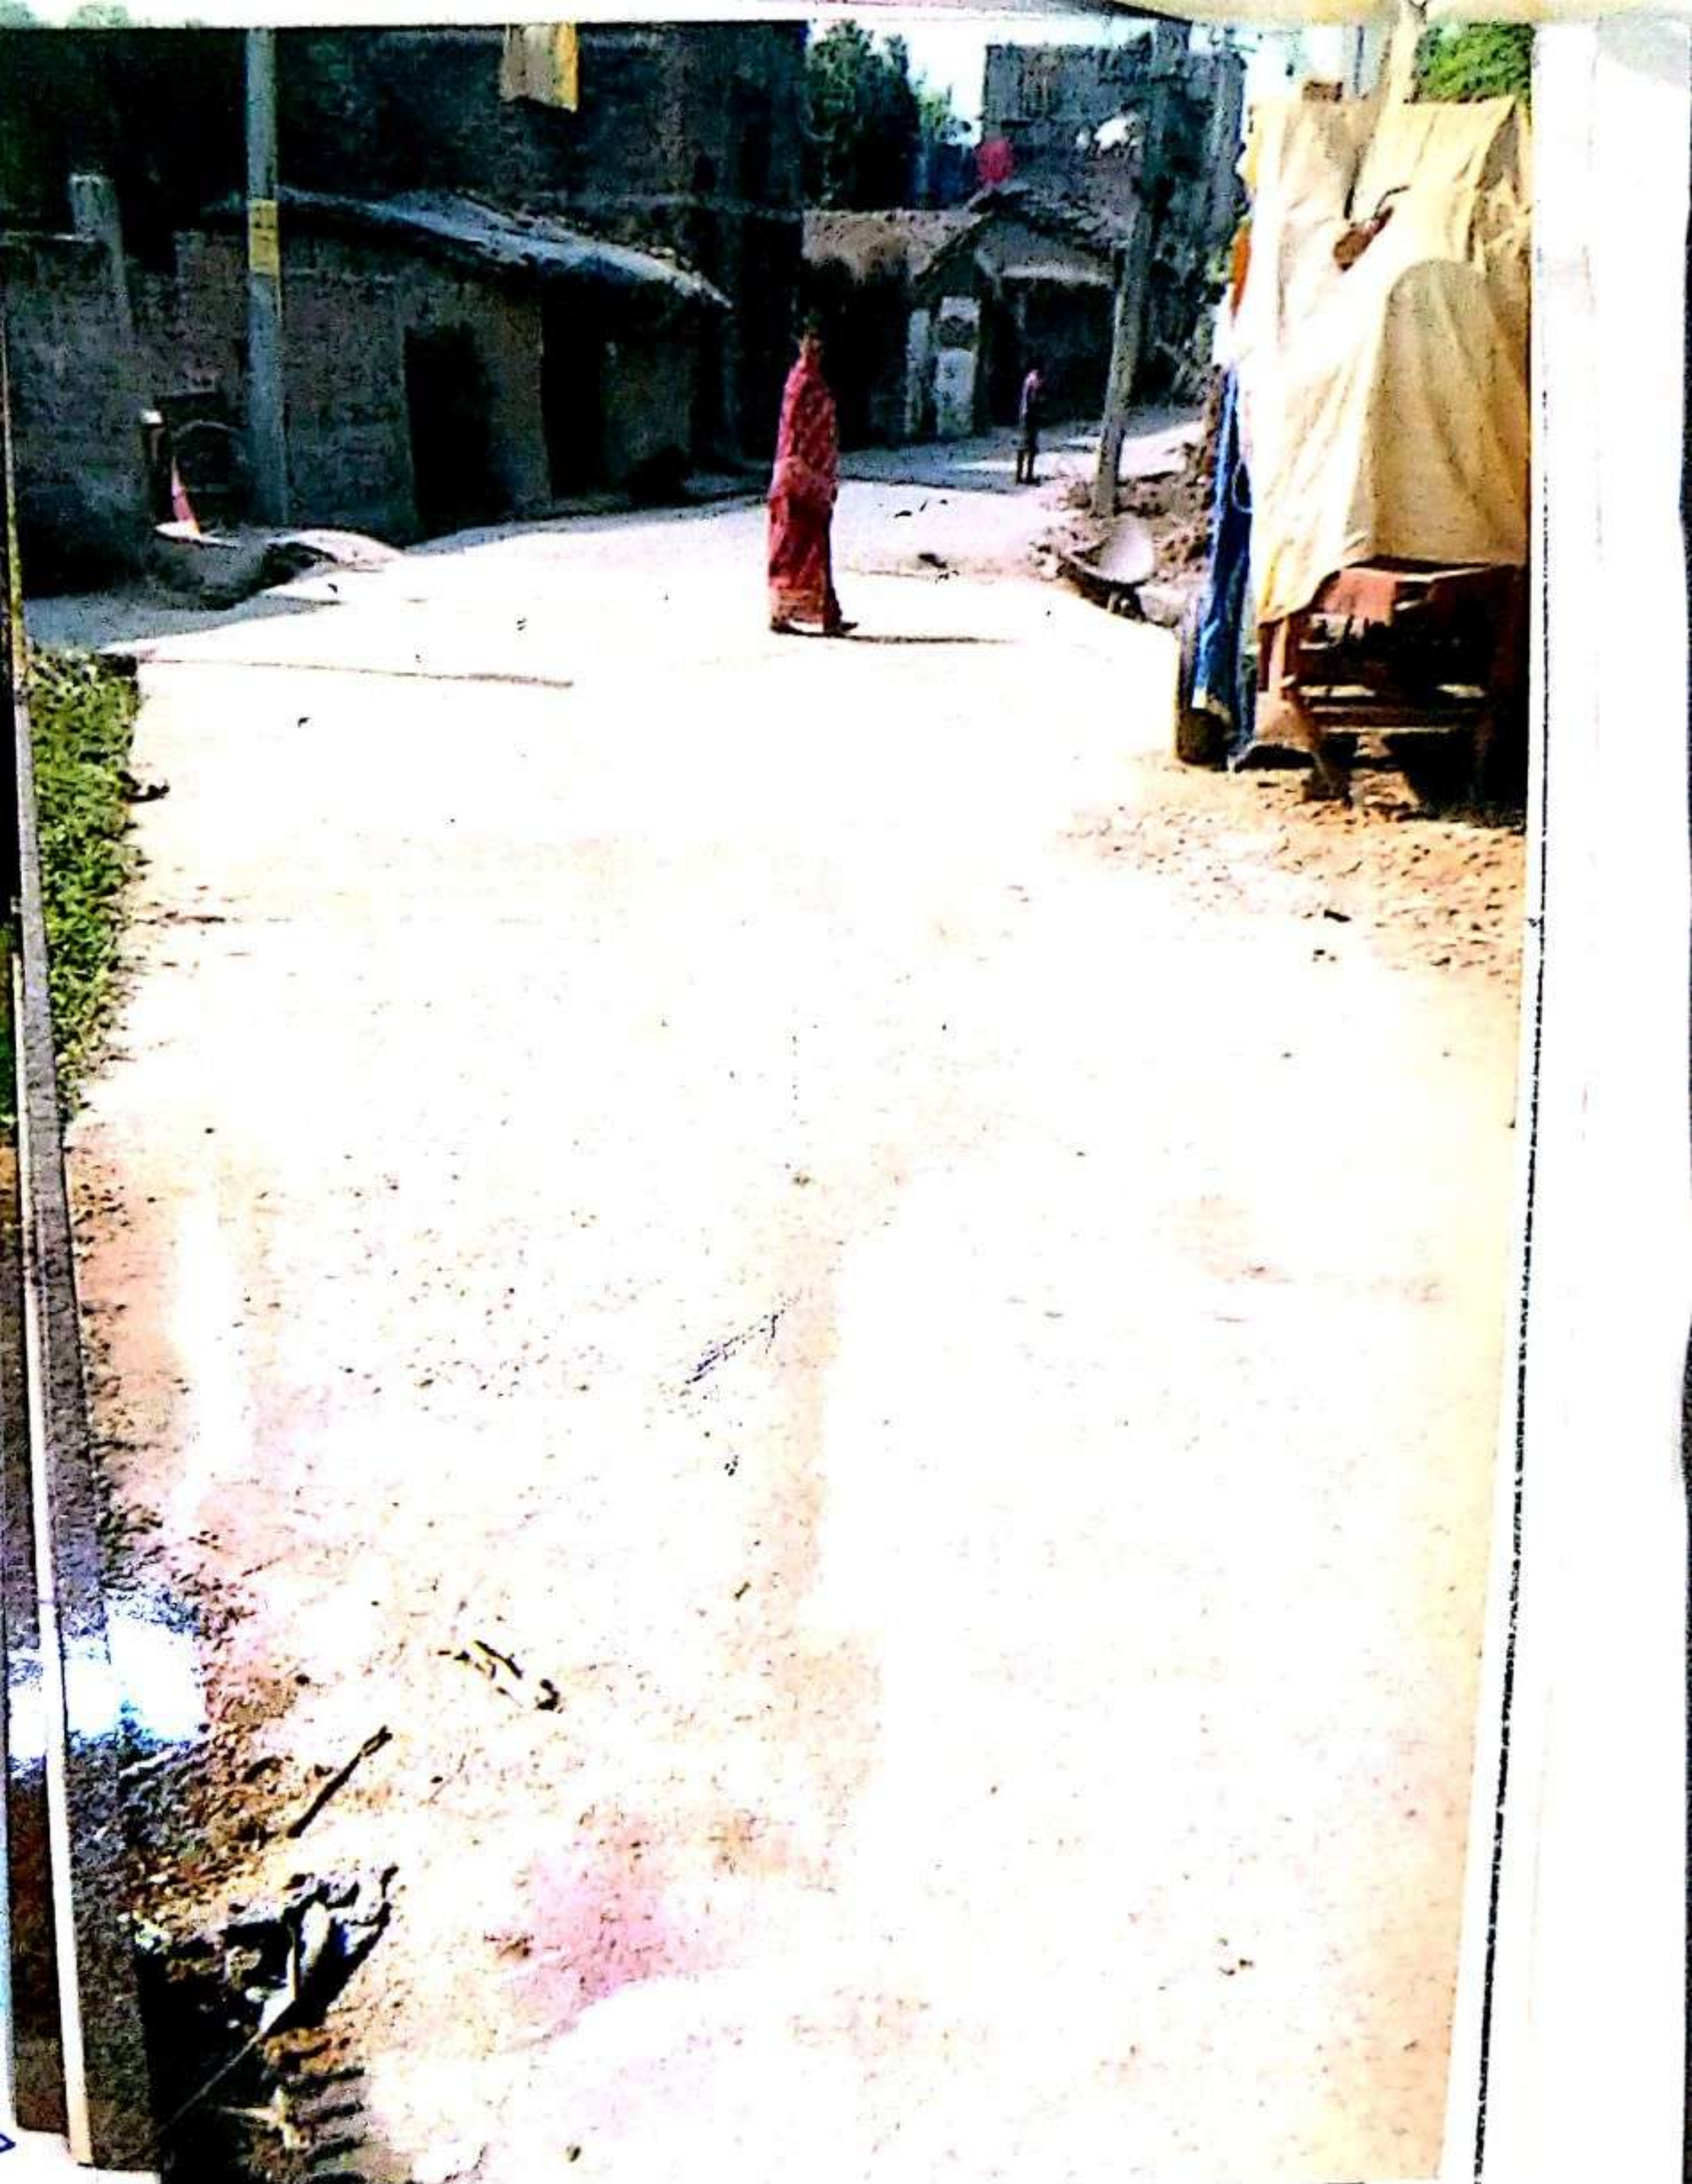

Dhorechback To Dama

package No- BR- 26R- 177

BH

20.11.20
9.7 B

R.R.
A.C.


27/8/20



Dhowichak To Damma
Package No- BR-25R-177

Recd
27.11.2020
A/C
27.11.2020
27/11/20

01.11.20

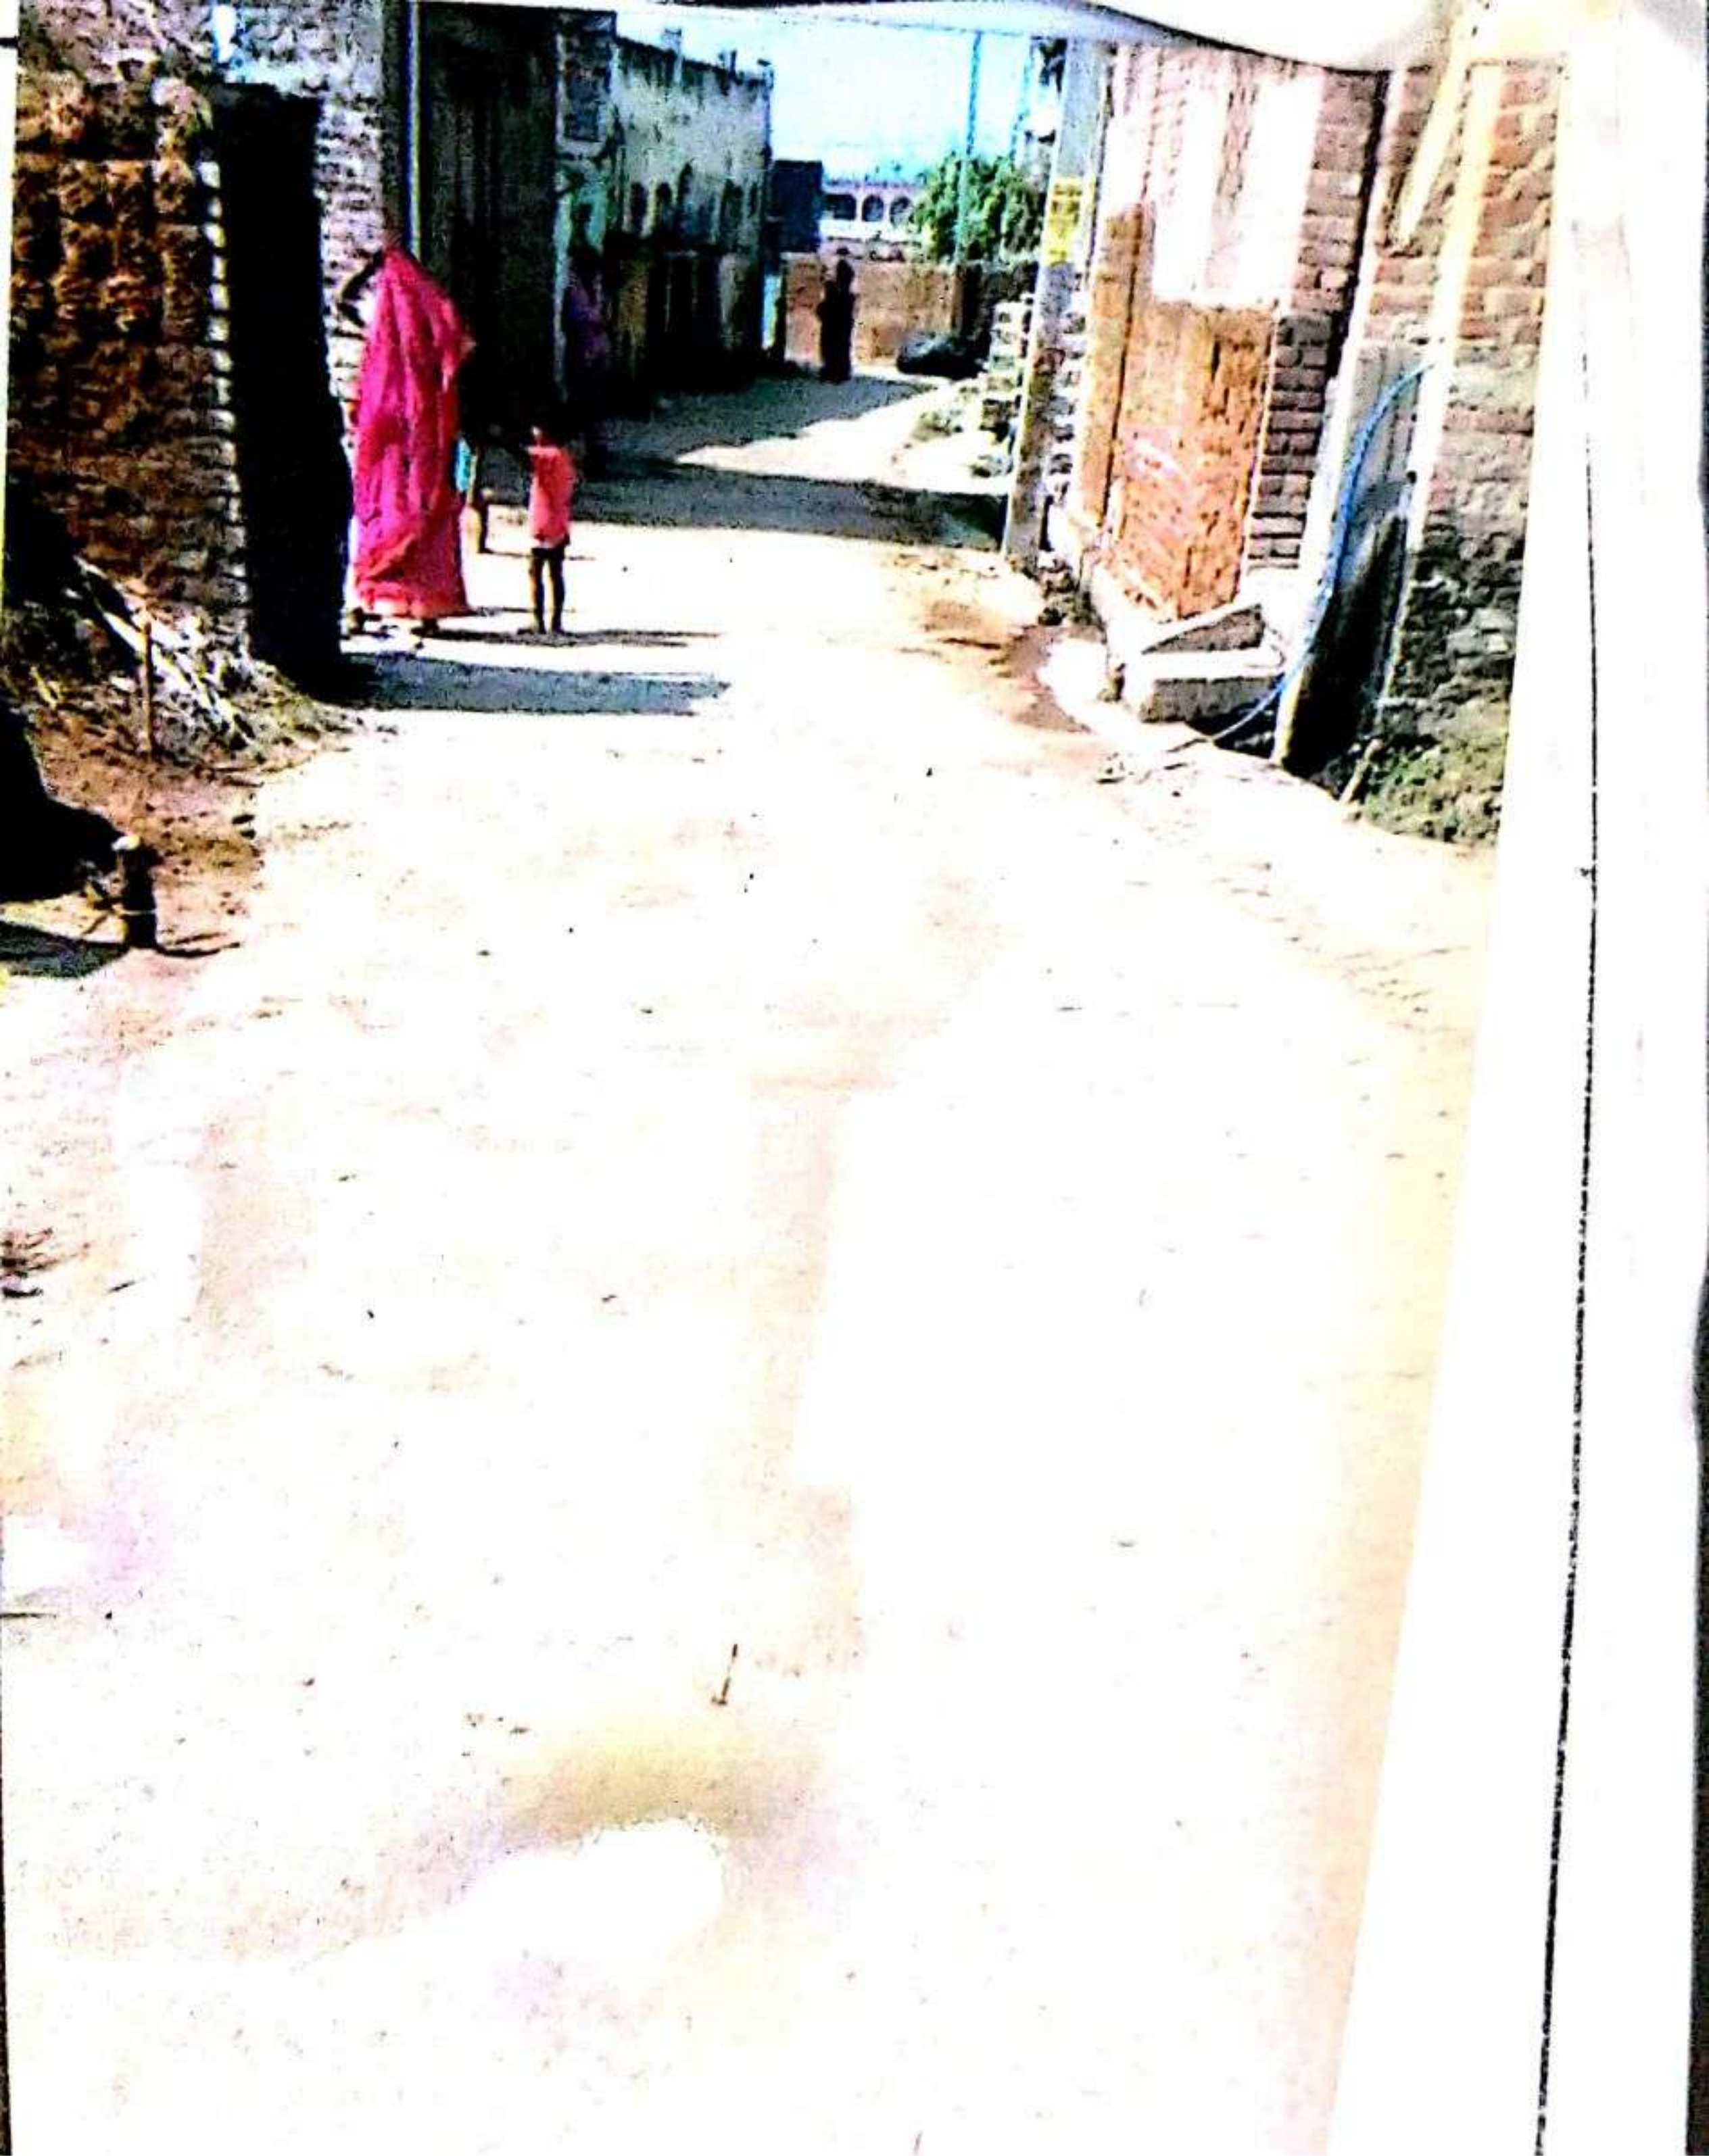

Dhowichak To Darma

Packagewo- BR-25R-177

BR
20.11.2020
R.B. 11/20/2020
A. 11/20/2020



SECTION OF THE

THE PHOTOGRAPHED MATERIAL IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT WAS ORIGINALLY SUBMITTED.

Dhovichak To Damma

Package NO - BR-26R-177

BB
20/11/2020
A.R.E

RB
20/11/20
A.R.E
09/12/20

GOPAL KUMAR SINGH

At+PO-Sheonar, PS- Mokama, Dist- Patna-803302

Mobile- 9386875810; 8340619853<<>> E-Mail-priyanshuinfra@gmail.com

Ref. No.....

Date.....

सेवा में,

श्री मान कार्मदात्मक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़

विषय :- बाढ़ीयक से डामा pmwsy Road
के निर्माण के संबंध में

31.1.19

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि

विषयगत निर्माण कार्य रुकड़ा नामा के

अनुसार 02-04-19 को कार्य समाप्त करना

भा परन्तु अभी तक विवाद के कारण निर्माण

कार्य असमय पूर्ण नहीं हो सकेगा

आतः श्रीमान से अनुरोध है

कि विषयगत निर्माण कार्य का समय पूर्ण
स्वीकृत करने की कृपा की जाय

Attached

09/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

31/1/20

विश्वास साजन

Gopal Kumar Singh
Proprietor

Proprietor

अंचल कार्यालय पंडारक (पटना)

पत्रांक.....1069

दिनांक.....31/1/20

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
पंडारक।

सेवा में,

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल
पंडारक।

विषय : ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल पंडारक के द्वारा प्राप्त पत्र एवं सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंग- आपका पत्रांक 20 दिनांक 5.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि आप के पत्र के आलोक में स्थानीय जाँच कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत धोबीचक से डभावाँ ग्राम तक सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण को कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा काम को रोका गया था। इन लोगों का कहना था की कुछ भाग रैयती है, इसलिए यहाँ पर काम होने नहीं देंगे। फिर गाँव के ही कुछ लोगों के द्वारा समझा बुझा कर मामला को सुलझा लिया गया है।

निर्माण स्थल पर उपस्थित लोगों राम सागर सिंह, पिता- अखिलेश सिंह, पप्पु सिंह, पिता- स्व० रामविलास सिंह, प्रमोद साव, पिता- अमीरक साव, सुनील राम, पिता- विन्दा राम से पुछ ताछ करने पर बताये की अब मामला सुलझ गया है, और सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है।

विश्वासभाजन

31/1/20

अंचल अधिकारी,
पंडारक।

Attested

08/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

5/1/20



No. A - 2020

Authorised u/s 8 (1) (C) of the
Notaries Act 1952 (Act LIII of 1952)

Before Notary/ Executive Magistrate

समक्ष लेख्य प्रमाणक/कार्यपालक दंडाधिकारी

2016

Barh (Patna) बाढ़ (पटना)

AFFIDAVIT

शपथ-पत्र

27 NOV 2020
Date

मैं, गोपाल कुमार सिंह पिता स्व० इन्द्रदेव सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग-बिहार सरकार में रजिस्टर्ड कन्ट्रैक्टर हूँ, ग्राम+पो०-शिवनार, थाना-मोकामा, जिला-पटना, निम्नलिखित बातों की घोषणा सत्य एवं निष्ठा पूर्वक करता हूँ।

1. यह कि मुझे धोबीचक से डभामा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण का कार्य पंडारक प्रखंड के अंतर्गत मिला है।
2. यह कि मैं दिनांक-20.10.2020 तक पुलिया का कार्य पूर्ण कर दिया।
3. यह कि मैं दिनांक-30.10.2020 तक ग्रेड-3 का कार्य पूर्ण कर दिया।
4. यह कि मैं दिनांक-30.11.2020 तक कालीकरण वर्क पूर्ण कर दूंगा।
5. यह कि मैं रोड फर्निचर और फ्लैंक दिनांक-15.12.2020 तक पूर्ण कर दूंगा।

⑥ यह कि संप्रति इसी शपथ पत्र के अलावा इससे संबंधित कोई कार्रवाई या शपथ पत्र में वर्णित सभी बातें मेरी निर्देशानुसार लिखी गयी है जिसे मैं ठीक ढंग से पढ़ कर व पढ़वाकर सुन व समझ लिया तथा अपनी जानकारी में इसे सत्य एवं सही पाकर हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता

गोपाल कुमार सिंह

who has signed or Put

ADVOCATE, Barh (Patna)

27.11.2020

Planning Sy.
Name of Work — Const. of Road from Dhovaniwala, to
Barma.

Schedule XLV-Form No. 134

Agency — Gopal Kumar Singh.

Shivnar, Mahara

Pahra.

DIVISION

~~100~~ 0.50 Y. Barma

SUB-DIVISION

331

Measurement Book

Date of Agreement — 3.7.18

Date of completion — 2.4.19

Attested

[Signature] 04/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

[Signature]
5/12/20

S-1 Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
3rd on A.C. Dill					
14/11/19 - Cement for road from					
Dharichal to Bohama					
Agency - Gopal Kumar Singh					
Shivnagar, Mukama, Patna.					
Date of work - 03.07.2018					
Time of completion 02.04.2019					
Ag. Value - Rs. 8349963 = 50% -					
percentage - 30.262 = 17.7					

①	consolidation of granular sub				
	base by packing - do - do -				
		$1 \times 15 \times \frac{4.10 + 3.75}{2} \times 0.10 = 5.887$			
		$1 \times 15 \times 3.75 \times 0.10 = 5.625$			
		$1 \times 30 \times \frac{3.75 + 6.80 + 3.75}{2} \times 0.10 = 11.25$			
		$1 \times 30 \times \frac{6.60 + 6.60 + 3.75}{2} \times 0.10 = 15.525$			
					38.287 m ³

②	ply laying spreading &				
	compacting with stone metal				
	long with - do - do -				
		$1 \times 15 \times \frac{4.10 + 3.75}{2} \times 0.075 = 4.415$			
		$1 \times 15 \times 3.75 \times 0.075 = 4.218$			
		$1 \times 30 \times \frac{3.75 + 6.80 + 3.75}{2} \times 0.075 = 8.437$			
		$1 \times 30 \times \frac{6.60 + 6.60 + 3.75}{2} \times 0.075 = 11.643$			

Continuation

28.713 m³

A. Prasad

09/12/20
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. WORKS DIVISION
 BARH
 9/12/20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
③ E/W in execution in boundary & channel — do —					
H/W —	2	4.70	1.15	0.45	4.864
Below pipe	1	5.35	1.13	0.365	2.21
					7.074
④ p/v p/c-c M ₁₅ (1:2.5:5) as levelling course in boundary complete — do — do —					
H/W —	2	4.70	1.15	0.15	1.621
Below pipe	2	1	5.3	1.13	0.25
Less for pipe			0.25	0.785	
				$0.163^2 \times 5.85$	6.0790
					3.825
⑤ p/v & laying R.C.C. NP ₃ for culverts on first class bedding of granular — do — do —					
	1	4	2.5	m	10 m.
⑥ plain cement conc in sub structure complete — do — do —					
	2	4.7	$\frac{1.10 + 0.50}{2}$	2.20	15.51
Less for pipe	2	π	$\frac{(0.83)^2}{4}$	0.53	10.574
					14.936 m ³
⑦ concrete of un reinforced cement conc pavement thick ness as per — do — do —					

Continuation

Continuation

Attested

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
09/12/20
4/12/20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					$1 \times 30 \times 3.75 \times 0.19 = 21.375$
					$1 \times 15 \times 3.75 \times 0.19 = 10.687$
					$1 \times 24 \times \frac{3.75 + 5.85 + 3.75}{3} \times 0.19 = 20.292$
					$52.354 m^3$

B/S
29/10/2020
J.E

⑧ p/v laying spreading & compacting WBM stone mastic

Gr III with specilor - do - do

					$1 \times 15 \times \frac{4.10 + 3.75}{2} \times 0.075 = 4.415$
					$1 \times 15 \times 3.75 \times 0.075 = 4.218$
					$1 \times 30 \times 3.75 \times 0.075 = 8.437$
					$1 \times 30 \times 3.75 \times 0.075 = 8.437$
					$1 \times 30 \times \frac{6.60 + 3.75}{2} \times 0.075 = 11.643$
					$28.713 m^3$

B/S
22/10/2020
J.E

⑨ p/v & applying primer coat

with bit-umen emulsion (SS)

on prepared - do - do

					$1 \times 30 \times \frac{5.8 + 3.75}{2} = 143.25$
					$19 \times 30 \times 3.75 = 2137.50$
					$1 \times 30 \times \frac{3.75 + 4.6 + 3.75}{3} = 123.00$
					$1 \times 30 \times \frac{3.75 + 4.5 + 3.75}{3} = 120.00$
					$10 \times 30 \times 3.75 = 1125.00$
					$5 \times 30 \times 3.75 = 562.50$
					$1 \times 15.0 \times \frac{4.10 + 3.75}{2} = 58.875$

Continuation

Attended

04/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. WORKS DIVISION
BAPH
04/12/20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1	30	3.75	0.19	21.375
	1	15	3.75	0.19	10.687
	1	24	$\frac{3.75 + 5.85 + 3.75}{3}$	0.19	20.292
					52.354 m ³

B/S
29/10/2020
J.E

⑧ p/v laying spreading &

compacting WBM stone mital

bottom with specific slope

	1	15	$\frac{4.10 + 3.75}{2}$	0.075	4.415
	1	15	3.75	0.075	4.218
	1	30	3.75	0.075	8.437
	1	30	3.75	0.075	
	1	30	$\frac{6.60 + 3.75}{2}$	0.075	11.643
					28.713 m ³

B/S
22/10/2020
J.E

⑨ p/v & applying primer coat

with bit-umen emulsion (SS)

on prepared sub-grade

	1	30	$\frac{5.8 + 3.75}{2}$		143.25
	19	30	3.75		2137.50
	1	30	$\frac{3.75 + 4.8 + 3.75}{3}$		123.00
	1	30	$\frac{3.75 + 4.5 + 3.75}{3}$		120.00
	10	30	3.75		1125.00
	5	30	3.75		562.50
	1	15.0	$\frac{4.10 + 3.75}{2}$		58.875

Continuation

Attended

04/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
04/12/20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					$1 \times 1.5 \times 3.75 = 56.25$
					$1 \times 30 \times 3.75 = 112.50$
					$1 \times 30 \times \frac{6.60 + 3.75}{2} = 155.25$
					$4594.125 m^2$
B/S 25/11/2020 J.E					
⑩ p/v 20mm thick open grade					
premium carpet using bitumen					
emulsion					
					$1 \times 30 \times \frac{5.8 + 3.75}{2} = 143.25$
					$19 \times 30 \times 3.75 = 2137.50$
					$1 \times 30 \times \frac{3.75 + 4.8 + 3.75}{3} = 123.00$
					$1 \times 30 \times \frac{3.75 + 4.5 + 3.75}{3} = 120.00$
					$10 \times 30 \times 3.75 = 1125.00$
					$5 \times 30 \times 3.75 = 562.50$
					$1 \times 1.5 \times \frac{4.10 + 3.75}{2} = 56.875$
					$1 \times 1.5 \times 3.75 = 56.25$
					$1 \times 30 \times 3.75 = 112.50$
					$1 \times 30 \times \frac{6.60 + 3.75}{2} = 155.25$
					$4594.125 m^2$
⑪ p/v & laying seal coat					
sealing the void in bitu-					
men					
area vide item b ⑩ & Tm					
					page no (17) $4594.125 m^2$
B/S 12/11/2020 J.E					

Continuation

A. Haskel

04/12/20

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

04/12/20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(12) concrete subgrade for					
then shoulder with approved					
material obtained - clear					
					$2 \times 20 \times 30 \times 1.125 \times 0.15 = 202.50$
					$2 \times 14 \times 30 \times 1.125 \times 0.15 = 141.75$
					$2 \times 1 \times 10 \times 1.125 \times 0.15 = 3.375$
					$2 \times 5 \times 30 \times 1.125 \times 0.15 = 50.625$
					$2 \times 6 \times 30 \times 0.60 \times 0.15 = 32.40$
					<u>430.65 m³</u>

(13) ~~concrete~~ ~~embankment~~
~~with approved material~~

from borrow pit - clear				
CH	C/S	mean length volume		
0	4.311	—	—	—
50	3.22	3.765	50.00	188.25
100	2.661	2.940	50.00	147.00
150	5.655	4.158	50.00	207.90
200	5.722	5.688	50.00	284.40
250	4.019	4.870	50.00	243.50
300	2.302	3.160	50.00	158.00
350	1.683	1.992	50.00	99.60
400	1.738	1.710	50.00	85.50
450	1.752	1.745	50.00	87.25
500	1.576	1.664	50.00	83.20
550	1.725	1.650	50.00	82.50

Continuation

Attached

29/12/20
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. WORKS DIVISION
 BARH

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH	CHS	Mean Length			Volume
600	4.139	2.932	50.00		146.60
650	3.51	3.824	50.00		191.20
700	4.36	3.935	50.00		196.75
750	3.54	3.950	50.00		197.50
800	5.126	4.333	50.00		216.65
850	2.538	4.332	50.00		216.60
900	2.023	2.780	50.00		139.00
950	6.938	4.480	50.00		224.00
1000	3.014	4.976	50.00		248.80
1050	1.438	2.226	50.00		111.30
1100	1.433	1.435	50.00		71.75
1150	0.535	0.984	50.00		49.20
1200	1.06	1.097	50.00		52.35
1250	0.973	1.266	50.00		63.30
1300	1.086	1.029	50.00		51.45
1350	0.613	0.849	50.00		45.846
0	1.593				
50	1.56	1.576	50.0		78.80
100	1.583	1.571	50.0		78.55
150	1.276	1.426	50.0		71.30
170	1.255	1.262	20.0		25.24
					4143.286 m ³
Less cross thickness					
(1) Less by vol 2 TMD page					
m (10) & (14)		618.629	+ 38.287		= (2) 656.916

Continuation

Attached
 04/12/20
 EXECUTIVE ENGINEER
 R.W.D. WORKS DIVISION
 BARH
 4/11/20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(ii) W.B.M. lot T 12 of side TMB					
page no (11) & (14)		315.841	28.713		344.554
(iii) W.B.M. lot T 12 of side TMB					
page no (11) & (14)		315.841	28.713		344.554
(iv) C.C. pavement T 12 of side TMB					
page (11) & (15)		182.365	52.354		234.719
(v) P.W. lot T 12 of side TMB					
(17) & (18) & (19)		4594.125	0.02		91.88
(vi) Subgrade T 12 of side TMB					
page (10) & (13)				(-)	281.25
					2189.413 m ²

(i) E/W lot with 1000 m road					
E/W lot = 2189.413 x 0.25					547.353
Less previous period lot side					
TMB page no (10) & (11) & (12)					409.309
Net E/W lot					138.044
(ii) E/W lot with 100 m road					
E/W lot = 2189.413 x 0.75					1642.06
Less previous period lot side					
TMB page no (10) & (11) & (12)					1227.927
					414.133 m ²

(14) R.C.C. M 15 grade km					
local stone - do - do -					
& dispen at 515					

Continuation

Attested

04/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

00910
4/12/20

Contents of area	Details of actual measurement				Particulars
	No.	L.	B.	D.	
(i) 200 m stone					
(ii) 200 m stone					
(iii) 200 m stone					
(iv) 200 m stone					
(v) 200 m stone					
(vi) 200 m stone					
(vii) 200 m stone					
(viii) 200 m stone					
(ix) 200 m stone					
(x) 200 m stone					
(xi) 200 m stone					
(xii) 200 m stone					
(xiii) 200 m stone					
(xiv) 200 m stone					
(xv) 200 m stone					
(xvi) 200 m stone					
(xvii) 200 m stone					
(xviii) 200 m stone					
(xix) 200 m stone					
(xx) 200 m stone					

Sch. XLV-Form No. 134
21


A. H. Patel
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH
02/11/20
02/11/20

02/11/20
02/11/20

WORK PROGRAMME

Name of Work :- Dhovichak to Davhama

	Up to Nov 20	December 2020
E/w	80%	20%
GSB	100%	
WBM Gr- II	100%	
WBM Gr- III	100%	
CD	100%	
PCC M30	100%	
Cold Premixing	70%	30%
Road Furniture	20%	70%

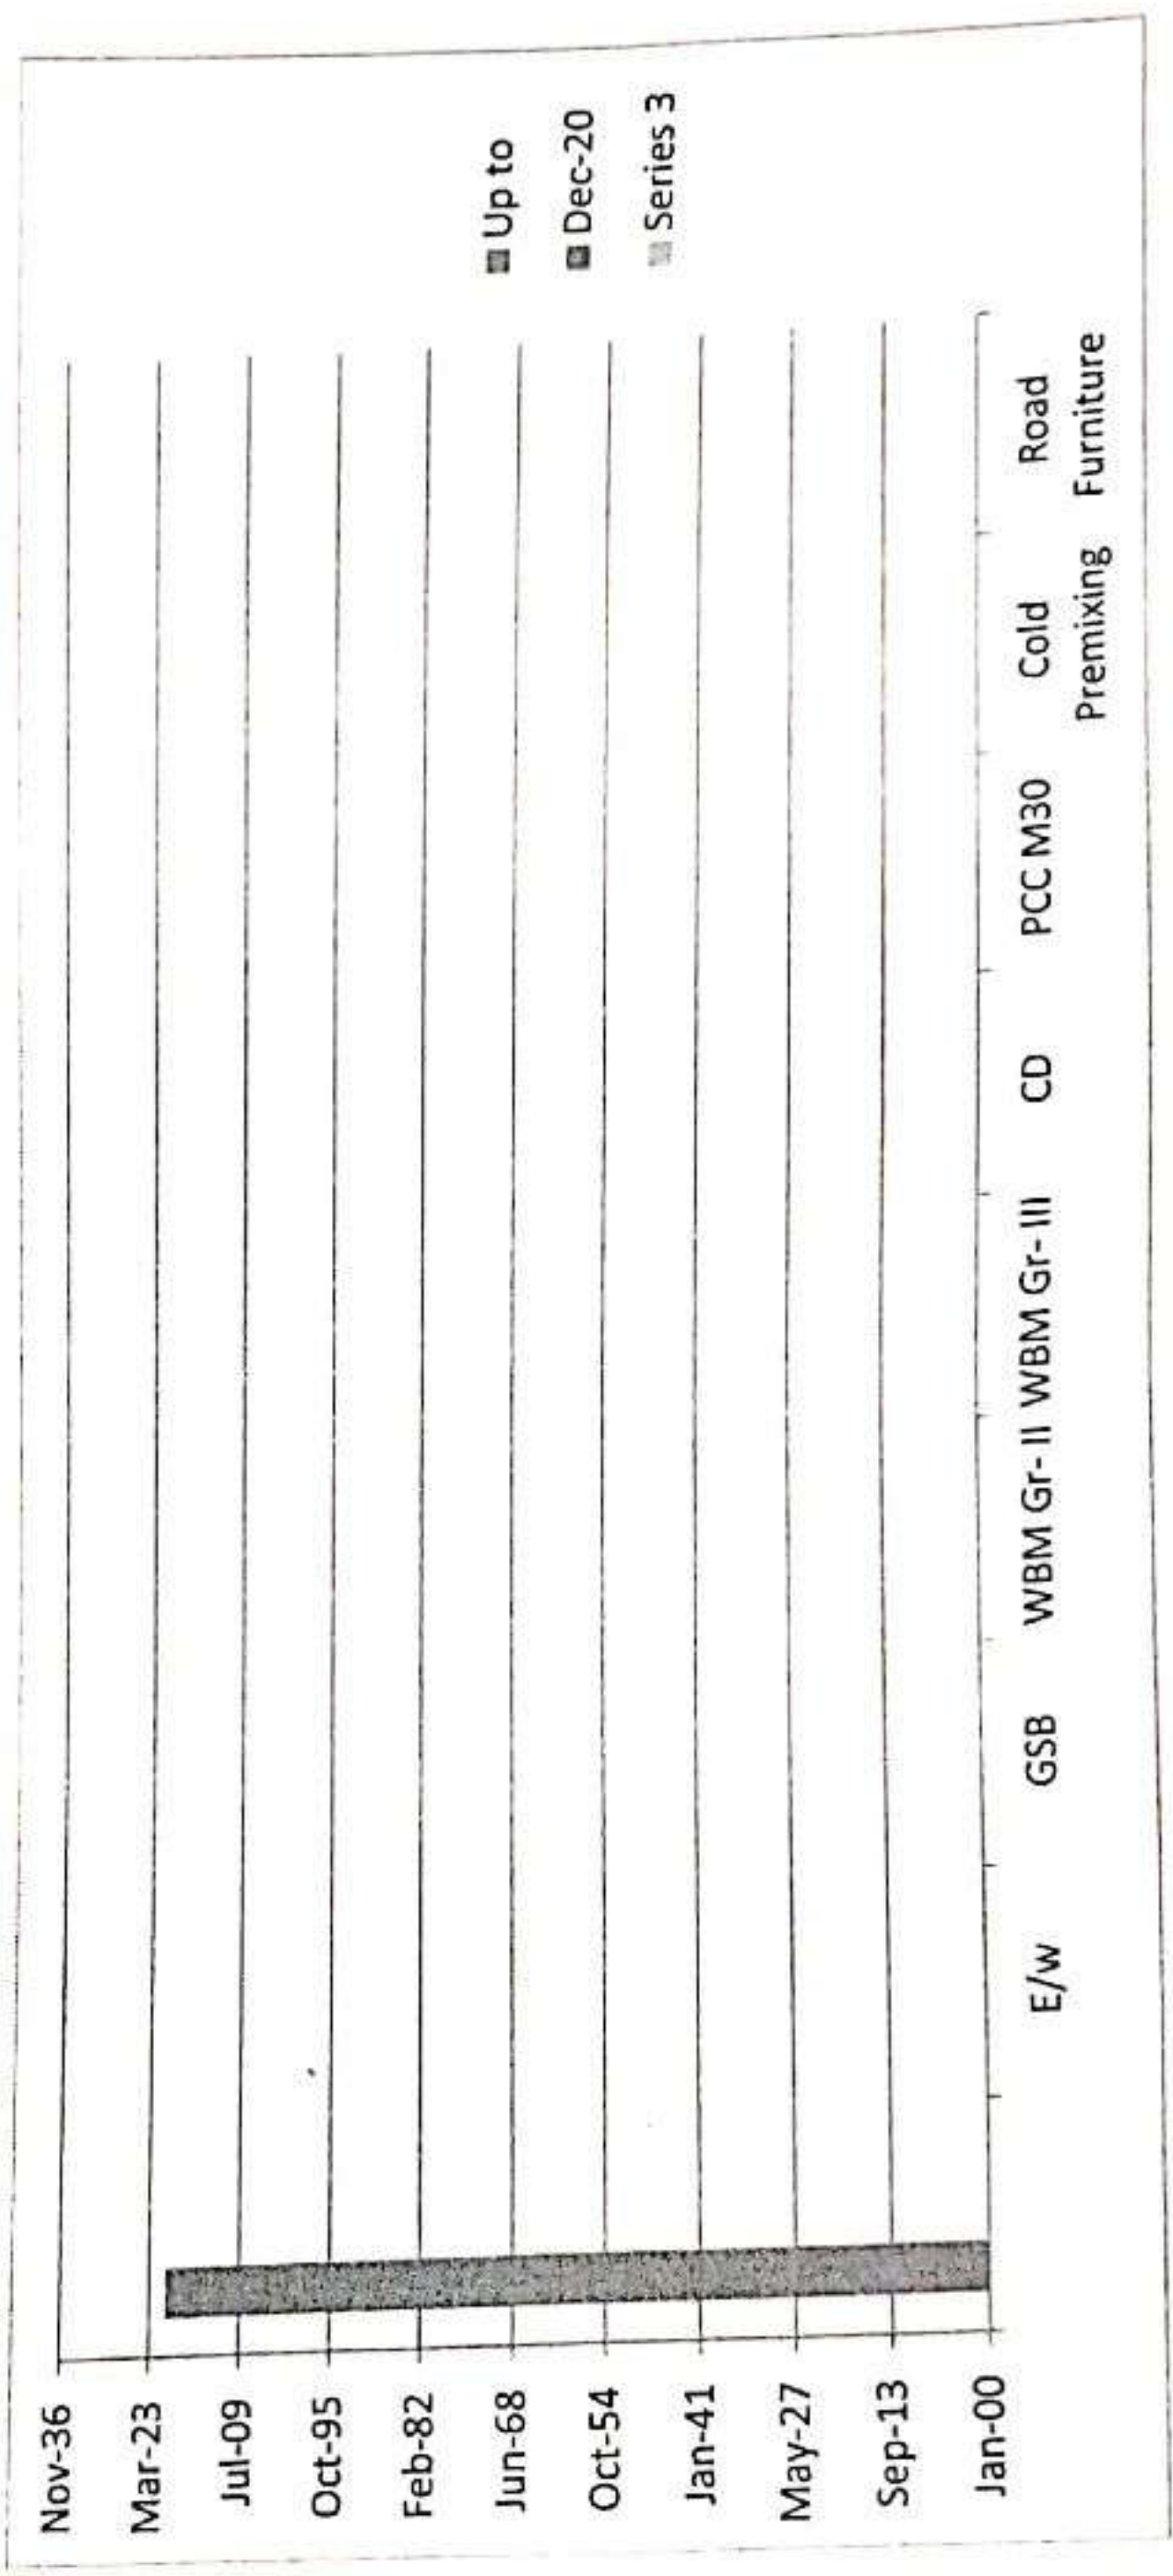

Accepted

04/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.M.D. WORKS DIVISION
BAPR

Geopal Kumar Singh
Signature of Agency

Proforma for Hindrance

Name of Work - Dhovichak to Davma
 Package No.- BR-26R-177
 Agreement No. - 18/SBD/2018-19
 Contract date of the completion -03.07.2018
 Extension applied for : - 02.04.2019

District - Patna
 Division - Barh
 Block - Pandarak

Sl.No.	Type & Nature of Hindrance	Date of Start of Hindrance	Date of removal of Hindrance	No. of Days of Hindrance	Official evidence document regarding delay
1	पथ में जमीन विवाद होने के कारण	31.01.2019	31.01.2020	365	अंचलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रगति पर लाया गया तत्पश्चात् 22.03.2020 से पुरे देश भर में कॉविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था एवं उसके कारण कार्य पुर्णतः बंद हो गये था
2	कॉविड-19 एवं लॉकडाउन	22.03.2020			लॉकडाउन संवेदको के लिए 15.04.2020 से खुल गया परन्तु कार्य करने वाले लोगो के आभाव में कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी इस कार्य को मेरे द्वारा 15.12.2020 तक पुर्ण कर लिया जायेगा।

Certified that above facts are true and correct in my belief and knowledge.

Executive Engineer
 RWD Works Division Barh

04/12/20

Gopal Kumar Singh
