

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।**

पत्रांक:- 1171

दिनांक:- 15.07.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- एम0आर0 (3054) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन **SISO WEST CHOWK to SISO EAST CHOWK (MR)** पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि एम0आर0 (3054) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं0- 24MBD/2018-19 का **SISO WEST CHOWK to SISO EAST CHOWK (MR)** निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-15.05.2019 को समाप्त करना था। लेकिन कार्य स्थल पर बाढ़, वास्तविक एकरारनामा की तिथी पर संवेदक के द्वारा दी गई पत्र में संवेदक की बच्ची का ईलाज दिल्ली ए0आई0आई0एम0स0 बिमार रहने के कारण कार्यपालक अभियंता के द्वारा 15.08.2019 को संवेदक के द्वारा किया गया था एवं कोरोना महामारी आ जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। अब वर्तमान में कार्य ^{31.12.2020} ~~15.07.2020~~ तक पूर्ण कर दिया जायगा। किया गया कार्य विषिष्टि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।

निर्देशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. मापि पुस्तिका संलग्न है।
7. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।



अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1. अभिकर्ता का नाम:—SANJEEV KUMAR JHA
2. कार्य का नाम:— SISO WEST CHOWK to SISO EAST CHOWK (MR)
3. एकरारनामा संख्या:—24MBD/2019-20
4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य:— 83.96783 लाख
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:—89.320 लाख
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि:—16.11.2018
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:—15.05.2019
8. वास्तविक के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :—~~15.07.2021~~ 31.12.2020
9. कार्य विलम्ब का कारण:— इस कार्य में विलम्ब के कारण कार्य स्थल पर बाढ़ आ जाने, वास्तविक एकरारनामा की तिथी पर संवेदक के द्वारा दी गई पत्र में संवेदक की बच्ची का ईलाज दिल्ली ए0आई0आई0एम0स0 बिमार रहने के कारण कार्यपालक अभियंता के द्वारा 15.08.2019 को संवेदक के द्वारा किया गया था एवं कोरोना महामारी आ जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका।
10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात:—20.0%
11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करे:— नहीं।
12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी:— नहीं।
13. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति:—
14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर:— 
15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:— बच्चे शंखर बिमार होने बाद आ जाने के कारण कार्य समय पर नहीं हो सका। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् Covid-19 Lockdown के कारण कार्य अनुवर्त हो सका। कार्य आरम्भ 15-07-21 से कार्य प्रारम्भ हो रहा है।
16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :— अतिक्रमण, बाढ़ एवं लोक डांस के कारण  15/07/20
17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:— कार्य में विलम्ब आने के कारण कार्य समय पर नहीं हो सका। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् Covid-19 Lockdown के कारण कार्य अनुवर्त हो सका। कार्य आरम्भ 15-07-21 से कार्य प्रारम्भ हो रहा है।
18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:— 15.07.2020

Revised Work Programme											
Name of Work- SISO WEST CHOWK to SISO EAST CHOWK (MR)											
Name of Division-RWD WORK'S DIVISION DARBHANGA1											
S.No	ITEM	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jly-2020	Aug-20	SEP-20	OCT-20	NOV-20	DEC-20
1	E/W										
2	GSB										
3	WBM GRILL										
4	PCC										
5	ROAD FURNITURES										

Contractor Sign

Li 57/9 3/10/20

Executive Engineer

R.W.D. Work Division, Darbhanga1

Rural Works Department, Govt. of Bihar



PIUDarbhanga-1
Wing:-CE-3, Patna
Circle:-Darbhanga
Division:-Darbhanga-1
No Of Visit:-32

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports QMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request
Contractors Debar Class 1 Road Format Time Extension Contractors Black List Maintenance Contractor Revoke Flood/Rain Damage Roads Poorak Core network
Crash Inspection Emergent Repair

MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme: MR	Fin Year: All	
Name of Road(English)	SISO WEST CHOWK to SISO EAST CHOWK(On-going)	
Selection of Schemes	DPR Submitted	
Amount: 89.32000	Amount: 86.65000	Length(In KM:) 1.550
Technical Approval	Technical Sanction	
Amount: 86.44002	Amount: 82.57045	Length(In KM:) 1.550
Administrative Sanction / Administrative Approva	Tender	
Amount: 89.32100	Amount: 82.570450	
Updated Expenditure (Maintenance Amt)		
Amount: 0.000		
Agreement		
Main Work Amt: 80.749200	Maintenance Amt: 3.758910	Length(In KM:) 1.550
Expenditure(In Lakhs)		
Upto 31/03/19: 0.000000	Upto Last Month: 0.000000	During This Month: 0
Sub Base(In KM)		
Upto 31/03/19: 0.000	Upto Last Month: 1.550	During This Month: 0
Base(In KM)		
Upto 31/03/19: 0.000	Upto Last Month: 0.000	During This Month: 0
Surface(In KM)		
Upto 31/03/19: 0.000	Upto Last Month: 0.000	During This Month: 0
Project Status: On-going	No of Habitations: 2	Connected Habitations: 0 -
Environmental Social Management & FrameWork		
Road Insurance	ESMF(IF any) Yes	ESMF Remarks Y
Upload Files:		
Images: Choose Files No file chosen	Documents: Choose Files No file chosen	

©Rural Works Department, Govt. of Bihar

29/02/2020



25 FEB 2020

Sl. No. 2365 Date.....

लेख्य प्रमाणक महोदय,
प्रभारी शपथ पत्र दरभंगा ।

शपथ पत्र

मैं **M/s Sanjeev Kumar Jha, AT-Harouli, P.O- Sati Ghat P.S- K.Asthan , Dist- Darbhanga** उम्र-46 वर्ष, शपथ पूर्वक वयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं **MR** योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।
3. **SISO WEST CHOWK to SISO EAST CHOWK (MR)** तक पथ निर्माण कार्य।
4. उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 15.08.2020 को कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
5. उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूँगा।
6. यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।

संजीव कुमार
शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

Shri/Smt. **S. K. Jha**
who is identified by Shri/Smt. **S. P. Jha**
Advocate Solemnly, Atit...

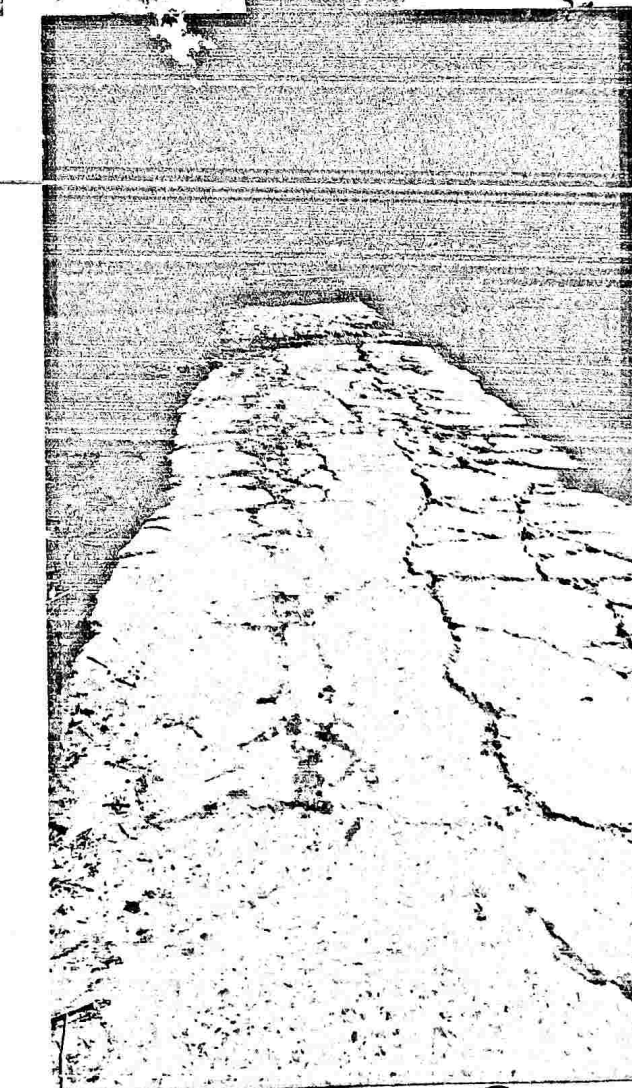
Rajiv Ranjan
Notary Public, Darbhanga
Rajiv Ranjan
25/2/2020

Sankar Kumar
Suraj Prasad
Anil Kumar
25.2.2020



शीर्ष 3054MR मरम्तीयां जनान्तर

योजना का नाम शीर्ष 3054 तक सड़क मरम्ती कार्य
पंकेज संख्या 24MBD/2019-20
प्रा. राशि 8450811/- लाख पथ की लम्बाई 1.5 कि.मी.
उत्थान नक रज. राशि की राशि 380953/- लाख
कार्य प्रारंभ की तिथि 16/11/2018 कार्य समाप्ति की तिथि 15/05/2019
संबंधक का नाम संजीव कुमार, दरभंगा
कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता प्रा. राशि कार्यपालक ए.एस.आर.
ग्राहक कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा वित्त संचालित



8/11/19
TF

AC

EE
Datta 10-1

