

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम

पत्रांक :- ९३९ मनु

दिनांक :- ८.९.२०

प्रेषक : अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषय : कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज से प्राप्त शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत
Derhgoon-Kataibal via to Tilakpura (BR-28R-045) निर्माण
कार्य का समयवृद्धि के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बिक्रमगंज के
पत्रांक-1002 अनु० दिनांक- 04.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण
कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष शीर्ष शीर्ष PMGSY
योजनान्तर्गत Derhgoon-Kataibal via to Tilakpura (BR-28R-045) पथ
निर्माण कार्य का समय विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेखित है कि
जी०एस०बी० की Quantity ना स्थल पर था और ना ही डी०पी०आर० एवं
Agreement में था। BOQ Revise की प्रक्रिया में विलम्बा होने के कारण निर्माण
कार्य समय सीमा के अंदर समाप्त नहीं हो सका। उक्त पथ का कार्य दिनांक 31.03.2021
तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जिसका Work Programme विहित प्रपत्र में तैयार कर
संलग्न किया गया है।

अतएव कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बिक्रमगंज के
द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में 31.03.2021 तक अवधि विस्तार हेतु
अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है।

अनु:- यथोक्त।

विश्वसभाजन

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल, सासाराम
८.९.२०

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज

स्थल जांच प्रतिवेदन

शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत Derhgoon-Kataibal Via To Tilakpura Package No. BR-28R-045 (Agreement No. 23/PMGSY/2018-19) का कार्य संवेदक श्री बालेश्वर प्रासद सिंह, गाम - दुधैला, मनेर पटना को दिनांक 08.01.2019 को आवंटित हुआ तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.12.2019 था परन्तु स्थल जांचोपरांत पाया गया कि स्थल पर GSB की Quantity ना स्थल पर था और ना ही DPR एवं Agreement में दर्शाया गया था। जिसका निराकरण (BOQ Revised) दिनांक 27.06.2020 को अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम के पत्रांक 713 दिनांक 27.06.2020 के द्वारा Derhgoon-Kataibal Via To Tilakpura Package No. BR-28R-045 का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसका एकरारनामा करा लिया गया है। एवं संवेदक के द्वारा समर्पित Work Programme के अनुसार 31.03.2021 तक कार्य पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

P. K. Singh
20/8/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज



बिहार BIHAR

न्यायालय में,

लेख्य प्रमाणक,

आरा

deponent

who is identified by Sh.

Advocate Solemnly
formed and declared before me

शपथ-पत्र

SL-NO-1988/20
19/09/20

मैं, बालेश्वर प्रसाद सिंह, पिता-स्व० राम औतार राय ग्राम वो
पोस्ट-दुधैला, थाना-मनेर, जिला-पटना का रहने वाला हूँ, मैं शपथ

पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:-

यह कि मैं बड़े हुए दर का दावा किसी भी परिस्थिति में पेश नहीं

करूँगा।

Identify the signature of
deponent who has signed
out TIRTI in my presence

Mahendra Prasad Sinha
Advocate
19/09/20

Baleswar prasad sinha

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Name of work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement
 of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1st Running Bell					
Nauaa I work - Dergav to Kafailhal via Telakkura.					
Agency - Baleshwar Basad Singh					
Agreement No - 3PM 63/18-19					
Date of starting - 28.12.18					
Date of completion - 27.12.19					

① Constn of Subgrade					
2 x 14 x 30m					157.50m ³
30.80m x 18.50 x 0.130					83.702m³
28.10m x 18.70 x 0.130					78.999m ³
					5.268m ³
					152.099m ³
					152.768m ³

② PV G.S.C. grading II					
2 x 30m x 3.75 x 0.125					28.125m ³
8.30m x 3.75 x 0.125					3.89m ³
					32.015m ³

③ PV f m G 24 board - 2 No.					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Book					
20/12/19					
28/12/19					

Continuation

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक 1002अनु०/बिक्रमगंज/दिनांक 14/8/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:- PMGSY योजनान्तर्गत Derhgoon-Kataibal via to Tilakpura के समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि PMGSY योजनान्तर्गत Derhgoon-Kataibal via to Tilakpura Package No.-BR-28R-045 (Agreement No.-23/PMGSY/2018-19) का कार्य संवेदक श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम-दुधैला, मनेर पटना को दिनांक-08.01.2019 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का समय दिनांक-27.12.2019 था परन्तु उपरोक्त पथ में G.S.B की Quantity ना स्थल पर था और ना ही D.P.R एवं Agreement में था। BOQ Revise की प्रक्रिया में विलम्ब होने से कार्य अभी तक एकरारनामा के अनुसार ससमय पूर्ण नहीं हुआ। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य पूर्ण करने के लिए दिनांक-31.03.2021 तक समय वृद्धि की माँग की गयी है, जिसका Work Programme विहित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न किया गया है।

अतः उक्त कार्य का दिनांक-31.03.2021 तक समय वृद्धि हेतु अनुरोध कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वनाथ झा
14/8/20
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- 1 Name of Contractor :- Balashubhai Prasad Singh
- 2 Name of Work :- Derhgaon to Katali bal via Tilakpura
- 3 Agreement No :- 23PMUSV/18-19 (BR-28R-045)
- 4 Agreement Value :- 91,00,426-00
- 5 Date of Commencement of work :- 28/12/2018
- 6 Date of Completion stipulated in the Agreement :- 27.12.2019
- 7 Period of which Extension has been given Previously :-
- 8 Work done in % :- 80%
- 9 Period for which Extension now Applied for :- 31/3/2021
- 10 Reason for extension of Time :- BOB/Revised
BOB/Revised date - 27/8/2020
- 11 Recommendation on by J.E. :- Recommended *[Signature]*
13/9/20 J.E.
- 12 Whether Program of work approved :- Yes
- 13 Whether fund available :- Yes
- 14 If spill over From previous financial year whether included in the current work Program or not :- due to BOB/Revised
- 15 Recommendation of S.D.O.. :- Recommended *[Signature]*
13/09/20
- 16 Recommendation of Executive Engineer :- Recommended *[Signature]*
13/09/20
- 17 Recommendation of S.E. :- *[Signature]*
13/09/20
- 18 Recommendation of C.E. :- *[Signature]*
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण विकास विभाग
कार्य अवर, आसरागढ़

Balashubhai Prasad Singh
Signature of Contractor

भारतीय गैर न्यायालयी

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



बिहार BIHAR

25-5-2020 10:10 AM AB 580206

देता का नाम, पता... बालेश्वर प्रसाद सिंह निवासी मनेर पटना

न्यायालय में,

लेख्य प्रमाणक,

श्रीमान
ओम बिहारी स्टांप विक्रेता
दानापुर
23/07 नृसिंह कोट, रागा
शपथ पत्र

No. 1685
Date 04.08.2020

मैं, बालेश्वर प्रसाद सिंह पिता स्व० राम औतार राय ग्राम वो पोस्ट- दुधैला, थाना- मनेर, जिला- पटना का रहने वाला हूँ, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं एक संवेदक हूँ तथा संविदा के कार्यों का निष्पादन करता हूँ।
2. यह कि मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि PMGSY योजना अन्तर्गत Dedhgaon to Katailbal Via Tilakpura तक पथ निर्माण कार्य जिसका पैकज संख्या- BR-28R-045 है जो कार्य मुझे आवंटित हुआ है।
3. यह कि मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उपरोक्त पथ में जी०एस०बी० की Quantity ना स्थल पर था और ना ही डी०पी०आर० एवं एग्रीमेंट में था। जिसके कारण कार्य कराना संभव नहीं था। BOQ Revise की प्रक्रिया में विलम्ब होने से कार्य अभी तक एकरारनामा के अनुसार ससमय पूर्ण नहीं हुआ। BOQ Revise की प्रक्रिया दिनांक 27.06.2020 को पूर्ण हुई जिसके बाद से मैं कार्य कर रहा हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कार्य को पूर्ण करने के लिए समय वृद्धि की आवश्यकता है इसलिए मुझे दिनांक 31.03.2021 तक कार्य पूर्ण करने के लिए समय दिया जाये ताकि कार्य ससमय पूर्ण कर सकूँ।

पुनः मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त लिखि गयी सारी बात मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है, जिसे पढ़ वो पढ़वाकर सुन समझ कर सही पाकर अपना हस्ताक्षर बनाया।

Sri/Smt. Balashwar Prasad Singh
who is identified by Sri. Rinky Kumari
Advocate solemnly affirmed and
declared before me.

Balashwar Prasad Singh
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

S. Kumar
Notary Public Danapur, Patna

Identify the deponent who has
Signed/L T J in my Presence

Rinky Kumari
04.08.2020



बिहार BIHAR

Treasury Office

23 JUN 2020

BHOJPUR, ARRAH

Agreement No.

23 PMUSY/18-19

Bikramganj/ Date 08.01.2019

This agreement made the day of

between **EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, BIKRAMGANJ** (name and address of Employer) (hereinafter called "the Employer") of the one part, and **BALESHWAR PRASAD SINGH, Village & P.O.- Dudhaila, P.S.- Maner, District -PATNA, Bihar (BID ID-319513)** [name and address of Contractor] (hereinafter called "the Contractor" of the other part).

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute **Derhgaon to Kataibal Via Tilakpura (BR-28R-045) (Tender ID-69784)** (name and identification number of Contract) (hereinafter called "the Works") In Connection with Vide RWD Letter no.Dated.....and Engineer in Chief Letter no. - **1058** Dated **12/6/2019** and Estimated Revised by Chief Engineer- 1 RWD, Bihar on Date..... and BOQ approved by S.E. RWD, Works Circle Sasaram on Vide Letter no. **713** Dated **28/6/2019** and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and Completion of Such Works and the remedying of any defects therein at a Revised Cost of Rupees **91,00,426.00 (Rupees Ninety One Lakhs Four Hundred Twenty Six Only)** (Agreement Cost of Original Agreement Rs. **79,29,273.00 (Rupees Seventy Nine Lacs Twenty Nine Thousand Two Hundred Seventy Three Only)** to Difference of Supplementary Agreement of Rs. **11,71,153.00 (Rupees Eleven Lakhs seventy one thousand one hundred fifty three only)** i.e.10.00% (Ten Point Zero-Zero Percent Below BOQ Rs. With the Intended date for the whole of the works 12th Month from the date of issue of work order and all terms & conditions applicable as original agreement.

Baleshwar Prasad Singh

P. M. S.
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Bikramganj

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-112/2020 - 1058 /पटना, दिनांक-12/06/2020

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बिक्रमगंज।

विषय:- शीर्ष PMGSY के तहत कार्य प्रमंडल बिक्रमगंज के अन्तर्गत Derbhooon to Kataibal via Tilakpura (पैकेज सं०- BR-28R-045) पथ निर्माण हेतु मर्दों में हुई वृद्धि के अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-11/प्र०-05-360/2019 1082 (अनु०) दिनांक-27.02.2020 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम का पत्रांक-564, दिनांक-01.06.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से उक्त कार्य का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन मर्दों में वृद्धि के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ था। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी में वर्णित मद संख्या-09. (Construction of Improved Subgrade-) में 843.23 प्रतिशत, 11. (Granular Sub-base with Well Graded Material) में 1937.66 प्रतिशत एवं 23. (Ordinary km Stone) में 50.00 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। सुलभ प्रसंग हेतु अनुमोदित मर्दों की मात्रा की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। पुराने मर्दों में वृद्धि एवं नये मद को एकरारनामा के अंतर्गत शामिल करने पर विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेख करना है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये एवं व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मर्दों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासमाजन

11/06/2020

अभियंता प्रमुख

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

/पटना, दिनांक-12/06/2020

ज्ञापक-BRRDA(HQ)-PMGSY-112/2020 - 1058

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता-1, ग्रा०का०वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य अंचल, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

11/06/2020

अभियंता प्रमुख

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

Baladineer Prasad

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम (रोहतास)।

पत्रांक.....713...../सासाराम/दिनांक...27/6/20...

प्रेषक

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदित करने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज का पत्रांक-817 अनु0/
दिनांक-26.06.2020/

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निम्नलिखित पथों का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदोपरांत अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रखंड	पथ का नाम	पैकेज संख्या	लम्बाई (कि०मी०)	लैंकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)	परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1.	Dinara	T03 (Sarna Distributary) to Dalitpur	BR-28R-004	2.986 km	165.904 Lacs	11714154.08	
2.	Dawath	Dedhgaon-Kataiba to Tilakpura	BR-28R-005	1.63 km	105.540 Lacs	10111585.18	

अनु०:- परिमाण विपत्र एक प्रति।

विश्वासभाजत

22/6/20

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

Balashuwar prasad singh



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पथ का नाम- डेदगाँव से कटौलवाल भाया तिलकपुरा
पथ की लम्बाई- 1.630 कि.मी.

एकराशनामा राशि- 72.32.767 लाख पैकेज सं- BR20R-045


5 साल तक रख-रखाव की राशि- 696.506 लाख

कार्य प्रारम्भ की तिथि- 28.12.2018 कार्य समाप्ति की तिथि- 27.12.2019

संवेदक का नाम- श्री वालेश्वर प्रसाद सिंह

कार्यकारी एजेन्सी- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बिक्रमगंज

पथ का नाम डेदगाँव से कटौलवाल भाया तिलकपुरा

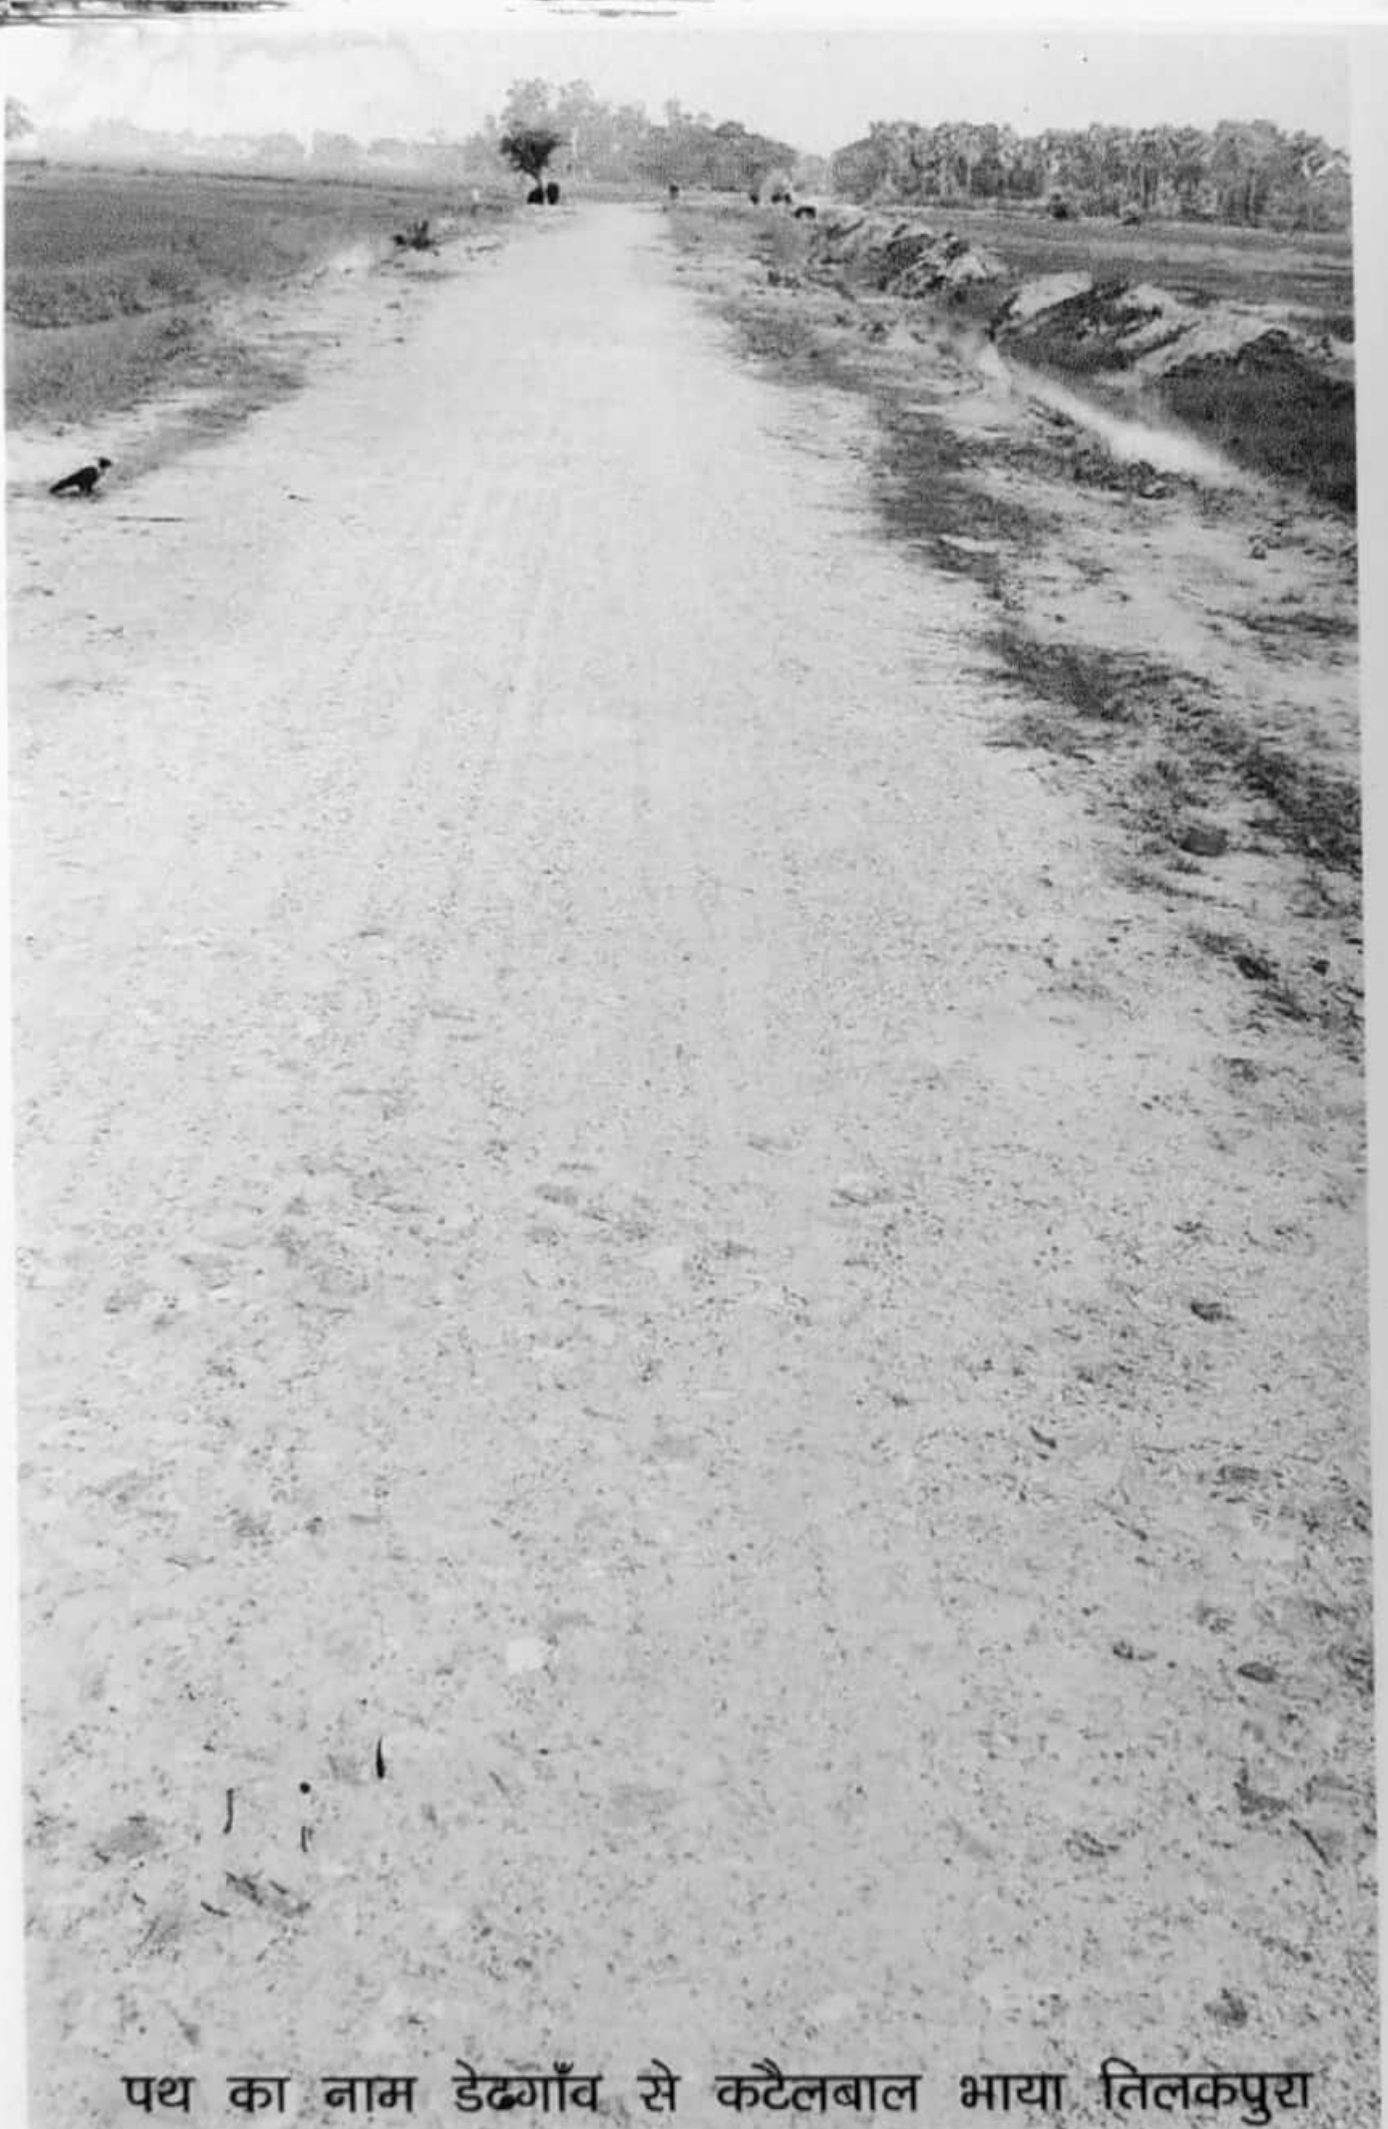

पथ का नाम डेढगाँव से कटैलबाल भाया तिलकपुरा



पथ का नाम डेढगाँव से कटैलबाल भाया तिलकपुरा
