

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

पत्रांक:- 189135

दिनांक:- 24/8/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन **MABBI REO PATH TO MAHTO TOLA, MMGSY-SC** पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं0- 66SBD/2018-19 का **MABBI REO PATH TO MAHTO TOLA, MMGSY-SC** निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-15.11.2019 को समाप्त करना था। लेकिन पथ में बाढ़ का पानी एवं निजी भूमि विवाद के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। अब वर्तमान में कार्य 30.10.2020 तक पूर्ण कर दिया जायगा। किया गया कार्य विधिष्ठि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।

निर्देशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. मापि पुस्तिका संलग्न है।
7. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1. अभिकर्ता का नाम:- DHARMVIR KUMAR MISHRA

2. कार्य का नाम:- MABBI REO PATH TO MAHTO TOLA, MMGSY-SC

3. एकरसनामा संख्या:- 66SBD/2018-19(MMGSY-SC)

4. एकरसनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य:- 47.63250 लाख

5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- 47.81100 लाख

6. एकरसनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि:- 16.02.2019

7. एकरसनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:- 15.11.2019

8. वारिंटविक के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:- 30.10.2020

9. कार्य विलम्ब का कारण:- लेकिन पथ में बाढ़ का पानी एवं निजी भूमि विवाद के

कारण कार्य सरासरी पूर्ण नहीं हो सका ।

10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात:- 83%

11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करे:-
नहीं ।

12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी:- नहीं ।

13. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति:- नहीं ।

14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर:- *Dharmvir Kumar Mishra*

15. कर्णीय अभियंता की अनुशंसा:- वर्ष 2019 में आगे बाढ़ के कारण तथा पथ के अन्तिम बिन्दु पर भूमि विवाद के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। इसे भी कार्य समाप्त हो 30/10/20 तक का समय वृद्धि दिया जा सकता है।

16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :-

(Signature)
24/11/20

23/11/20
J.E.

17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:- बाढ़ एवं भूमि विवाद - विभाग 1, गुजरात - 01/11/2020 तक कार्य समाप्त हो 30/10/2020 तक का समय वृद्धि दिया जा सकता है।

18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:-

(Signature)
24.9.2020

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल
दरभंगा-1

Revised Work Programme

Name of Work- MABBI REO PATH TO MAHTO TOLA,
MMGSY-SC

Name of Division-RWD WORK'S DIVISION DARBHANGA1

S.No	ITEM	Status	Sep-20	Oct-20
1	E/W	Complete		
2	GSB	Complete		
3	CD	Complete		
4	GRIII /BT	Complete		
4	PCC	Complete		
5	Road Furnitures	Ongoing		

Contractor Sign

Shamir Kumar Moha

DHARMVIR KUMAR MISHRA

Vill.-Ketuka, P.O.- Baroul, P.S.- Mabbi (OP), District- Darbhanga (Bihar)

ST No. :: 10ARIPM5276HIZT

Reg. No. :: 4190112(U.E.)

☎ : 9955493668

Ref. : _____

Date : _____

प्रति,

श्री गणेश गुरुकुल-आरौल

आरौल गाँव विभाग दरभंगा-1

विषय :- R.E.C. पराई (मल्ल) मकान दोहा पराई के संबंध में

महोदय,

निवेदन प्रकृत है कि उपरोक्त पराई के सम्बन्ध में
आरौल के आरौल गाँव के 24 ई. वि.सी. के सम्बन्ध में
15-11-1919 की 14-2 वाट आरौल के सम्बन्ध में
में निम्न प्रकार है। एवं कुछ विविध के सम्बन्ध में
नोटबहाल कि पराई 653 नं. 0 ही है। यह है।
नतीजा केवल प्रकृत है। यह है। यह है।
यह है। यह पराई पराई पराई है। यह है।
में यह पराई की 31 नं. 0 पराई पराई है।

अतः श्री गणेश निवेदन है कि यह पराई

में पराई प्रकृत है कि पराई कि पराई

धर्मवीर कुमार मिश्रा
आरौल

Wing -
Circle -
Division -
No Of Visits:

Monthly Progress Road(Physical Progress)

Scheme MMGSY[SC]

Amount: 47.81100

Amount: 47.68018

Amount: 47.81100

Amount: 5,000

Main Work Amt: 44,484840

Maintenance Amt: 3.146440

Upto Last Month: 17.793940

Upto Last Month: 17.793940

Upto Last Month: 0.600

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.700

Upto Last Month: 0.000

No of Habitations: 1

Connected Habitations: 0

Altam 24.09.2020

1/2

सहायक आभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल - हरियाणा

पत्रांक न 4 अक

दिनांक 25/06/20

सेवा में,

अभिलाषीनाशी
हरियाणा, अवर

विषय:- MMDSY अन्तर्गत मलवी R.EO पत्र से महोदय को पत्र में अतिरिक्तता डवान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि इस कार्य के संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित पत्र में पत्र पर अतिरिक्तता है, जिसके पत्र निर्माण में संवेदक को रुकना पड़ेगा है। साथ ही कार्य निष्पादन नहीं हो पा रहा है इस पत्र की कुल लम्बाई 700 मीटर है तथा इसके संवेदक धर्मवीर कुमार सिन्हा हैं।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस पत्र को अतिरिक्तता से मुक्त करने की कृपा की जाय, ताकि कार्य पूर्ण कर सकें।

अनु० - संवेदक से प्राप्त
अभिव्यक्ति का आभारार्थ

विश्वासभाजन
Rajin
25/06/20

सहायक आभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल - हरियाणा

DHARMVIR KUMAR MISHRA

VIII.-Ketuka, P.O.- Baroul, P.S.- Mabbil (OP), District- Darbhanga (Bihar)

No. :: 10ARIPM5270HIZT

Reg. No. :: 4190112(U.E.)

☎ : 9955493668

Date : _____

At : _____

30/11/19

मेरे

सहयोगी, अतिरिक्त
अधिकांश कार्यवाही - 1 पत्र

विषय :- मेरी REC पर से गरीबों को घर बनाने के लिए

सहायता

आवेदन पर के पत्रों में उल्लेख है कि इस घर
में लम्बाई 700 मीटर है परन्तु साफ 70 मीटर
लम्बाई 650 मीटर ही पूरी हो पायी है। आगे
पथ में 50 मीटर में लम्बाई से सिविल वर्क
रहा है एवं आगे का भाग जो 50 मीटर है
वही है जिसके कारण यह पथ बँटके जाने लगे
होकर 4 फुट 6 इंच के लम्बाई का ही पथ
होकर कारण कार्य समाप्त में बाधा है जो कि


आगे भी नष्ट हो सकेगा है कि उक्त
आवेदन कार्यवाही में लगे - 1

अभि
Dharmvir Kumar Mishra
13-11-19

89
29/9/20

समक्ष,

लेख्य प्रमोणक महोदय,
प्रभारी शपथ-पत्र दरभंगा।



शपथ-पत्र

मैं DHARMVIR KUMAR MISHRA, Vill- Ketuka, P.O.-Barioul, P.S.-Mabbi, Dist- Darbhanga उम्र-40 वर्ष, शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं (MMGSY-SC) योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।
3. MABBI R.E.O PATH to MAHTO TOLA (MMGSY-SC) तक पथ निर्माण कार्य।
4. यह कि पथ निर्माण कार्य मेरे द्वारा 30.10.2020 को मेरे द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
5. यह कि उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूँगा।
6. यह कि शपथ-पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ-पत्र है।

Dharmvir Kumar Mishra
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

29.9.2020

Deenamal Prasad
Advocate
29.9.2020

Before me
Dharmvir Kumar Mishra
Advocate
Before me

[Signature]

Suresh Kumar
Public Notary
Darbhanga

Sch. XLV-Form No. 134

Executive Engineer
R W D Works Division

Darbhanga-1

DIVISION

Darbhanga

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 3430
19-20

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

INDEX

Page-Concl'd

प्रमाणित किया जाता है कि
इस माप-पुस्तक में क्रमांक-01 से
100 तक के सार्वजनिक कुल मुहल्ले
अंकित पंक्तियाँ हैं। यह माप-पुस्तक
श्री श्रीमती सुश्री कुमारी प्रवीण, कांठ, ग्रां
कां वि. कार्य अथवा प्रमाणित
दस्तावेज के नाम से निर्मित किया
जाता है।


Executive Engineer
RWD Works Division
Darbhanga-1

25.6.19

श्रीमति सरिता कुमारी, कांठ, ग्रां
कां वि. कार्य प्रशाखा - दरभंगा
को निर्मित किया जाता है।


26/6/19
AE

INDEX

Page-Concl'd.

Sch. XLV-Form No. 13A					Contents of area
Particulars	Details of actual measurement				
	No.	L	B	D	
④ Excavation for road work					
in village of Khandaula					
excavation - all complete					
for circ. portion					
$2 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.10$				$= 4.50 \text{ m}^3$	
$2 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 4.50 \text{ m}^3$	
$2 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 4.50 \text{ m}^3$	
$1 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 2.25 \text{ m}^3$	
				15.75 m^3	
⑤ Construction of granular					
Sub base for providit					
well graded materials					
all complete					

For circ. portion				
for excav.				
$2 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 4.50 \text{ m}^3$
$2 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 4.50 \text{ m}^3$
$1 \times 2 \times 1.50 \times 0.375 \times 0.100$				$= 0.12 \text{ m}^3$
$2 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 4.50 \text{ m}^3$
$1 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 2.25 \text{ m}^3$
$1 \times 2 \times 30.00 \times 0.375 \times 0.100$				$= 0.200 \text{ m}^3$
$1 \times 1.50 \times 1.50 \times 0.100$				$= 0.150 \text{ m}^3$
$4 \times 0.60 \times 0.70 \times 0.100$				$= 0.17 \text{ m}^3$
$1 \times 2.50 \times 1.00 \times 0.100$				$= 0.25 \text{ m}^3$
$5 \times 1.60 \times 1.20 \times 0.100$				$= 0.96 \text{ m}^3$
$1 \times 30.00 \times 3.00 \times 0.100$				$= 9.00 \text{ m}^3$
$2 \times 10.00 \times 3.75 \times 0.100$				$= 3.75 \text{ m}^3$
For B.T. portion				
$4 \times 30.00 \times 2.85 \times 0.200$				$= 91.80 \text{ m}^3$
$1 \times 30.00 \times 2.85 \times 0.200$				$= 15.20 \text{ m}^3$
$2 \times 30.00 \times 2.85 \times 0.200$				$= 2.25 \text{ m}^3$
$1 \times 30.00 \times 2.85 \times 0.200$				$= 45.25 \text{ m}^3$
$2 \times 30.00 \times 2.85 \times 0.200$				184.36 m^3

8/10/19
20/10/19

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) previous layer,					
According to comping					
CORNER materials					
— do — do — do					
Comp left side					
For each part m ⁿ .					
1 x 10. w x 3.80 + 3.75 x 0.025 = 2.83 m ²					
1 x 30. w x 3.75 + 3.80 x 0.075 = 8.52					
1 x 30. w x 3.80 + 3.80 x 0.075 = 8.58					
1 x 30. w x 3.80 + 3.80 x 0.075 = 8.55					
1 x 30. w x 3.80 + 3.75 x 0.075 = 8.07					
1 x 4. w x 3.75 x 0.075 = 1.13					
Curve — 2 x 4. w x 3.75 + 4.00 + 3.75					
x 0.025 = 2.38					
1 x 18. w x 3.75 x 0.025 = 5.56					
3 x 30. w x 3.75 x 0.075 = 25.31					
					70.83 m ²

(F)
20/5/9
me

Date 30/06/19
Page 5.0

CRP
2/19/15

Continuation of 05/04/19
06/07/19
02

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
(1) provision and keep of bench marks Pillar — all complete					
Qty. 1 m			P/1		
@ 4233.39 each					Rs 4233.39
(2) provision and keep Reference mark pillar C four apex km					
Qty. 2.00 m			P/1		
@ 1916.60 No					Rs 3899.20
(3) clearing and grubbing of road Land					
— all complete in					
Qty 0.21 Hect			P/1		
@ 50107.49/Hect					Rs 10523.00
(4) Excavation for road work in soil with hydraulic excavator — all complete in					
Qty. 15.38 m ³			P/2		
@ 7261/m ³					Rs 11244.00
(5) construction of drainage sub-base by providing well graded material — all complete					
Qty. 18436 m ³			P/2		
@ 2738.36/m ³					Rs 504936.30
Continuation					Rs 524729.20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				BLK - R	
① Construction laying & packing					
neonials - all complete					
Qty. 70.43 M ³ wide T.H.C. P/2					
② 9347.8 M ³					235789
③ Construction of 10-1					
reinforced concrete concrete					
barrenment - 6000 M ³ - 91					
complete for					
Qty. 15.18 M ³ wide T.H.C. P/4					
④ 7537.87 M ³					113759520
⑤ provided and tail					
of typical HMGY					
system & dim board					
water logs - all complete					
Qty. 2.10 M ³ wide T.H.C. P/4					
⑥ 9759.79 M ³					1952020
					191961320
Less 0.10 % below a					
per greenment					Rs 192020
					Rs 19,17,69320
Material Statement					
① stone chip/metal/dust - 459.41 M ³					
② sand - 68.03 M ³					

Continuation

$$\frac{10}{10} \frac{20}{20} \frac{5}{5}$$

1st on a/c Running Bill - 19.17.693 =
Limit as per bond - 17,79,394 =

VR No. (09) Date. 29.5.2020

Memo of payment
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars.	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
S.D @ 5.1	—	68970.00			
P.S.D @ 2.1	—	53382.00			
G.T @ 1.1	—	35538.00			
G.S.T @ 2.1	—	35538.00			
Royalty	—	98685.00			74014.00
L.C @ 1.1	—	17794.00			
deduction -)		3,12213.00			289542.00
by CPMS pay -		14,67181.00			1491852.00
total -		1779,394.00			

passed for Rs 1779,394 = {seventeen
laks Seventy nine thousand three
hundred ninety four only

CFMS Ref. No.

20200529093853

DT. 29.5.2020

Executive Engineer

R.W.D. Works Division

Darbhanga-1

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of road					
from Mabbir R.E.S. to P. A. H. road					
to P. A. H. road					
Agency - Sri Tharavandha Kumar Mishra,					
Agreement value - Rs 47,63,300/-					
Appreciation No - 66 SPD/2018-19					
Date of work start - 16-02-2019					
Date of completion - 15/11/2019					
Date of entry - 28/06/2020					

(1) clearing and grubbing					
of road Land					
$1 \times 20.00 \times 3.50 = 70.00 \text{ m}^2$					
$1 \times 5.00 \times 3.50 = 17.50 \text{ m}^2$					
122.50 m ²					
$= 0.01225 \text{ Hect}$					
(2) Construction of G.C.P.					
90% materials					
complete job					
For P.P. provision at start					
$1 \times 8.40 \times 10.00 + 4.75 \times 0.20 = 84.09 \text{ m}^2$					
$1 \times 9.70 \times 4.75 + 3.80 \times 0.20 = 46.44 \text{ m}^2$					
Total - $1 \times 6.20 \times 7.70 + 4.40 \times 0.20 = 48.54 \text{ m}^2$					
Continuation 20 - 24.60 m ² .					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
				116	24.60 m ²
CH - 2 BB - 30 M	70	1	0.14		
1 x 30.0 x 0.14 x 0.20 = 20					20 m ²
1 x 30.0 x 0.70 x 0.20					21.60
1 x 30.0 x 0.50 x 0.20					21.20
1 x 30.0 x 0.85 x 0.20					22.35
1 x 20.0 x 0.85 x 0.20					15.60
1 x 12.50 x 0.85 x 0.20					9.42
1 x 30.0 x 0.70 x 0.20					20.20
					160.29 m ²

Date of entry: 02/02/2020

① powder, layer, spread

Graph comparing work.

Materials	_____	on Complex
-----------	-------	------------

For P.T. Position

$$1 \times 8.40 \times 9.90 + 4.65 \times 0.075 = 458 \text{ kN}$$

$$1 \times 9.90 \times 4.65 + 3.70 \times 1.075 = 3.10 \text{ v}$$

at crime

$$1 \propto \frac{6 \cdot 10 + 0}{2} \propto \frac{7 \cdot 60 + 4 \cdot 30}{2} \propto 0.075 = 1.38$$

CH - 268.30 M $\rightarrow$ 653.30 M

$$\rightarrow 30.0 \times 3.65 + 3.65 \times 0.025 = 8.21 \text{ m}$$

$$81 \times 30.60 \times 3.65 + 3.40 \times 0.955 = 7.934$$

Continuation

60.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$1 \times 20.00 \times 3.40 + 2.60$				$0.075 = 5.25$	"
$1 \times 10.00 \times 3.60 + 3.70$				$0.075 = 2.74$	"
$1 \times 10.00 \times 3.40 + 3.70$				$0.075 = 2.74$	"
$1 \times 20.00 \times 3.00 + 3.25$				$0.075 = 8.38$	"
$1 \times 20.00 \times 2.75 \times 0.075$					5.63
$1 \times 10.00 \times 3.75 + 3.60$				$0.075 = 2.25$	"
$1 \times 20.00 \times 3.60 \times 0.075$					8.10
$1 \times 30.00 \times 3.60 + 3.70$				$0.075 = 8.21$	"
$1 \times 30.00 \times 3.70 + 3.75$				$0.075 = 8.38$	"
$4 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.075$					33.75
$1 \times 25.00 \times 3.75 + 3.70$				$0.075 = 6.98$	"
<u>385.00 m.</u>					<u>115.37 m²</u>

(2) plaster and applying
primer coat (551)

$1 \times 8.40 \times 9.90 + 4.65$				$0.075 = 6.11$	"
$1 \times 9.90 \times 4.65 + 3.70$				$0.075 = 4.13$	"
$1 \times 6.20 + 0 \times 7.60 + 4.30$				$0.075 = 18.44$	"
<u>CH - 263.30 m + 653.30 m</u>					
$1 \times 30.00 \times 3.65$				$0.075 = 109.50$	"
$1 \times 30.00 \times 3.65 + 3.40$				$0.075 = 105.75$	"
$1 \times 30.00 \times 3.40 + 3.70$				$0.075 = 106.50$	"
$1 \times 30.00 \times 3.70 + 3.75$				$0.075 = 111.75$	"
<u>Continuation</u>					<u>554.38 m²</u>

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1 x 20.00 x 3.75			515	0.00	
1 x 10.00 x 3.75 + 3.60					= 36.75
1 x 20.00 x 3.60					= 108.00
1 x 30.00 x 3.60 + 3.70					
			2		= 110.50
1 x 30.00 x 3.70 + 3.75					= 111.75
4 x 20.00 x 3.75					= 450.00
1 x 25.00 x 3.75 + 3.70					= 92.12
			12		
					1538.50

(2) provide and apply
Jaco coat with bitumen

emulsion (RS-1) — Ely

Ely same as item no. (1)

= 1538.50 M³

(3) provide, Layup and
rollup of close packed

precast Surface — 54

Complete the

(Kia sea) Surface)

1 x 8.40 x 7.70 + 4.65 = 61.11

1 x 9.70 x 4.65 + 3.70 = 41.32

Curve — 1 x 6.20 + 0 x 7.60 + 4.30 = 18.44

Ch - 268 20m to 659.30m

1 x 20.00 x 3.65 = 109.50

Continuation 290.38 M³

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			11.7	2.37	27.81 M ²
1 x 30.00 x 2.37		6.5	2.46		16.05 M ²
				2	10.75 M ²
1 x 30.00 x 3.70			3.70		
				2	10.50 M ²
1 x 30.00 x 3.70			3.75		
				2	11.25 M ²
1 x 20.00 x 3.75					75.00
1 x 10.00 x 3.75 + 3.60					36.50
1 x 30.00 x 3.60					108.00
1 x 30.00 x 3.60 + 3.70					102.50
				2	
1 x 30.00 x 3.70 + 3.75					11.75 M ²
				2	
4 x 30.00 x 3.75					450.00 M ²
1 x 25.00 x 3.75 + 3.70					93.75 M ²
					1538.50 M ²
(4) provide R.O.C NIS					
grade K.M. post —					
Qty. 2. No					
(5) 200 M. Stone post - precast					
Qty. 3. 0.16					
(6) provide and fix of					
Semi-reflective cautionary					
Mandatory and inhibitory					
dim Board — set					
complete job					
(i) 600 mm epistaxial					
triangle					
Qty. 2. N5					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(2) 600 mm circular					
Ety. 2 NW					
(8) 600 mm x 410 mm rectangular					
Ety. 2 NW					
(9) primary and strip of					
vertical margin inspection					
Sign Board with logo					
as per upper Board					
Specification				24	
complete job					
Ety. 1 NW (main road Board)					
(10) Road Marking with hot					
applied Thermoplastic					
Compound				on B.T.	
Surface				as complete	
$2 \times 403.30 \times 0.10 = 80.66 \text{ m}^2$					
(11) Construction of Sub-grade					
and earthen shoulders					
with approved materials.					
Sheet attached, complete job (Earth calculation for B.T. position)					
$1 \times 18.80 \times 1.35 \times 0.20 = 4.758 \text{ m}^2$					
$1 \times 18.80 \times 1.20 \times 0.20 = 4.512 \text{ m}^2$					
For inside of W.B.M.					
$2 \times 18.80 \times 1.00 \times 0.075 = 2.345 \text{ m}^2$					
For c.c. pavement					
$3 \times 30.00 \times \frac{0.75 + 1.00}{2} \times 0.335 = 21.60 \text{ m}^2$					32.41
$2 \times 30.00 \times \frac{1.00 + 1.20}{2} \times 0.335 = 24.12 \text{ m}^2$					
Continuation					68.791

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B/A	68.791
2 x 30.00 x 0.90 + 1.35				x 0.225	22.61
1 x 30.00 x 0.90 + 1.40				x 0.325	11.5
1 x 10.00 x 0.90 + 1.40				x 0.325	3.85
B.T. position				1	
3 x 30.00 x 0.65 + 0.95				x 0.225	219.801
				2	
3 x 30.00 x 0.75 + 1.10				x 0.225	22.89
2 x 30.00 x 0.80 + 1.15				x 0.225	216.094
				2	
2 x 30.00 x 0.80 + 1.15				x 0.225	216.094
2 x 30.00 x 0.75 + 1.10				x 0.225	15.26
				2	
2 x 25.00 x 0.75 + 1.10				x 0.225	12.72
				2	
					209.65 m ³

12. Construction of embankment with material obtained from borrow pit - complete job
(Ecm Calculation Sheet is attached this way)

Chainage in (m)	els Area (sq m)	Mean els Area (sq m)	Length (m)	Quantity (cu m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	3.34	—	—	—
50	11.58	2.54	50	127.70
100	2.25	2.009	50	100.45

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
150	1.946	2.103	50		105.15
200	1.785	1.866	50		93.30
250	3.207	2.196	50		124.80
300	3.395	3.301	50		165.05
350	5.022	4.205	50		210.45
400	4.610	4.816	50		240.80
450	4.060	4.335	50		216.75
500	6.373	5.217	50		260.85
550	5.401	5.887	50		254.35
600	5.086	5.244	50		262.20
650	4.373	4.230	50		236.50
653	3.510	3.942	3.00		11.83

payable Qty. = 2450.18 m³

= 2327.67 m³

Reduction:

(A)

(i) G.S.B. Qty. = 184.36 - P/L

160.29 - 5/5

(ii) W.B.H. II 344.65 m³

70.42 m³ - P/L

115.37 m³ - P/L

185.80 m³

(iii) c.c. pavement - 151.18 m³ - P/L

(iv) Sub grade & earthwork

209.65 m³

89.28 m³

(B)

Continuation

[illegible]

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
As per map of map				
(1) provided with strip				
of Bench Mark pillars				
all complete				
Qty. 1.016			1/5	
@ 4233.25/each				R 423320
(2) provided with strip				
reference mark pillars				
Qty. 2.016			P/5	
@ 1946.60/each				R 389320
(3) clearing and grubbing				
of road land				
all complete				

Qty. 0.21	Heet		P/5	
0.01225	Heet		P/8	
0.222	Heet			
@ 50107.49/Heet				R 1112420
(4) Excavation for road				
work in Soil with hydraulic				
excavator				
Qty. 15.35 m			P/5	
@ 7261.14				R 1144200
(5) construction of road				
embankment materials				
obtained from same				
pit				
(for 1000 m. land)			P/16	
Qty. 430.91 m				R 6333920
@ 146.99				R 8373320

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
(6) For 100 m. 10-11.				
Qty 100 m. 10-11				P/16
117.76 ft				127762.00
(7) Construction of Sub. base for 20 m. and 20 m. 20-21.				
well completed				P/15
Qty. 20 m. 20-21				P/15
117.76 ft				81156.00
(8) Construction of Sub. base for 20 m. 20-21.				
well completed				P/15
Qty. 184.36 m				P/15
160.25 m				P/15
344.65 m				P/15
117.76 ft				943948.00
(9) providing laying, spreading & compacting sub-base material				
Qty. 70.43 m				P/6
115.37 m				P/10
185.80 m				P/10
117.76 ft				622091.00
(10) providing and applying primer coat (351)				
Qty. 1538.50 m				P/11
47.52 m				731102.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B/S -	
(11) provide and apply Tada coat (R-1) - 911 complete job					
Qty. 1538.50 m ²				P/11	
@ 16.02/m ²					24647.00
(12) provide, Layup and rolling of close graded premium Surfacing material of 20 mm thickness - 111 complete job (Mid Seal Surfacing)					
Qty. 1538.50 m ²				P/12	
@ 20.9.01/m ²					321562.00
(13) Construction of 47 - reinforced cement concrete pavement 150 galls - all complete job					
Qty. 151.18 m ³				P/6	
@ 3347.85/m ³					235789.00
@ 7537.85/m ³					1139575.00
(14) provide R.C.C. M15 gate K.M. post					
Qty. 2.00 No.				P/12	5096.00
@ 2548.44 each					2548.20
(15) 200 M. stone post					
Qty. .3.00 No.				P/12	
@ 662.01 each					1986.00

Continuation to B-337426420

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
16) provide and fix a Semi reflective, cylindrical marking and informing sign board — an amplifier					
17) 600 mm equilateral triangle Qty. 2 @ No. — P/12 @ 1703.12/No. — Rs. 340620					
18) 600 mm circular Qty. 2 @ No. — P/13 @ 1767.013/No. — Rs. 353420					
19) 600 mm x 450 mm rectangle Qty. 2 @ No. — P/15 @ 1760.420/No. — Rs. 352120					
19) provide and fix a typical MMSY information Sign Board with logo — all complete job.					
Qty. 2 @ No. — P/16 1 @ No. — P/13 03.10 No.					
@ 9759.79 each — Rs. 2927920					
20) Road Marking with Hot applied Thermoplastic compound with reflector glass on B.T. surface — all complete job.					
Qty. 8066 M — P/13 @ 857.16/M — Rs. 6994520					
Continuation — Rs. 34,839420					

[illegible]

22

Sch. XLV-Form No. 134


Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Swing bridge					
(i) Beam No. 1646-04M	1646-04M				
		1646.04	1.77	0.10	= R 281.47
(ii) 115.37M	115.37M				
		115.37	503.34	0.10	= R 5807.207
(iii) 160.25M	160.25M				
		160.25	395.57	0.10	= R 6340.59
(iv) 1538.50M	1538.50M				
		1538.50	10.213	0.10	= R 1571.27
					R 14,000.236

1/21 26772/2012

Y. H. Patel

24. 9. 2012

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमाण्डल
हरपणा-1

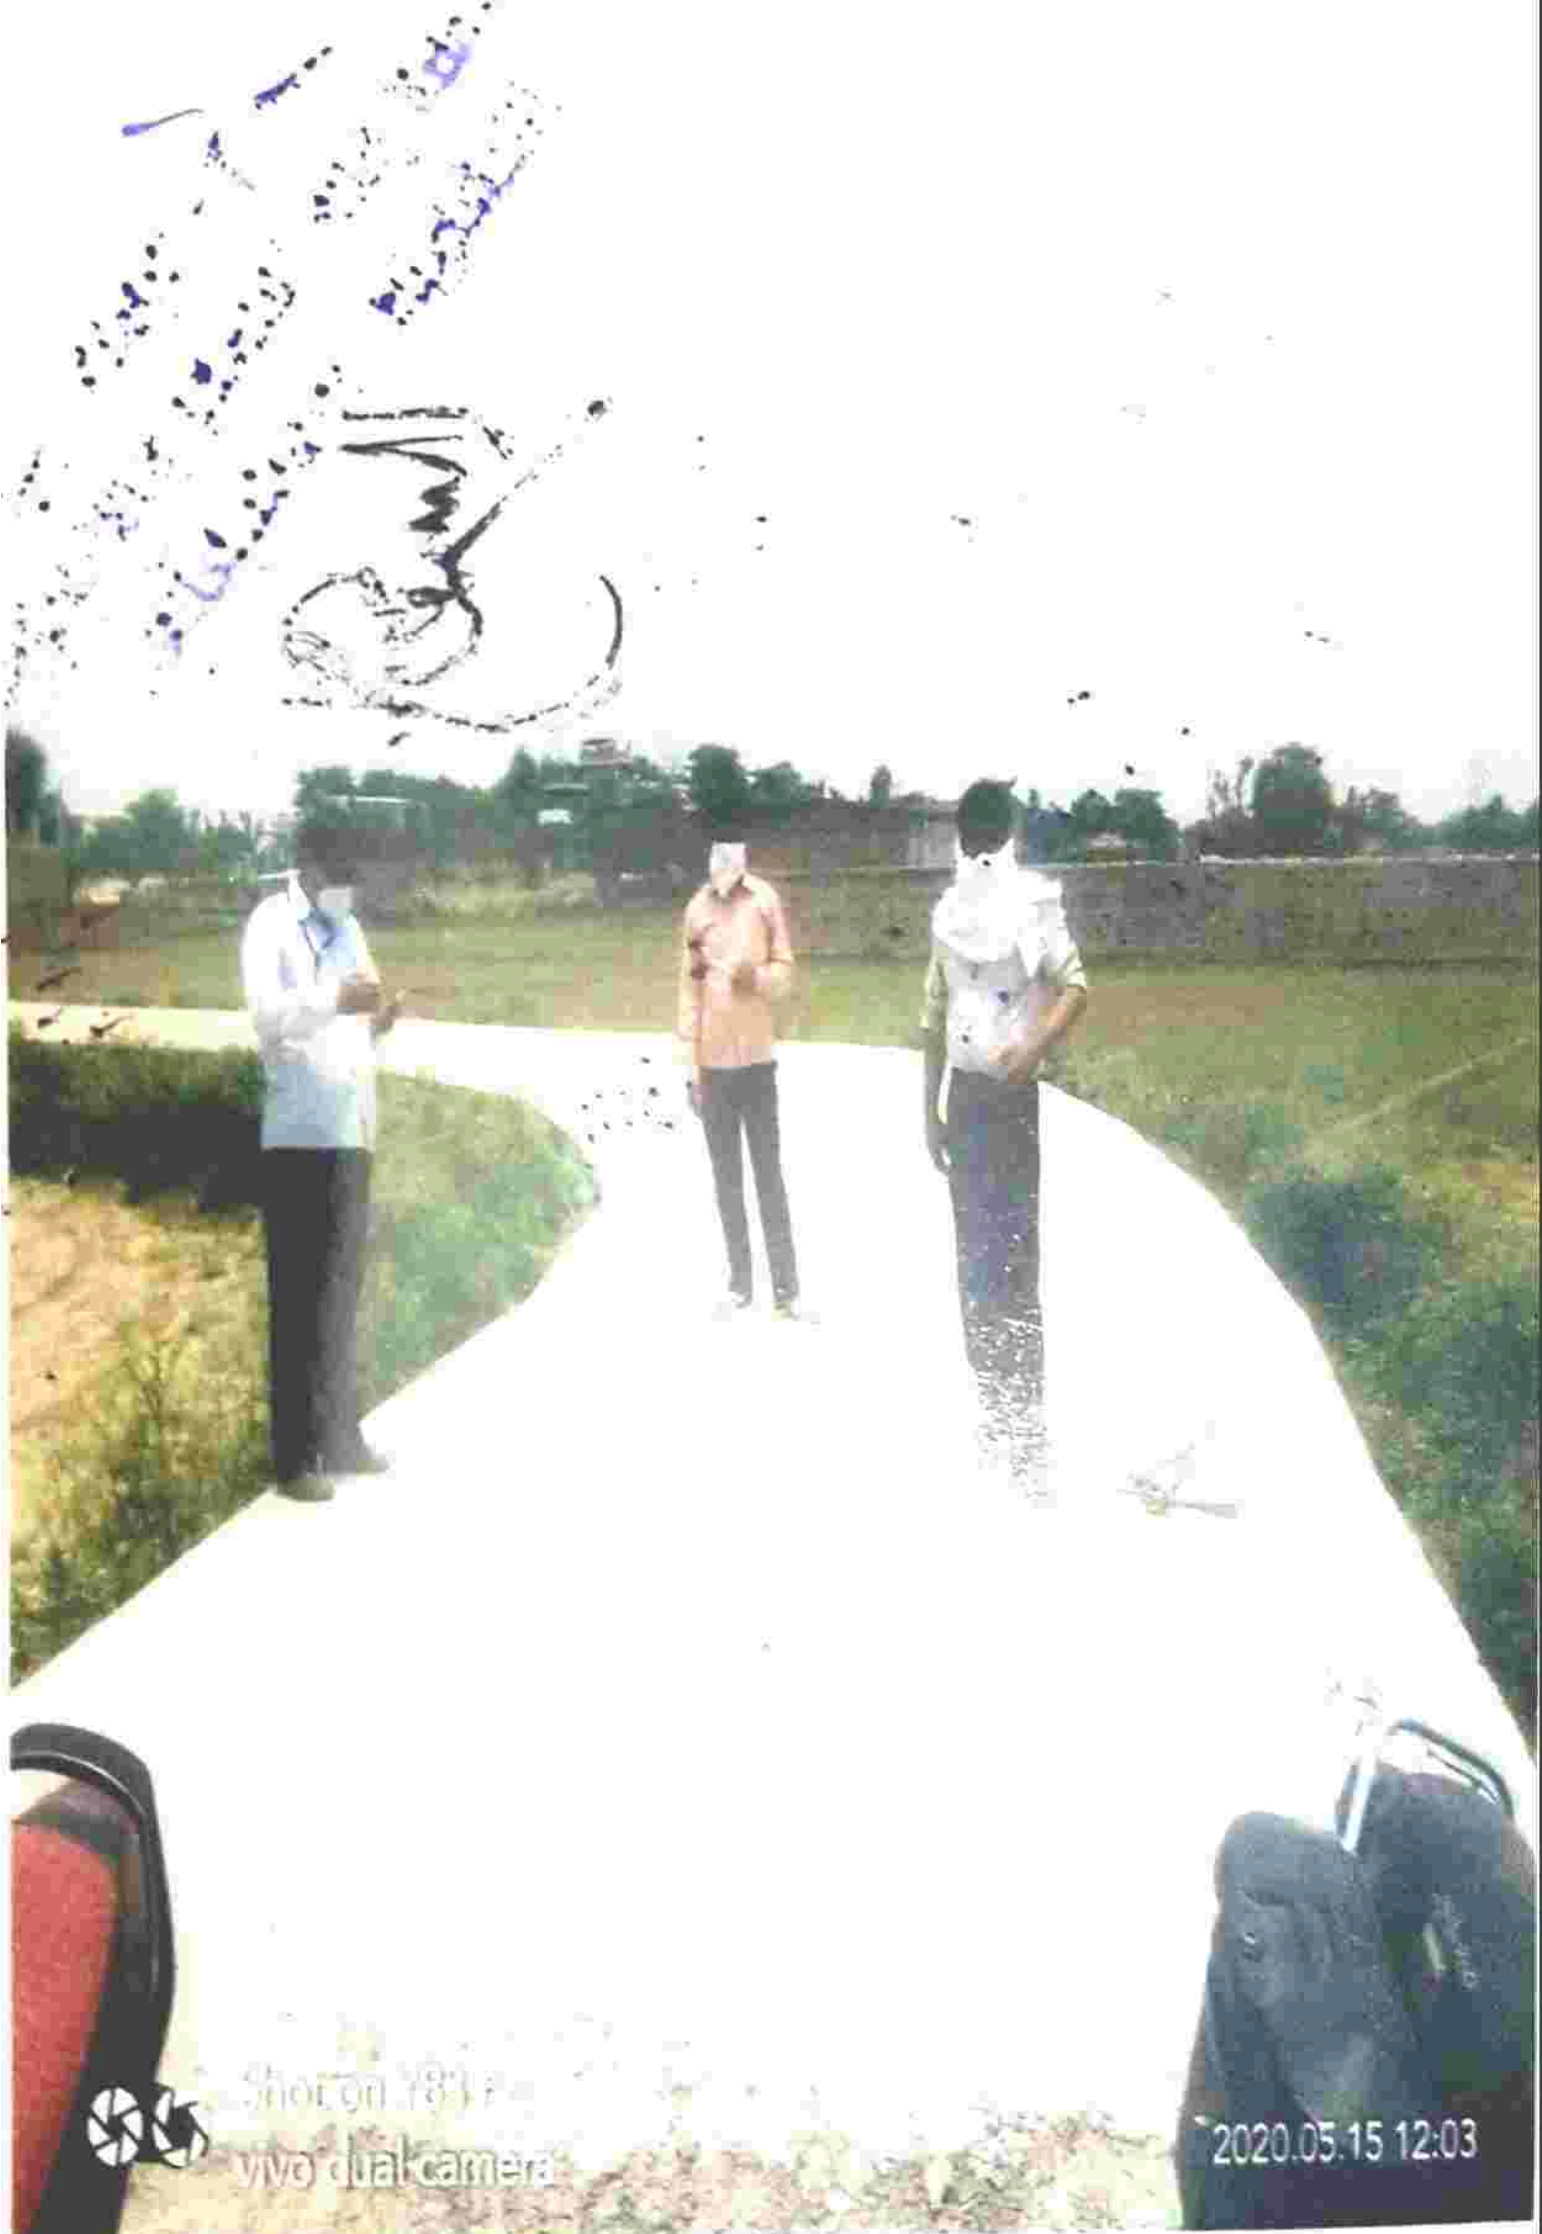

Shot on 7837
vivo dual camera

2020.05.15 12:03

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion



Shot on Y83 Pro
vivo dual camera

प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां

प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां

प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां

प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां प्रमुखानां प्रतिष्ठानां



महोदयमती ग्राम सभा के बोर्ड

पंच का क्षेत्र - गांव की 33.8 हेक्टर की महोदय क्षेत्र
जनसंख्या - 5,958 कि. मी.
क्षेत्रफल - 8.230
ग्राम मुख्यालय - 54.41 मीटर
पंच क्षेत्र - 3.52 मीटर
ग्राम सभा की तिथि - 16.09.2019
ग्राम सभा के अध्यक्ष - श्री. राजेश कुमार सिंह
ग्राम सभा के सदस्य - श्री. राजेश कुमार सिंह, श्री. राजेश कुमार सिंह, श्री. राजेश कुमार सिंह
ग्राम सभा के अध्यक्ष - श्री. राजेश कुमार सिंह



0 महोदयमती
0 700 मी.



Latitude: 26°11.073
Longitude: 85°52.11
Elevation: 94.2m
Accuracy: 2.0m
Time: 07-20-2020 15:50
Note: Mabbi REO Road to Ma

PowerLine Cam

27-11-81 1000-1000, 1000-1000 1000-1000

20/10/81

20/10/81

20/10/81

प्रति
हस्ताक्षर
२२/११/२०१९

प्रति

प्रति

कार्यवाहक अधिकारी
प्रमाण कार्य विभाग, धर्मपुर
पृष्ठ-1



मकी RCO रीट क महती ये मर

20/1/24

20/1/24

कार्यपालक
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
पुष्पा - 1




महवी REO रोड सं महवी डीला

३१.१०
२२

१२
२०/११/२०
१०२२

प्राचीन काव विभाग, काव प्रमुख
संख्या-१

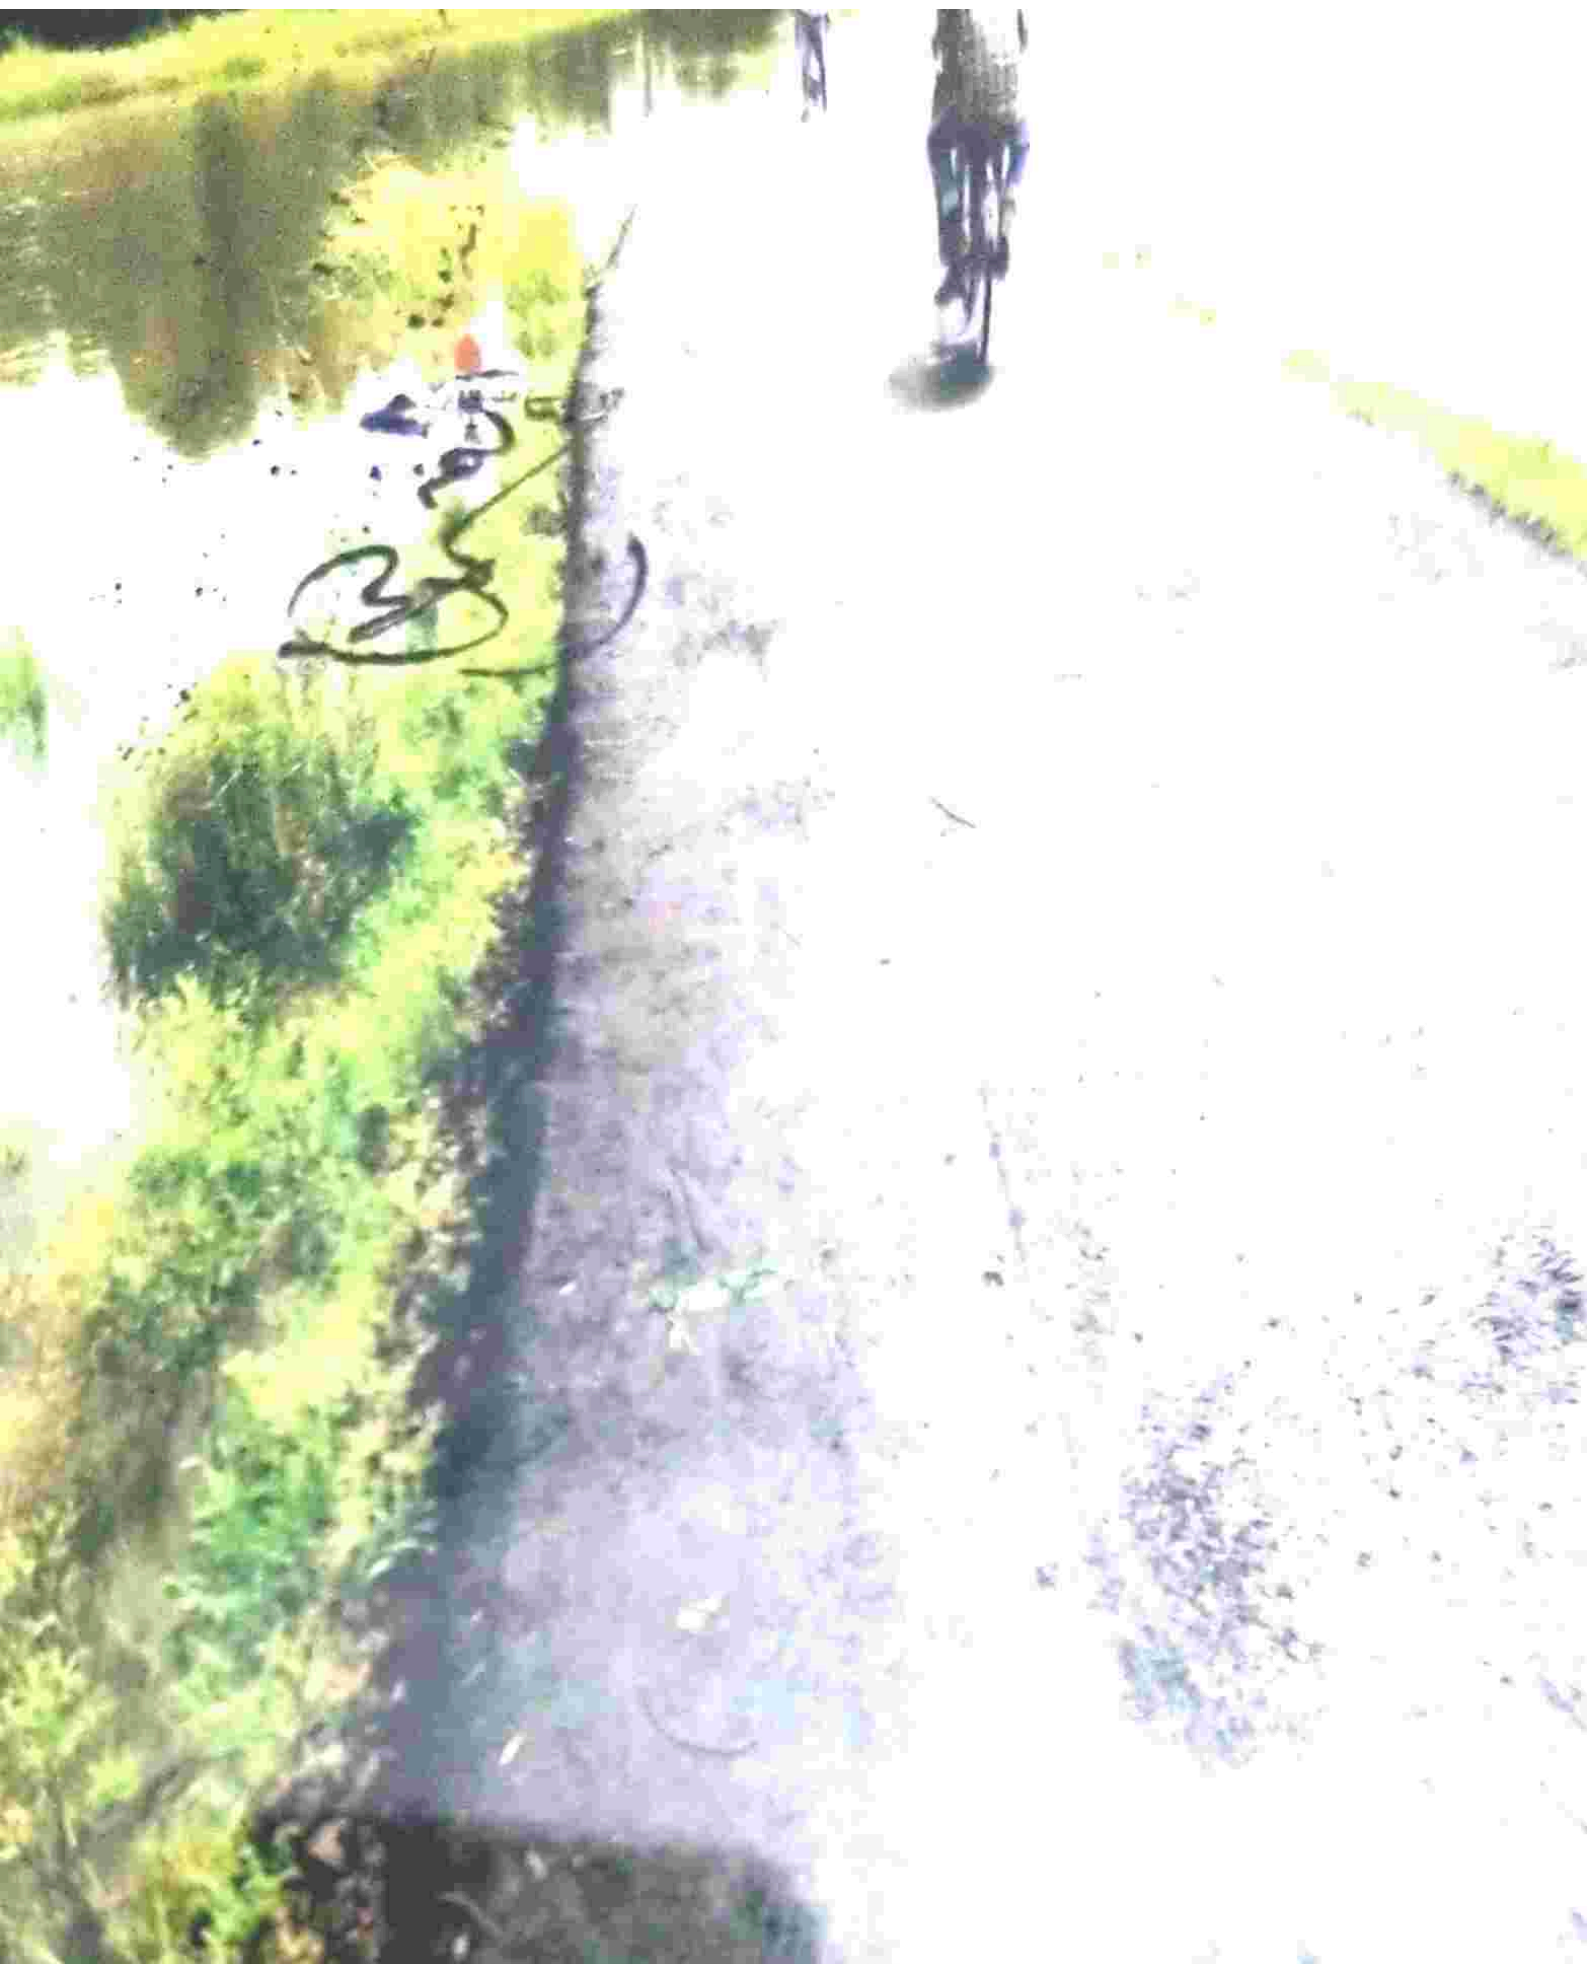

श्री R E O & S के अंतर्गत 29/07/20

श्री R E O & S

श्री R E O & S

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्ड
हरमंगा-1



Shot on Y83 Pro
vivo dual camera

1. செயல்பாடு
 2. பொருள்
 3. பொருள்
 4. பொருள்
 5. பொருள்
 6. பொருள்
 7. பொருள்
 8. பொருள்
 9. பொருள்
 10. பொருள்

2/1/20

2/1/20

1. செயல்பாடு
 2. பொருள்
 3. பொருள்
 4. பொருள்
 5. பொருள்
 6. பொருள்
 7. பொருள்
 8. பொருள்
 9. பொருள்
 10. பொருள்




21.11.21

21.11.21

21.11.21

~~Handwritten~~ REC VS



1007 REO 215
 215
 215

1007 REO 215
 215

1007 REO 215
 215

1007 REO 215
 215
