

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 1551 (9/90)/पटना, दिनांक 25/08/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना ।

विषय :- राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत "CONSTRUCTION & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM BAIRIYA RICE MEEL MORE SE KARNPURA GRAM BIHARAT SINGH KE PLAUT TAK PATH NIRMAN KARYA" निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

सहाय्य,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत "CONSTRUCTION & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM BAIRIYA RICE MEEL MORE SE KARNPURA GRAM BIHARAT SINGH KE PLAUT TAK PATH NIRMAN KARYA" निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार कर समर्पित किया जाता है।

योजना का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है ।

1. स्थल विडियो साफी का सी.डी.

2. दिनांक- 24.07.21 को स्थल निरीक्षण किया जा चुका है और कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पाया गया है ।

3. (i) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि- 12.06.2017 है ।

(ii) एकराशनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि- 11.12.2017 है ।

(iii) कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि- 30.06.2018 है ।

4. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है । अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है ।

5. संलग्न सी.डी.- 1 अर्द्ध ।

6. फोटोग्राफ- अर्द्ध मूल में ।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय ।

अनु:- यथोक्त ।

विश्वासार्थरूप
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।
25/8/21

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- KUMAR VISHWAJIT,
AT- BADAULLI, IMAMGANJ, GAYA
2. Name of Work :- "CONSTRUCTION & FIVE YEARS
MAINTENANCE OF ROAD FROM BAIRIYA
RICE MEEL MORE SE KARNPURA GRAM
BHARAT SINGH KE PLAUT TAK PATH
NIRMAN KARYA"
(Head of Expenditure) STATE SCHEME(NABARD)
3. Agreement No. :- 04-SBD/2017-18
4. Agreement Amount :- Rs. 50,29,857.00
Suppl. Agreement Amount :- Rs. 5,48,079.00
5. Date of Commecement of Work :- 12.06.2017
6. Date of Completion stipulated in the Agreement :- 11.12.2017
7. Period of Which Extension has been given previously :- No
8. Work done % :- 95 %
9. Period for which Extension now Applied for :- 30.06.2018
10. Reason for delay given by Contractor :- कार्यश्रम होने के पड़ने से
सड़क की रेखांकन इत्यत तय्य उसके अनुसार
पानी भरा रहने एवं स्थानीय जनता के द्वारा
घायमेट व्यवस्था के कारण कार्य में विलम्ब हुआ
11. Recommendation by J. E. :- work delay due to water logging in alignment
of road and public hindrance. Hence Time Extension
may be granted.
25/7/2021
J.E
12. Whether Programme of work approved :-
13. Whether fund available :-
14. If spill over from previous financial :-
15. Year whether included in the current :-
16. Work Programme or not :-
17. Recommendation of A. E. :- Mention Reason by contractor & Junior
Engineers are true. there for Recommended for necessary
action-time extension may be granted. Subsigne
28/07/21.
18. Recommendation of Executive Engineer :-
19. Recommendation of S. E. :-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना

Kumar Vishwajit
Signature by Contractor

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना

पत्रांक :- 1556

दिनांक :- 26/08/2021

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमार विश्वजीत, संवेदक, बदौली, इमामगंज, जिला-गया द्वारा राज्य योजना (नाबार्ड) के तहत पटना जिला अंतर्गत बैरिया राईस मिल से कर्णपुरा ग्राम, भरत सिंह के फ्लैट तक पथ का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका एकरारनामा सं०- 04/SBD/2017-18 एवं एकरारनामा की राशि रू० 50,29,857.00 मात्र है। कार्य प्रारंभ करने की तिथि 12.06.2017 एवं समाप्ति की तिथि 11.12.2017 है। आज की तिथि में संवेदक द्वारा शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करा दिया गया है। संवेदक द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना
25/8/2021

25/08/21

Kumar Vishwajit
Sri/Smt.
who is identified by Sri.....
Advocate solemnly affirmed and
declared before me.

B. K. JHA
Notary, Patna (Bihar) India

शपथ-पत्र

Sl. No. *2003-20774* Date *20/7/21*

मैं, KUMAR VISHWAJIT, AT- BADAULI, IMAMGANJ, GAYA शपथ
पूर्वक घोषणा करता हूँ।

1. यह कि मैं राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत "CONSTRUCTION & FIVE
YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM BAIRIYA RICE MEEL
MORE SE KARNPURA GRAM BHARAT SINGH KE PLAUT TAK
PATH NIRMAN KARYA" का निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा संख्या-
04-SBD/2017-18 है।

2. यह कि उपरोक्त कार्य प्रारंभ करते समय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विवाद होने के
कारण कार्य विलम्ब हुआ।

3. यह कि अब यह कार्य मेरे द्वारा दिनांक-30.06.2018 को पूर्ण कर
दिया गया है। *Kumar Vishwajit*

इस वृद्धि की स्वीकृति के उपरांत समय वृद्धि भुगतान के अलावे अन्य
किसी प्रकार कोई दावा मैं पेश नहीं करूंगा।

उपरोक्त बातें हमारी जानकारी में सही वो सत्य है।

Kumar Vishwajit
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

I identify the signature/L.T.I.
of Deponent Executant, who has/
have put his/their signature/
L.T.I. in my presence.

ADVOCATE

जैसा है

कार्यपालक (अभिगता)
ग्रामीण कार्य निर्माण
कार्य प्रमाण्डल, पटना

विषय:- लाबर्ड चौकमावर्ति लैरिया हाइस रिल से कर्णपुरा
ग्राम भरत-छिंद के टोल तक निर्माण कार्य से स्थानीय
जनता द्वारा व्यवधान करने के अंतरा में

महाराज:- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सड़क निर्माण
से स्थानीय जनता के द्वारा व्यवधान उत्पन्न
किया गया। मौर द्वारा पहल के उपरंत स्थानीय
जनता को सारासरी केवल सड़क निर्माण हो गना।
स्थानीय जनता के व्यवधान के कारण निर्माण
में विलंब हुआ। निर्माण में विलंब के लिये
है केदार चौकी प्रतीत नहीं होते हैं,
उपर्युक्त सड़क का निर्माण सर्वेक्षक द्वारा सुशुद्ध
कार्य कराया गया है।

सिद्धासभाजन

रामनाथ यादव

11/07/21

मुखिया

ग्राम पंचायत बौरवा कर्णपुरा

सिद्धासभा
मुखिया
24/8/21

सेवा में:

कार्यपालक भूमिधंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमुख, पटना

विषय:- नाकाई योजनागत बैरिया राइत मिल से कर्णपुरा
ग्राम भरत सिंह प्लॉट तक निर्माण कार्य में स्थानीय
जनता द्वारा व्यवधान करने के संबंध में,

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सड़क निर्माण
में स्थानीय जनता के द्वारा व्यवधान उत्पन्न
किया गया। मैंने द्वारा पटल के अपरांत
स्थानीय जनता को समझाने के बाद सड. 3
निर्माण हो सका। स्थानीय जनता के व्यवधान
के कारण निर्माण में विलंब हुआ। निर्माण में
विलंब के लिए हेडक्वार्टर दोषी प्रतीत नहीं होते हैं।
उपर्युक्त सड़क का निर्माण संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण
कराया गया है।

विरासतमजन
जीता हैवी

11/07/21
प्रमाणित किया गया

आपका विश्वसनीय मित्र

Komate Viskulajel

071915

Schedule XLV-Form No. 134

Besaya Rice mill to Komate Viskulajel DIVISION

Plot of Charat Singh under SUB-DIVISION

Sampatshak

Measurement Book

7204

At Pithi Jhila Tili, Pithi, Sampatshak

Certified that this M.B Contains
100 (One hundred) Nos of Machine
Pares & Issued to Sri...
...
Sub Division.....

hmr
26-9-17
Executive Engineer
R.W.D. (W) S Division
Patna
26/9/17

Sch. XLV-Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 7204

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st on A/c bill

1

Name of work-

Situation of work-

Agency by which work is executed-

Date of measurement-

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of Cement Concrete Pavement road from Baria Rice mill more to Grom Karganpura Bhagat Singhs Plot.					

Contractor - Kumar Vishwajit
 Agreement no - 04 SBD/2016-17
 Date of start - 12.06.17
 Rate - 0.70% below

Record Measurement					
1.	Providing and fixing of working benchmark and reference pillars				
					0.75 km
2.	Cleaning and grubbing Road land				
	5	30.0	3.50		525 m ²
	5	30.0	3.50		525 "
	5	30.0	3.50		525 "
	5	30.0	3.50		525 "
	5	30.0	3.50		525 "
					2625 m ²
					= 0.2625 Hect

Continuation

Bingh
 22.10.17
 .FK

2
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Record Measurement				
1.	Construction of embankment with material obtained from borrow pit -				
	9.0	$\frac{9.0 + 7.0}{2}$		0.30	21.6m ³
	12.0	$\frac{7.0 + 5.50}{2}$		0.30	22.5m ³
	30.0	5.50		0.30	49.50m ³
	30.0	5.50		0.30	49.50
	13.0	$\frac{5.5 + 6.5}{2}$		0.25	19.5m ³
	6.0	$\frac{6.5 + 5.50}{2}$		0.25	9.0m ³
	2x30.0	5.5		0.25	82.50m ³
	22.0	$\frac{5.50 + 6.5}{2}$		0.30	39.6m ³
	13.0	$\frac{5.50 + 6.5}{2}$		0.30	23.40m ³
	30.0	5.50		0.30	49.50m ³
	7.0	6.0		0.30	12.6m ³
	5x30.0	5.50		0.25	206.25m ³
	4x30.0	5.50		0.25	165.0m ³
	2x30.0	5.0		0.30	90.0m ³
	3x30.0	5.50		0.30	148.5m ³
	3x30.0	5.50		0.30	148.5m ³
	1x10.0	6.50		0.30	19.5m ³
					1156.95m ³
					Bing
					5.11.17
					J.E
	Record Measurement				
1.	Construction of				

Continuation

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	LT	Rate	Unit	
① S.D.E.S.V. -					233422 = 0
② P.S.D.E.S.V. -					140053 = 0
③ 9-T @ 1% -					46684 = 0
④ L.S @ 1% -					46684 = 0
⑤ Siny fee 2% -					93369 = 0
⑥ Roy -					37159 = 0
⑦ T.F @ 10% - (271990)					27199 = 0
⑧ O.C.E.S.V. -					233422 = 0
⑨ By Ch -					3810445 = 0
कुल क्षेत्रफल 4668437 = 0					

Executive Engineer

R.W.D. (W) S Division

Ch. KINWARD

Patna

4775729

① S.D.E.S.V. -					238786 =
② P.S.D.E.S.V. -					143272 =
③ 9-T @ 1% -					47757 =
④ L.S @ 1% -					47757 =
⑤ Siny fee 2% -					95515 =
⑥ Roy -					35013 =
⑦ T.F @ 10% - (271990)					27199 =
⑧ O.C.E.S.V. -					238786 =
⑨ By Ch -					3901644 =

4775729 = 0

Attested
Subing
25/08/21.

ASSISTANT ENGINEER
R.W.D. Works Sub-Division
Sampachak, Patna

Executive Engineer

R.W.D. (W) S Division

Patna


Continuation

Latitude: 25.553595
Longitude: 85.184256
Elevation: 57.86m
Accuracy: 9.0m
Time: 23-07-2021 6:30



Powered by NoteCam



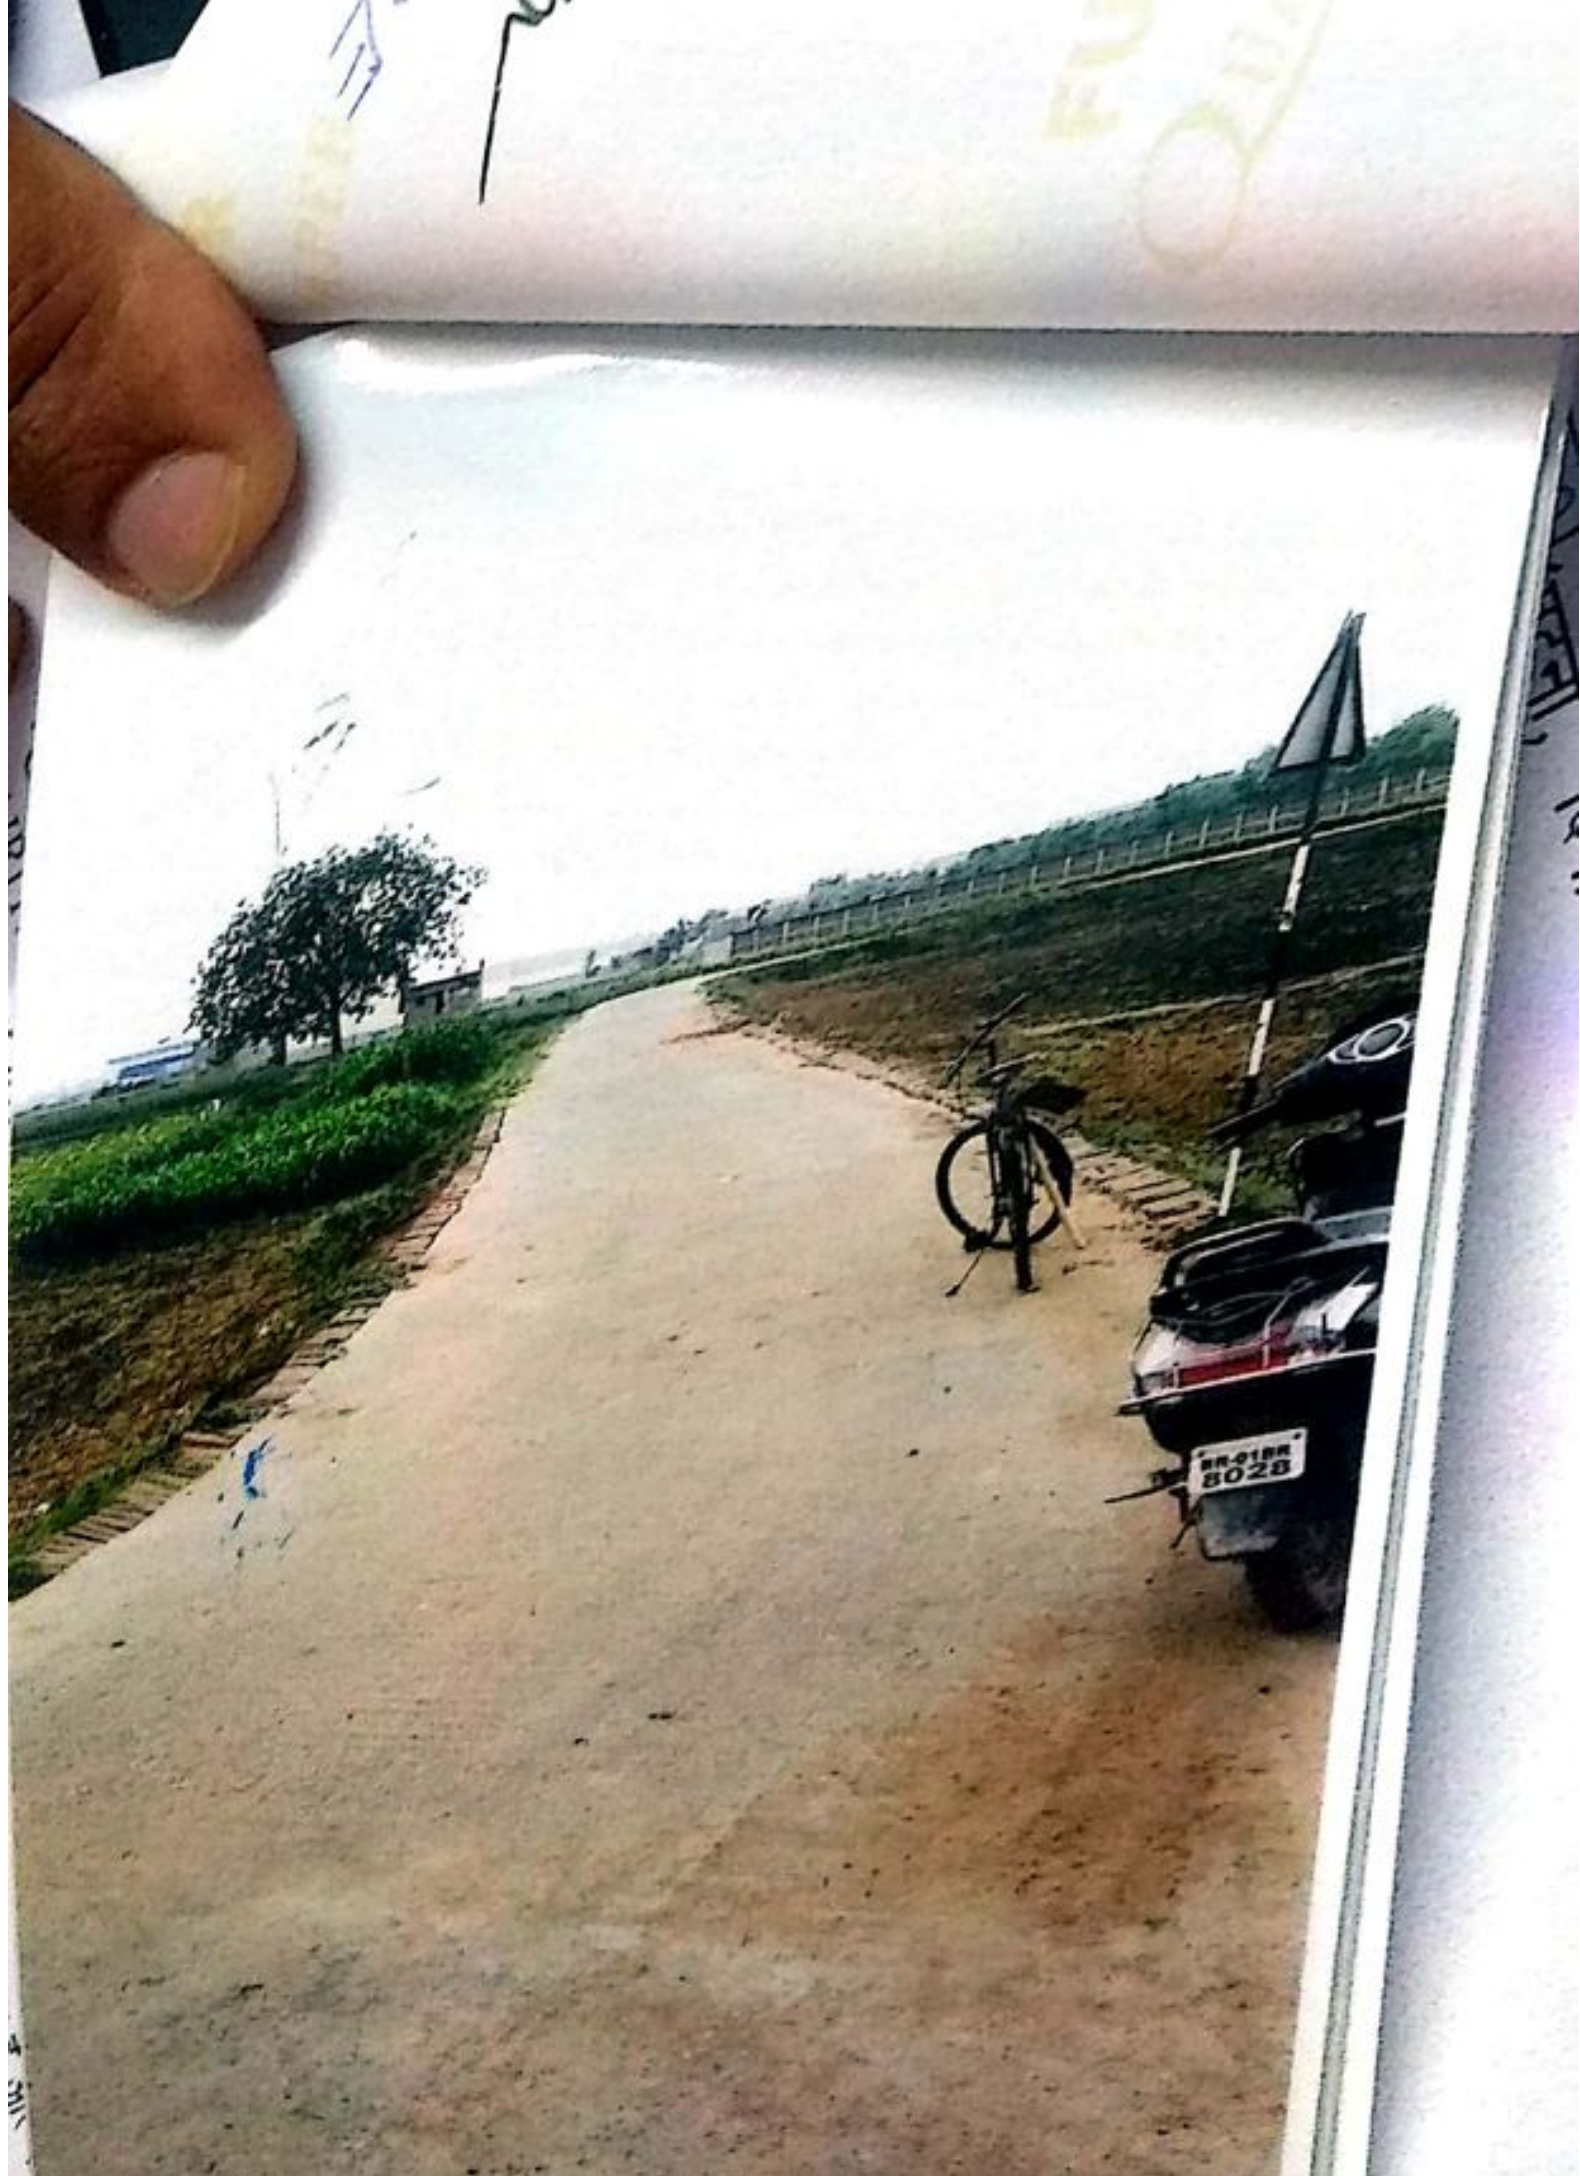


25.555093
85.191833
1.7±20 m
Accuracy: 2000.0 m
Time: 23-07-2021 07:43
Mote: Bairiya Rice M

Bharat Singh Pict





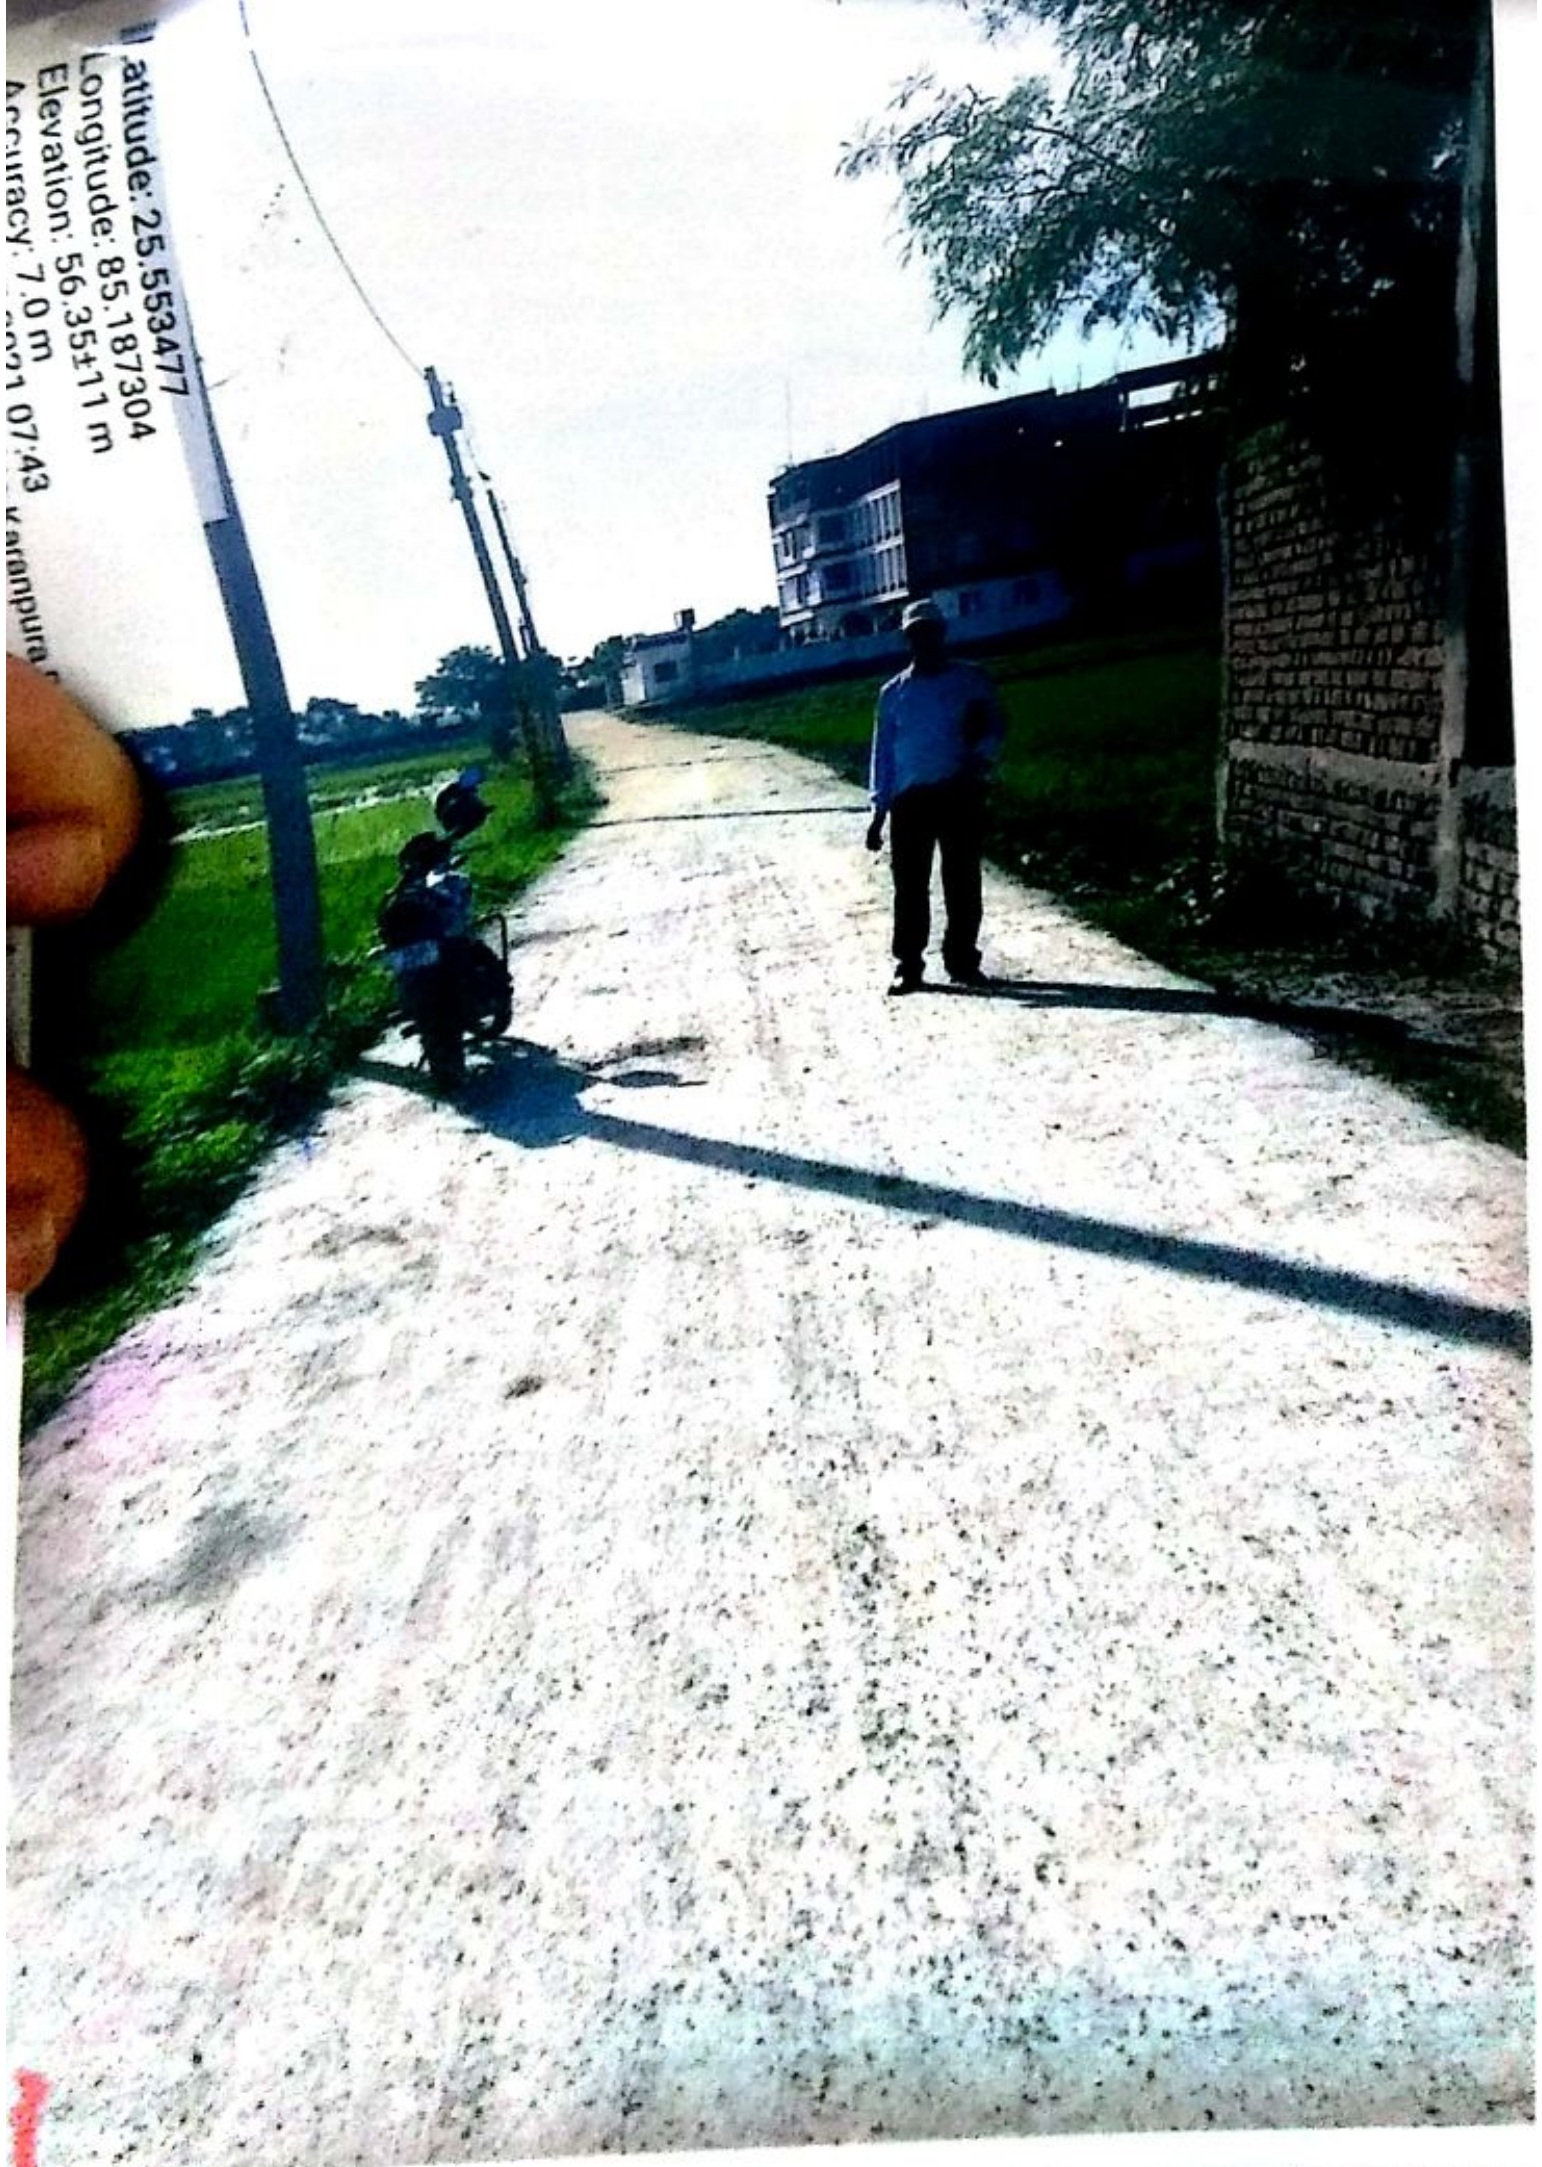





ude: 25.553617
titude: 85.186887
titude: 48.86m

Powered by Notepad.com



25.553246
85.187971
53.57±13 m
3-07

Karanpura Bharat Singh Plot

