

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 1398 (31/08) / पटना, दिनांक 07/08/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना ।

विषय :- पी.एम.जी.एस.वाई. योजना अन्तर्गत "L022 - PMGSY ROAD TO SIRSI HARIJAN TOLA (BRIDGE)" निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पी.एम.जी.एस.वाई. योजना अन्तर्गत "L022 - PMGSY ROAD TO SIRSI HARIJAN TOLA (BRIDGE)" निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार कर समर्पित किया जाता है।

योजना का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है ।

1. स्थल विडियो ग्राफी का सी.डी.

2. दिनांक-02.08.2021 को स्थल निरीक्षण किया जा चुका है और कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पाया गया है ।

3. (i) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि- 20.07.2018 है ।

(ii) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि- 19.07.2019 है ।

(iii) कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि- 29.07.2020 है ।

4. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है । अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है ।

5. संलग्न सी.डी. - 1 अदद ।

6. फोटोग्राफ- 10 अदद मूल में ।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने

की कृपा की जाय ।

अनु.:- यथोक्त ।

विश्वोपभाजध

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, पटना

07/08/21

07/08/21

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- *Ashta Construction & Developers Pvt. Ltd.*
2. Name of Work :- *PMGSY (BR-26R-423) 2022-PMGSY Road to (Had of Expenditure) Sirsi Harijan tola (Bridge)*
3. Agreement No. :- *10500/2018-19*
4. Agreement Value :- *24363016=IN*
5. Date of Commencement of work :- *20.07.2018*
6. Date of completion stipulated in the Agreement :- *19.07.2019*
7. Period of which Extension has been given previously :- *NO*
8. Work done of % :- *100 %*
9. Period for which Extension now Applied for :- *29.07.2020*
10. Reason for extension of time :-
Due to water logging of Flood water of Mahane river at Bridge site.

11. Recommendation by J.E. *Extension of Time may be granted.*
[Signature]
2.08.2021.
J.E.

12. Whether Programme of work approved :-
13. Whether fund available :-
14. If spill over from previous financial Year whether included in the current Work Programme or not :-

15. Recommendation of S.D.O. :- *The above mentioned reason is correct. Hence extension of time may be granted* *[Signature]*
02.08.21
J.E.

16. Recommendation of Executive Engineer :- *[Signature]*
21/8/21

17. Recommendation of S.E. :-

For Ashta Construction & Developers Pvt. Ltd.
Satyaj Kumar Choudhary
Director

18. Recommendation of C.E.

Signature of Contractor

SI No. 26108/2024 Date 06/08/2024

Shri/Smt. Sany Kumar Choudhary

who is identified by Shashi Kumar Sinha
Advocate solemnly affirmed and
declare before me.

Shashi Kumar Sinha
Notary Public, Patna

I Identify the Deponent signature/L11.
who has signed in my presence.

Shashi Kumar Sinha
Advocate
6/8/21




शपथ - पत्र

मैं, ASTHA CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PVT. LTD., AT- M. F.,
SECTOR- 6, BLOCK -2, FLAT NO.-68, BAHADURPUR HOUSING
COLONY, BHUTNATH ROAD, PO-KANKARBAGH, DIST.-PATNA शपथ
पूर्वक घोषणा करता हूँ।

1. यह कि मैं पी.एम.जी.एस.वाई. योजना अन्तर्गत "L022 - PMGSY ROAD TO
SIRSI HARIJAN TOLA (BRIDGE)" का निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा
संख्या - 04-SBD/2017-18 है।
2. यह कि उपरोक्त कार्य में विगत वर्ष भारी वर्षा एवं महाने नदी में बाढ़
होने के चलते पुल निर्माण स्थल पर जल-जमाव होने के कारण कार्य काफी
विलम्ब हुआ।
3. यह कि अब यह कार्य मेरे द्वारा दिनांक-29.07.2020 को विशिष्टियों के अनुरूप
पूर्ण कर दिया गया है।
4. यह कि समय वृद्धि की स्वीकृति के उपरांत समय वृद्धि भुगतान के अलावे अन्य
किसी प्रकार कोई वित्तीय दावा मैं पेश नहीं करूंगा।

यह कि उपरोक्त बातें हमारी जानकारी में सही व सत्य है।

Sany Kumar Choudhary
शपथकर्ता का हस्ताक्षर



06-AUG-2021 11:57:09

IT 0000458522

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

06-AUG-2021 11:57:09

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT PATNA

NAME OF LITIGANT :

SANJAY KUMAR CHAUDHARY

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0656H2155L884

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 100

(Rupees One Hundred Only)



BRCT0656H2155L884

Signature Area : The authenticity of this e-Court Fee receipt should be verified at www.shcilesamh.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Court Official. Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



PMVSY

Schedule XLV-Form N

PMVSY-1022 PMVSY

TO Sireshi Haryam tala

BR-26R-423

MEASUREMENT

at Bihari ST, GONDAL

अभिप्रेत
2/10/22

Engineer

1st on A/C Bill

of area

Name of work:- LO22-PMGSY

Road to Sirshi Harijan Tola Purbi
RCC Bridge.

Package No.:- BR-26R-423

Agency:- Artha Construction &
Developers Pvt. Ltd.

Agreement No. - 10 S.B.D - 18-19

Date of completion - 19.7.19

Date of entry - 18.01.19

① Excavation for structure -

upto 3m depth - do all complete job

For Abutment

$$2 \times 9.2 \times 5.6 \times 2.4 = 297.296 \text{ m}^3$$

For Pier

$$2 \times 5.6 \times 5.6 \times 2.4 = 150.528 \text{ m}^3$$

$$297.824 \text{ m}^3$$

Sirshi Harjan Tola
1 Package No-BR-26R-423)
in Bakhmors block
of Patna District.

Agency - Ashtra Construction and
Development Pvt. Ltd.

Agreement no - 10/SBD/2019-17

Date of completion - 14-07-2019

Actual date of completion - 29-7-2020

Date of entry

<u>Joseph</u>	<u>Finansing</u>
17.11.2020	17.11.2020
J.E.	AS

ABSTRACT OF COST

① Earthwork in excavation
for structure - etc.

257.00 3 side timber (5)

Loss 0.10% below

as per agreement F7

ly

24,222.00

Rs 24,197.55/-

Net Profit Reimbursement

vide Tm Parc (54) (-)

(14483002 + 74803 + 8916470)

Rs 23474,200/-

Rs 72327/-

Dr. J.E.

17.11.2020

J.E.

himanshu

17.11.2020

Sri Jay Kumar Chaudhary

Chairman & CEO

For Audit Committee & Director

Sri Jay Kumar Chaudhary
Director

all
21/11/20

Memo of Payment (₹723271=00)

①	SD @ 5%.	₹ 3664=00
②	P.S.D @ 2.5%.	₹ 18082=00
③	GT @ 2%.	₹ 14466=00
④	CHST @ 1%.	₹ 7233=00
⑤	SLST @ 1%.	₹ 7233=00
⑥	LCS @ 1%.	₹ 7233=00
⑦	Time Exp 10%.	₹ 72327=00
⑧	By cheque	₹ 560533=00


Pass of for ₹ 723271=00


(Rupees seven lakh twenty three thousand two hundred seventy one) only.


Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division, Patna

24/11/20

24/11/20

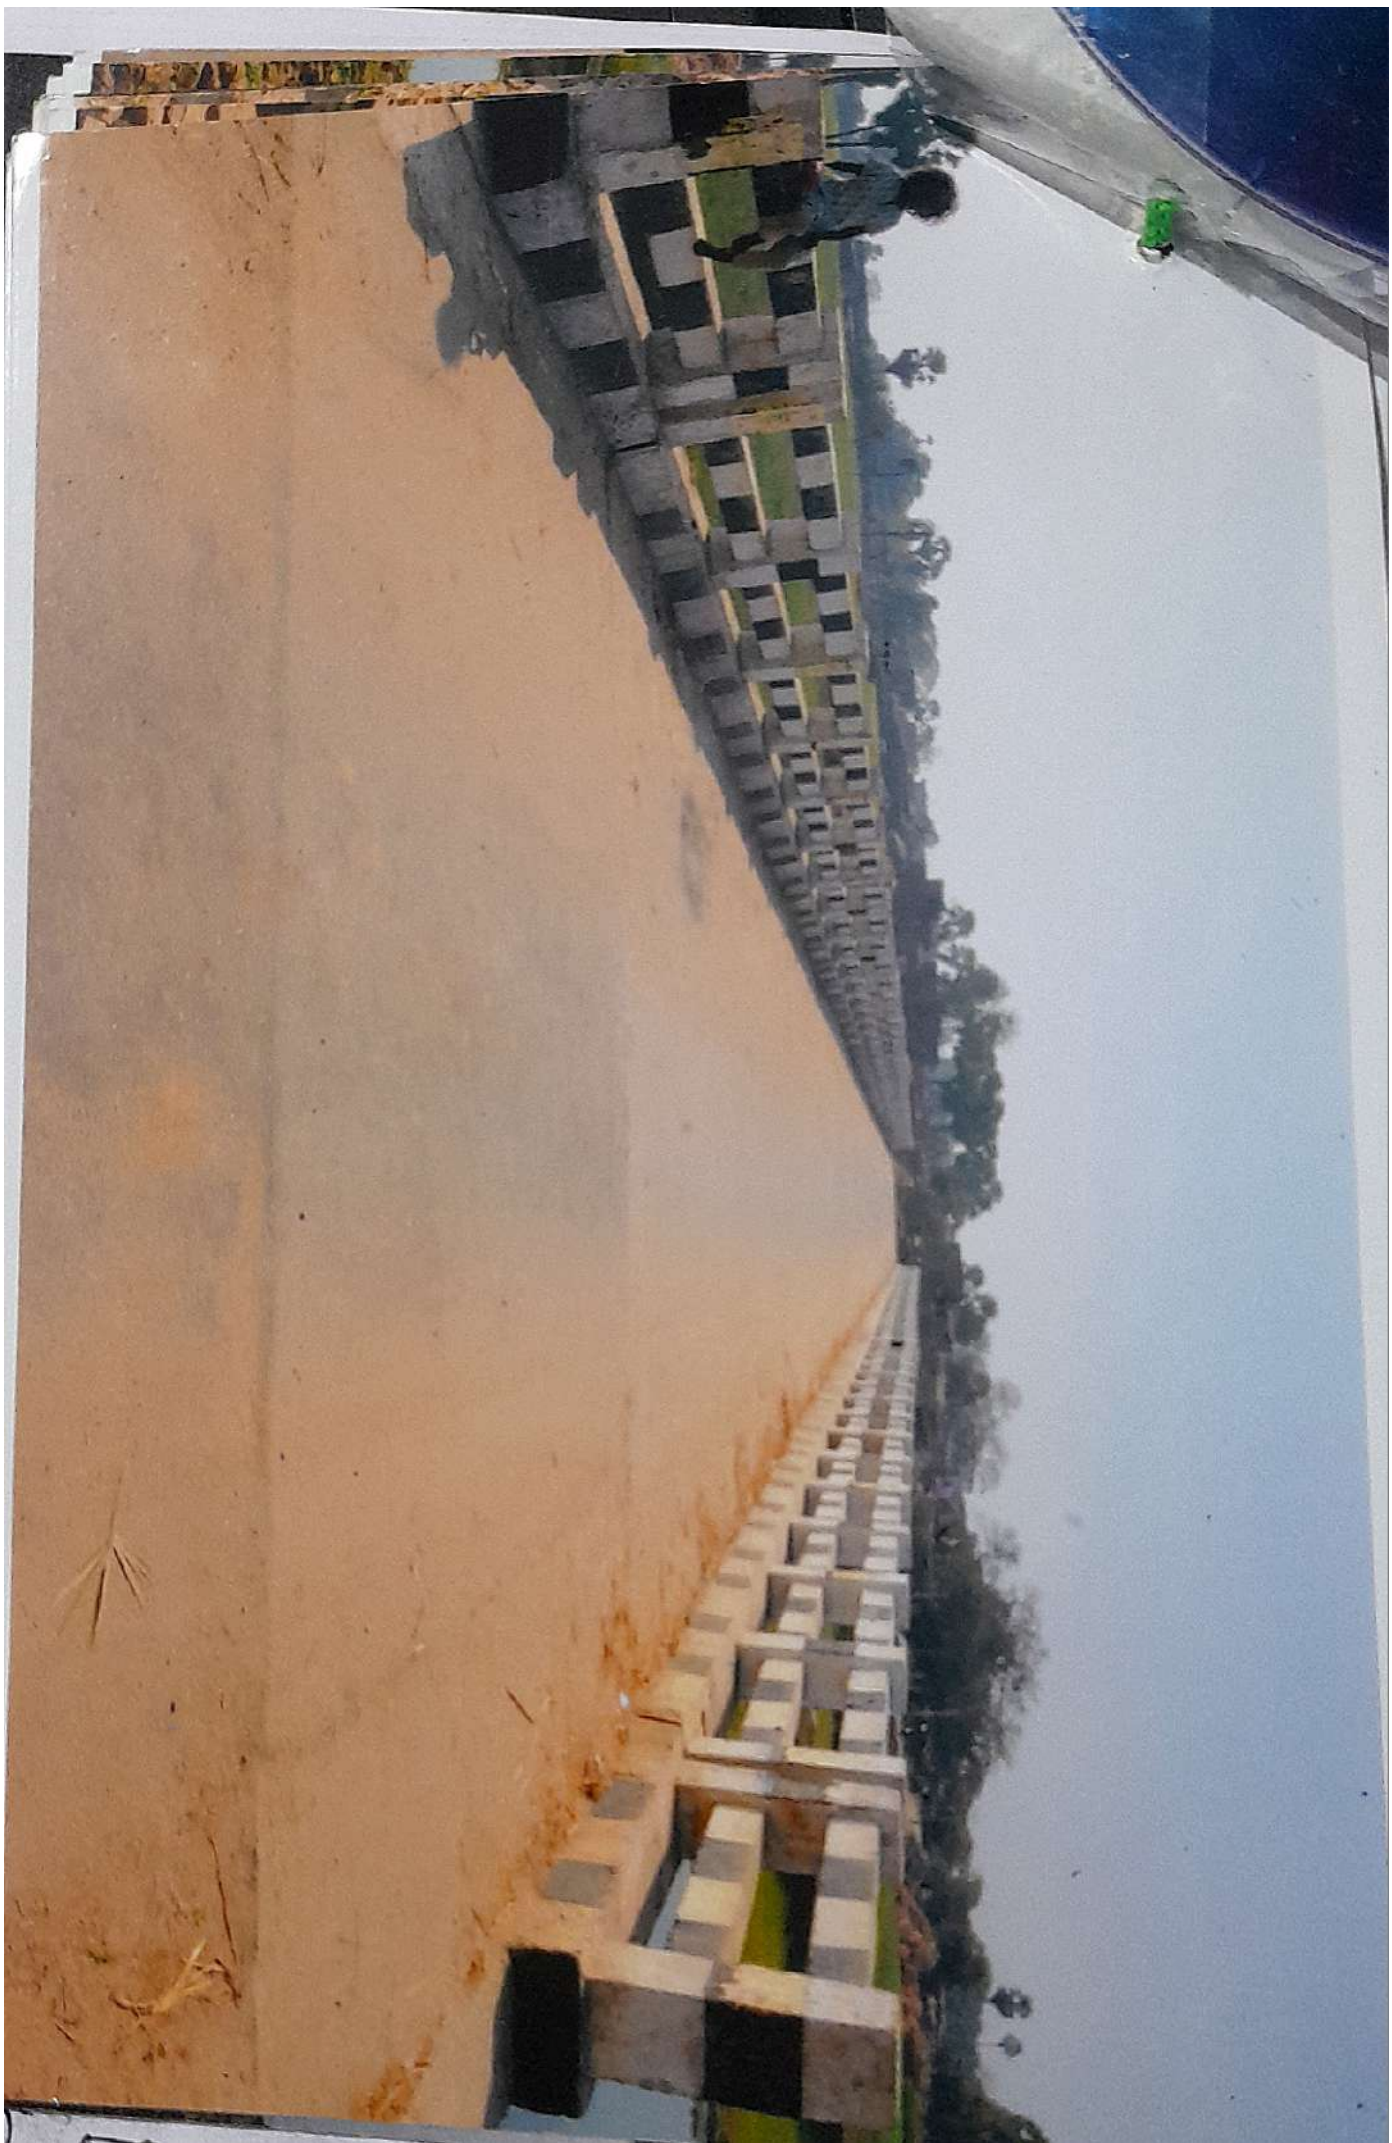

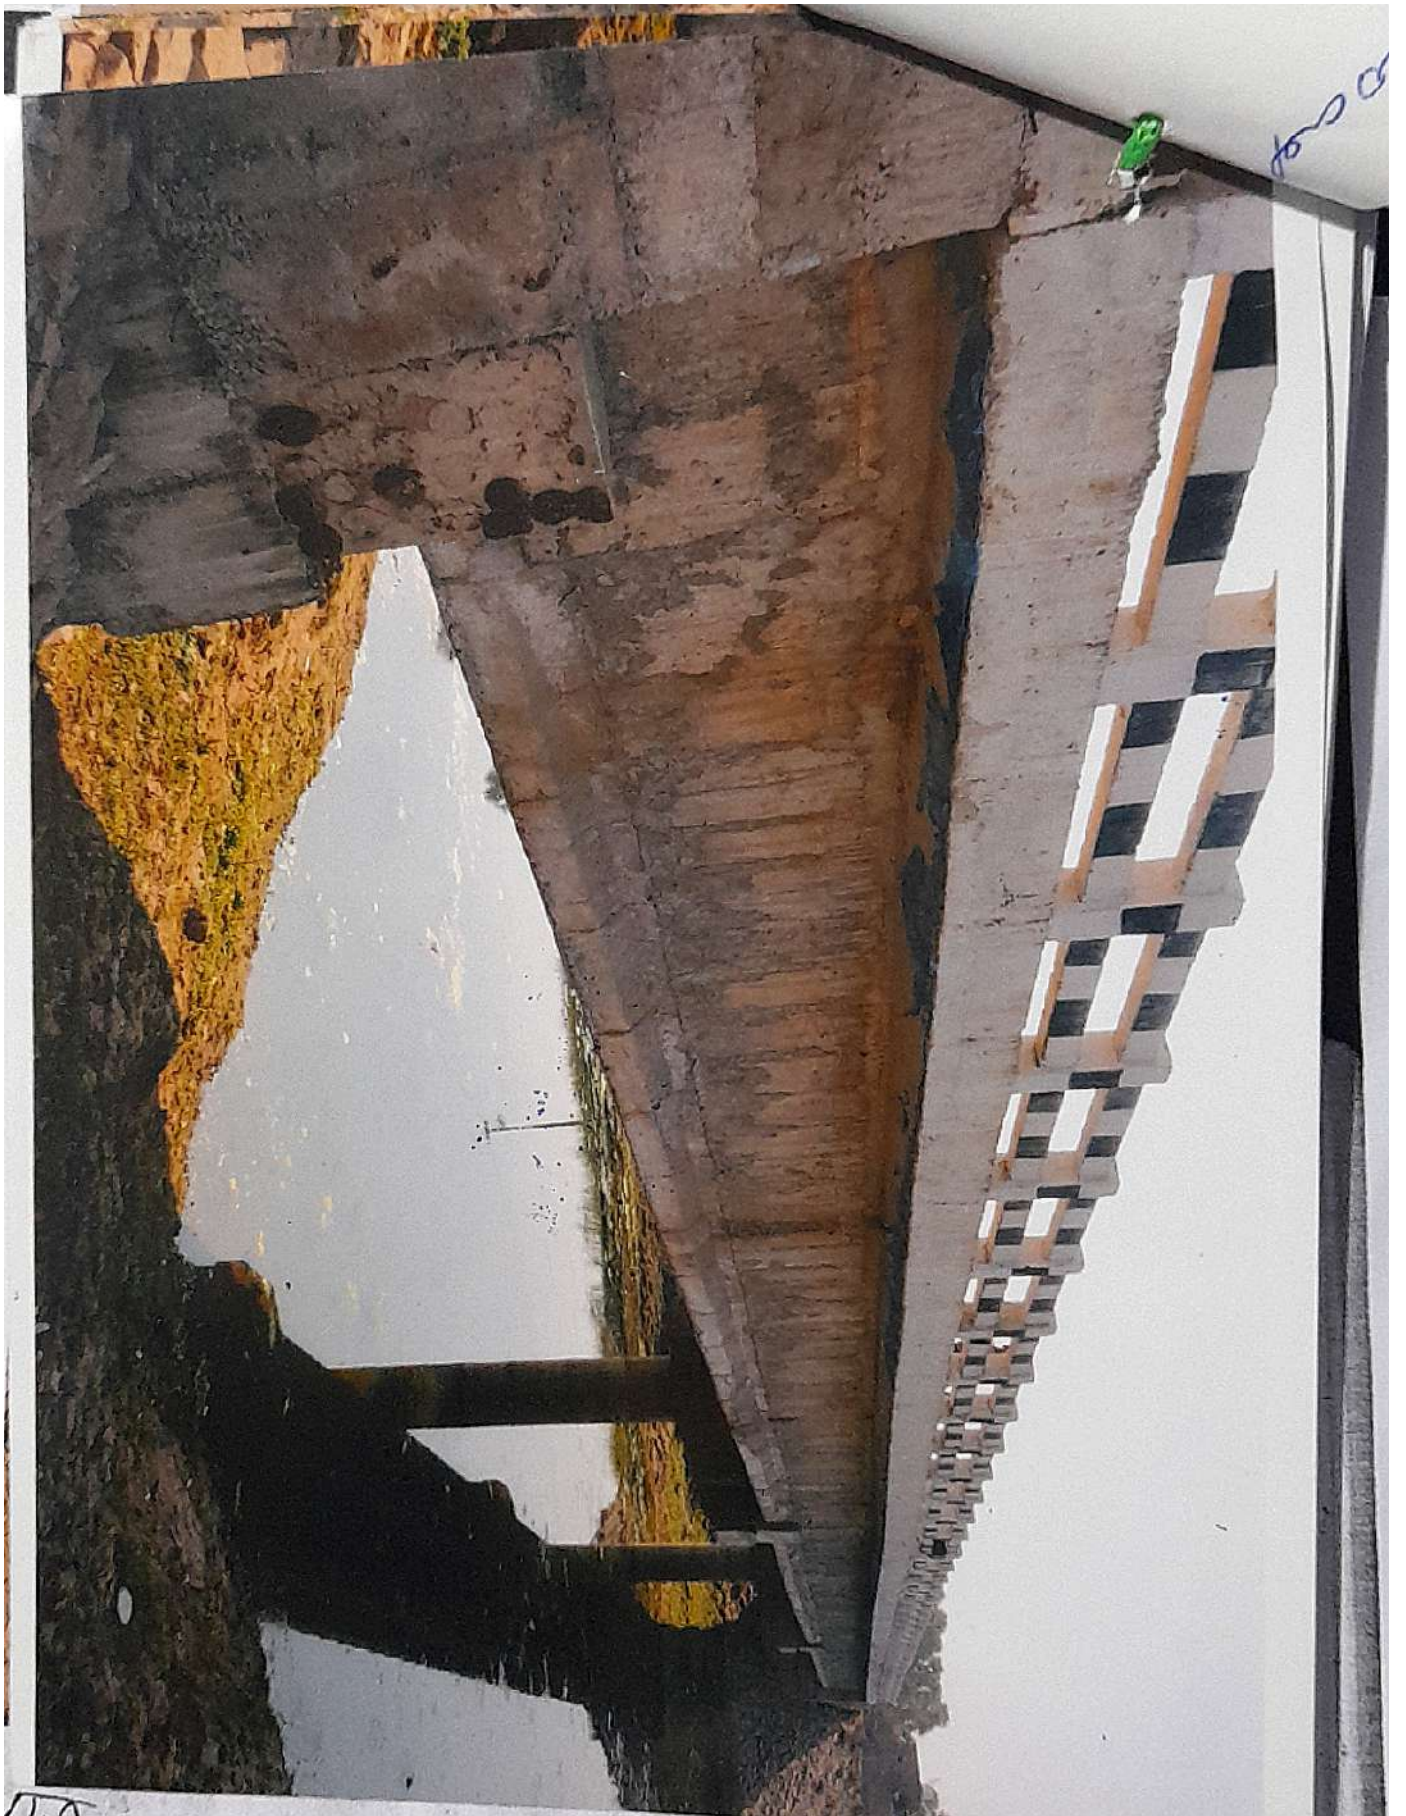

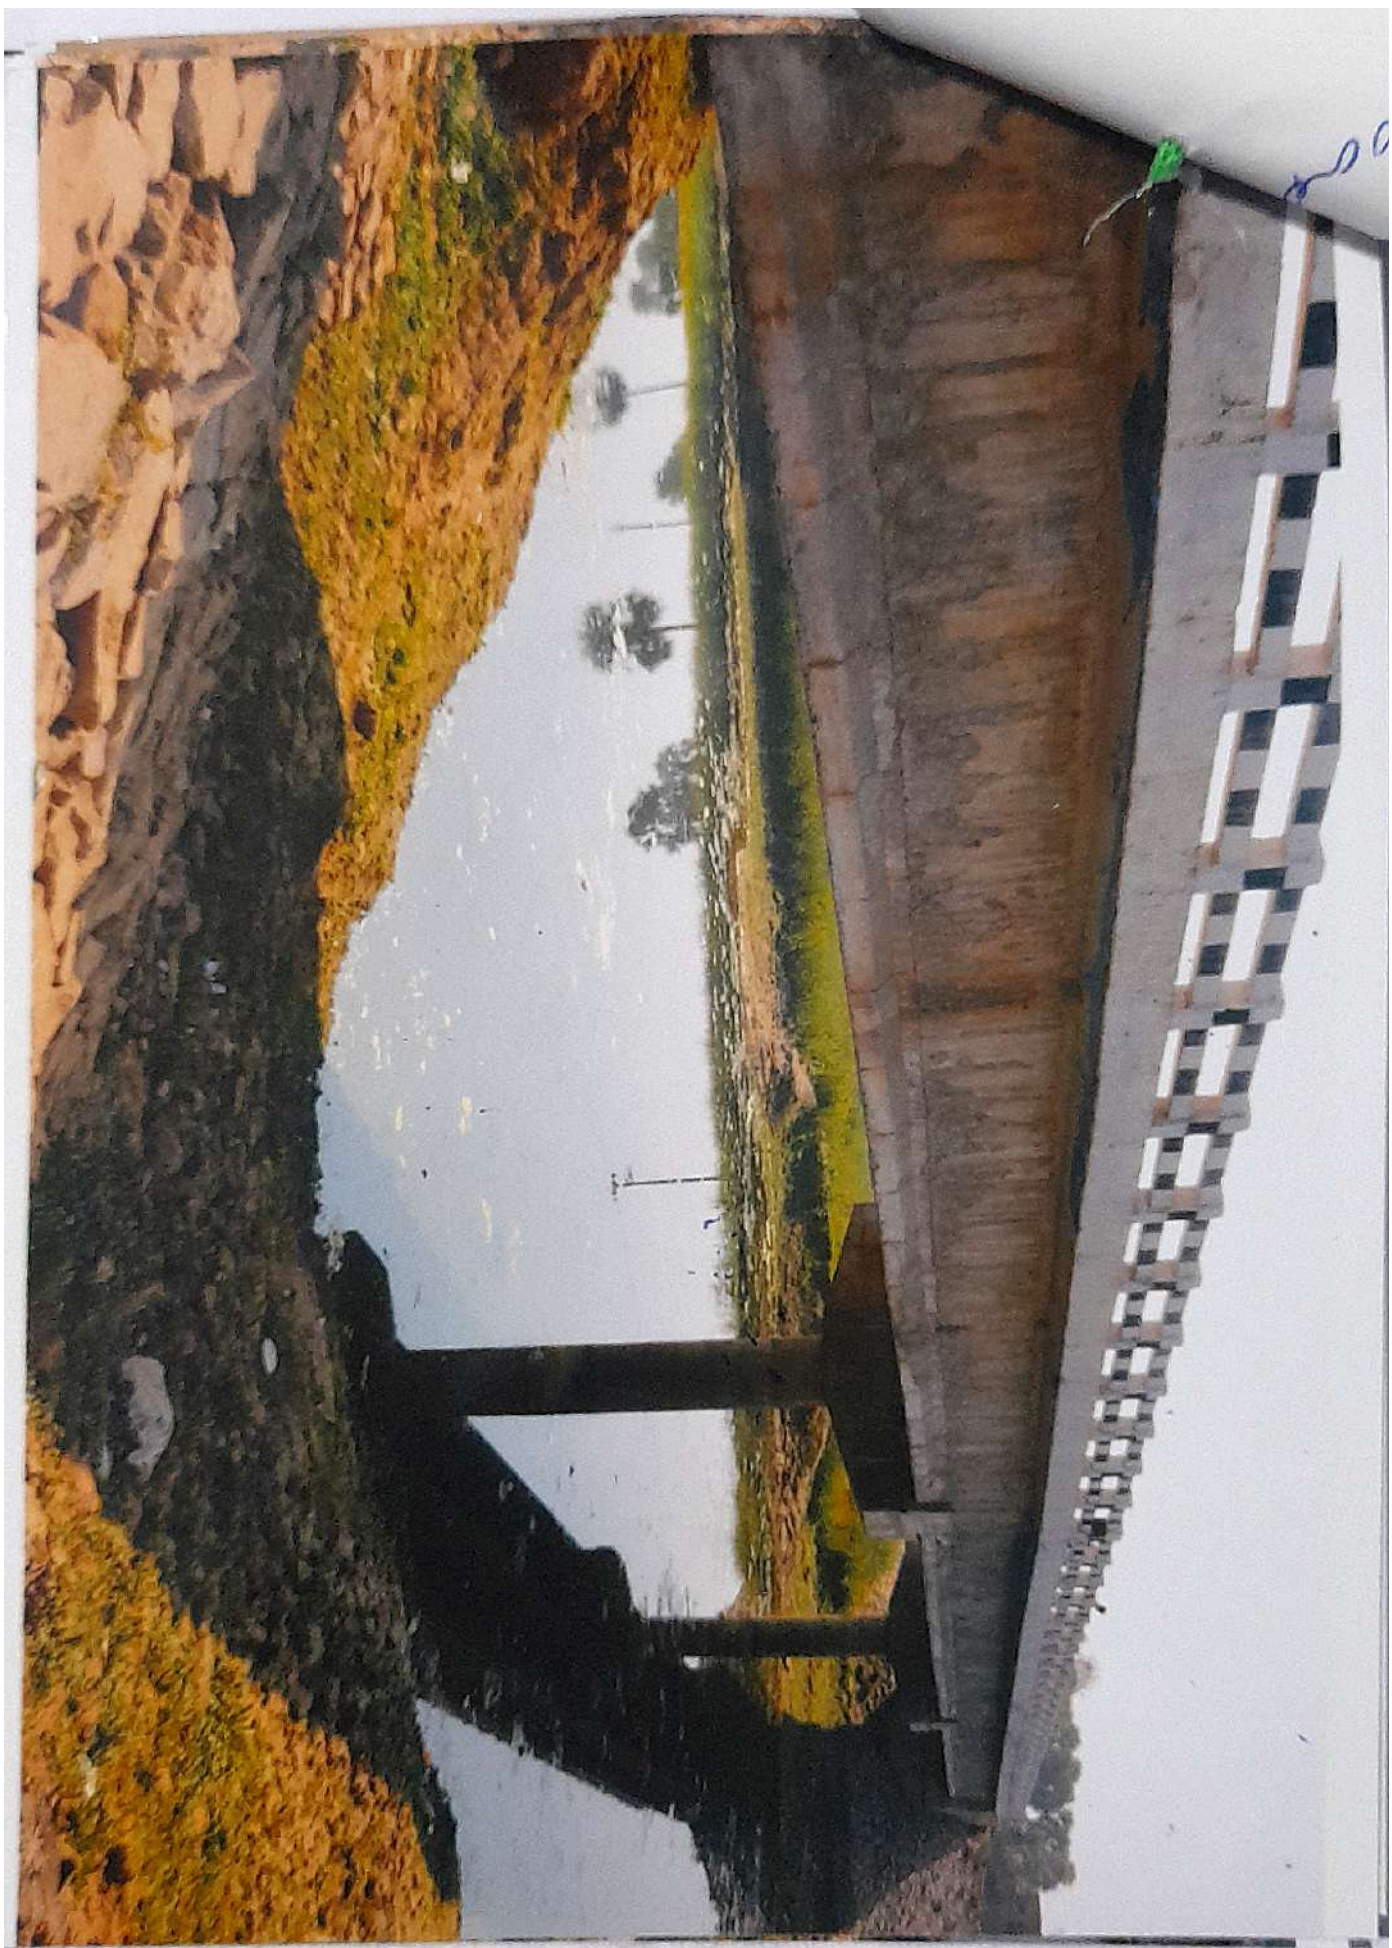

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क का नाम - L.O.22-P.M.G.S.Y. रोड से खिरसी हरिजन टोला
पूर्वी से R.C.C. पुल निर्माण।

पैकेज संख्या - BR-26R-423

पुल की लंबाई - 77.52 मीटर

5 साल तक रख-रखाव की राशि - 1.60.107/-

कार्य प्रारम्भ की तिथि - 20.07.2018

संवैदक का नाम - आर्य केंद्रकशन एण्ड डेवलेपर्स प्रा. लि. - पटना

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपादित

कार्यकारी एजेन्सी - कार्य अभि. ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रबंधन पटना

विहार सरकार

7262




कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 2084

दिनांक 06/12/2021

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संवेदक Astha Construction & Developers Pvt. Ltd., Bahadurpur Housing Colony, Bhutnath Road, Patna को इस प्रमंडल में शीर्ष-पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत "L022 PMGSY Road to Sirshi Harijan Tola (BR-26R-423)" लम्बाई-77.520 मी0, एकरानामा सं0-10-SBD-/2018-19, एकरानामा राशि 2,43,63,016.00 रुपये मात्र का कार्य आवंटित हुआ है। उक्त पुल को निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि-20.07.2018, एकरानामा के अनुसार का निर्माण कार्य समाप्ति की तिथि-19.07.2019, निर्माण कार्य पूर्ण करने का वास्तविक तिथि-29.07.2020 एवं कराये गये कार्य का राशि 2,41,97,551.00 रुपये मात्र है ।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।
 06/12/2021
 06/12/2021
