

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक.....18313700/बिक्रमगंज/दिनांक.....15.12./ 2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:- शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत बिक्रमगंज दिनारा पथ से नियाजिपुर तक पथ के समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत बिक्रमगंज दिनारा पथ से नियाजिपुर तक पथ का निर्माण कार्य संवेदक मे० दुर्गा शक्ति कन्स्ट्रक्शन, प्रो०- प्रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम-महुली, पो०- धारुपुर, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास को दिनांक-08.03.2019 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का एकरारित समय दिनांक-07.03.2020 था। संवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन में Public Hindrance का उल्लेख किया गया है। Public Hindrance के कारण उक्त पथ में कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक-18.12.2020 तक पूर्ण करा लिया गया है।

अतएव कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, संझौली द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य का दिनांक-18.12.2020 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/12/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।
15/12/2021

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- *Bikramganj Dinara path to rayagipur*
2. Name of Agency :- *M/S Durga Shakti construction*
3. Date of written order to commence the work :- *08-03-2019*
4. Contract date of the Completion:- *07-03-2020*
5. Extension date of the Completion:- *18-12-2020*
6. Agreement No. :- *34 SBD/2018-19*
7. Upto date Payment :- *100 %*
8. Agreement Value :- *2,08,08,355*
9. Time applied for :- *18-12-2020*
10. Cause of extension of time :- *public hindrance*
11. Signature of contractor with date:- *[Signature]*
12. Recommendation of Junior Engineer :- *public hindrance.*
[Signature] *18/12/2021*
J.E.
13. Recommendation of Assistant Engineer :- *[Signature]*
14.12.2021
14. Recommendation of Executive Engineer :- *[Signature]*
15/12/21



क्रम सं०	विक्रय की तिथि	मुद्रक का नृत्य/मृत्यु उम्र की सीट सं० सहित	केता का नाम एवं पता	अभियुक्ति
----------	----------------	---	---------------------	-----------

बिहार BIHAR 2582 256 2020 900X12700 दुर्गा शक्ति कन्स्ट्रक्शन

Y 796054

महुली कृष्ण कुमार भट्ट
बिक्रमगंज मुख्यालय बिकेता
ला० नं०-18/1981
राज रजिस्ट्री ऑफिस
बिक्रमगंज (रोहतास)

शपथ पत्र

977

N.J.S. 100/20
W.D. 25/20
1257/20

शपथ-पत्र

मैं, मे0 दुर्गा शक्ति कन्स्ट्रक्शन, प्रोपराइटर-प्रविन्द्र कुमार सिंह, पिता श्री बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम- महुली, पो0- धारुपुर, थाना- बिक्रमगंज, जिला- रोहतास (बिहार) 802212 का निवासी हूँ और शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ :-

1. यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि एग्रीमेन्ट नं०- 34SBD/2018-19 कार्य का नाम- Bikramganj Dinara Road to Niyajipur.
3. यह कि मेरे द्वारा जमा किया गया सारा कागजात सही है।
4. यह कि कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है।
5. यह कि बड़े हुए दर का दावा नहीं करूँगा।

सत्यापन


मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है।

शपथकर्ता

(Signature)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाये।
Pranod K Singh

अधिवक्ता
09/12/20



Reg. : 1190581



M/S Durga Shakti Constructions

Mob. : 8292171121

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS

Vill.- Mahuli, P.O.- Dharupur, P.S.- Bikramganj, Dist.- Rohtas (Bihar) 802212

E-mail ID : pksingh2151@rediffmail.com

Ref.

Date.....

सैना मै,

कार्यपालक अधिकारी
ग्रा.प. कार्ड वि. कार्ड
प्रमोडल - बिक्रमगंज

विषय - समय-वृद्धि स्वीकृत कराने के संबंध में।

महोदय :- उपरोक्त विषय के संबंध में कहना

है कि M.M.C.S.Y. योजनाअंतर्गत 34/

S.B.D. 18-19 में समय-वृद्धि की स्वीकृति
कराने हेतु अनुबंधों को माफ़े

संगीत
9/12/21

vidhyabhushan
9/12/21
EE

785
9/12/21

विशालाशर्मा

Durga Shakti Constructions

Proprietor

अंचल अधिकारी का कार्यालय, दिनारा रोहतास।

पत्रांक:- 1090

दिनांक...10/10/2020

प्रेषक

अंचल अधिकारी,
दिनारा रोहतास।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

विषय:- MMGSY योजनान्तर्गत बिक्रमगंज दिनारा रोड से नियाजिपुर तक पथ निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा जमीनी विवाद के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 567 दिनांक-28.02.2021

महाशय,

उपर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY योजनान्तर्गत बिक्रमगंज दिनारा रोड से नियाजिपुर तक पथ निर्माण कार्य में विवादित जमीन में ग्रामीण जनता को समझा बुझा कर विवाद सुलझाते हुए कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।
सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन




अंचल अधिकारी
दिनारा रोहतास।










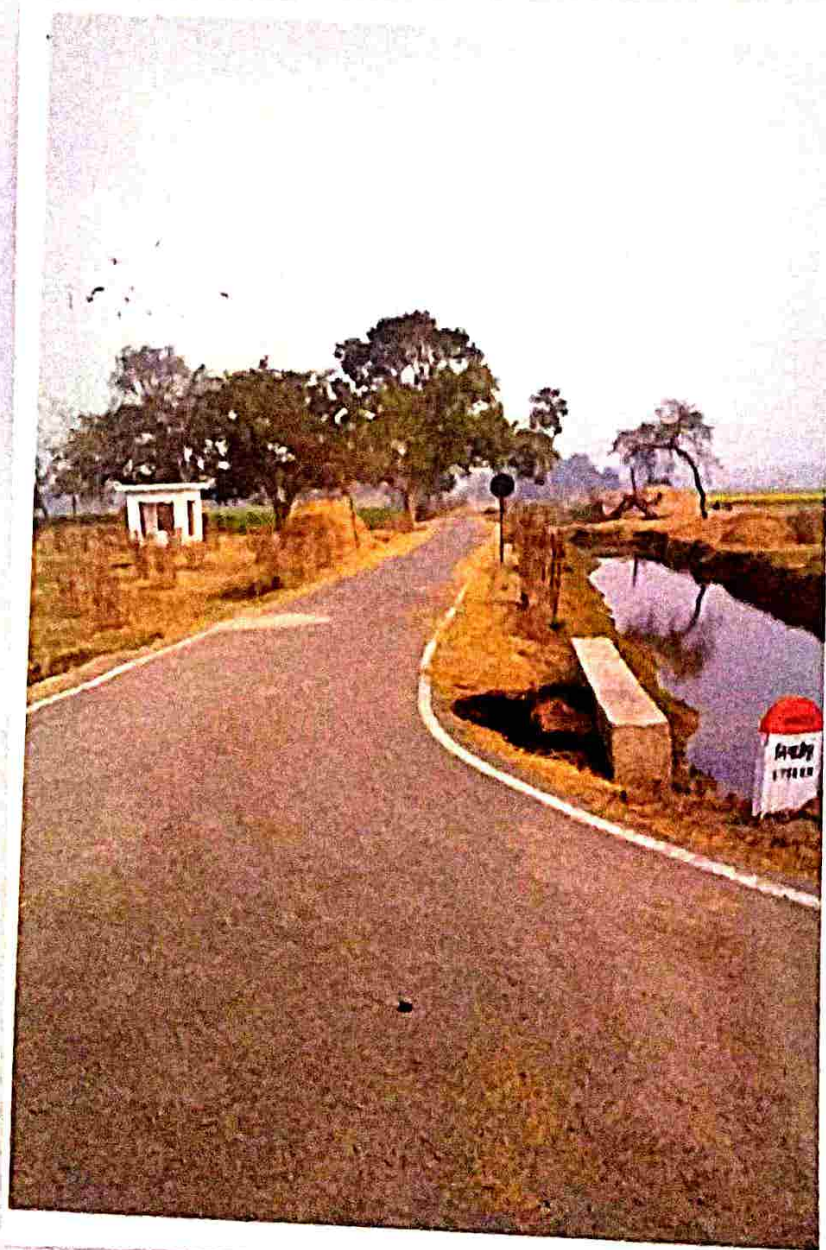

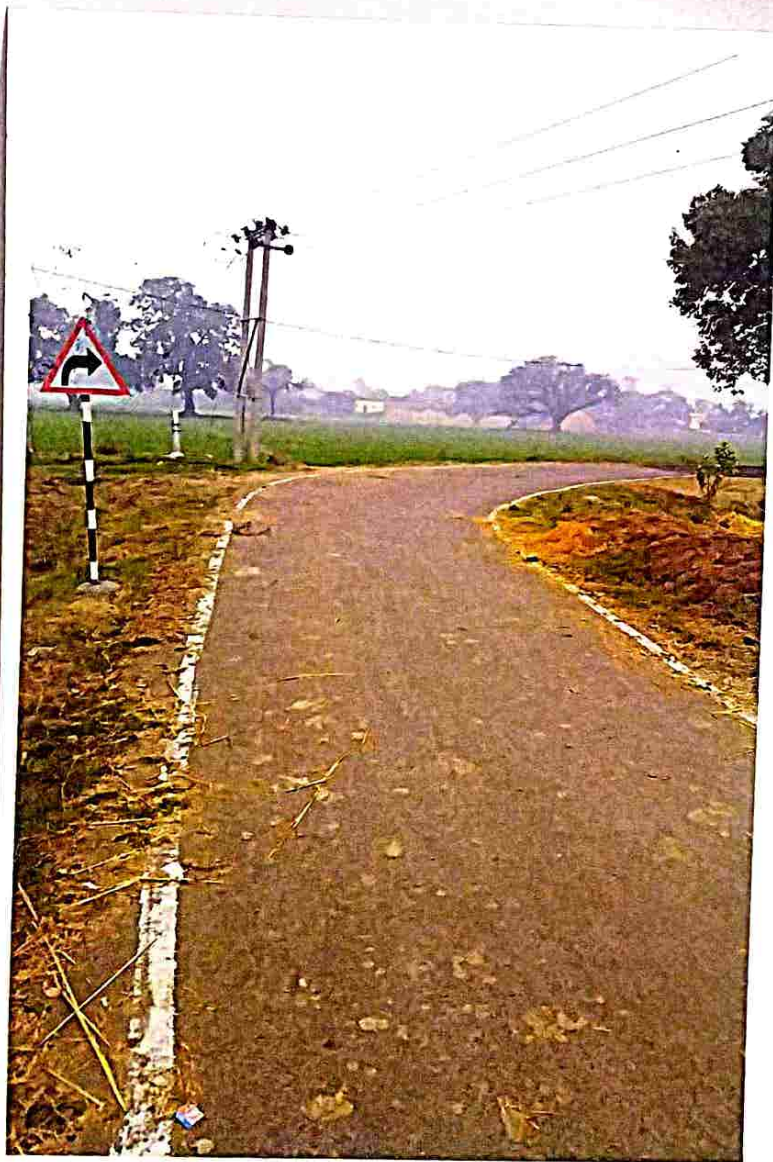

1st on A/c Bill

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
Name of Road - Birkongang - Dinabari					
Path to Majjibpur					
Length of Road - 2.25 km					
Name of Agency - M/s Durga Shakti					
Construction Prob. -					
Prananda K. Singh					
Birkongang (A/C Bill)					
Agreement No - 34 CBA/2018-19					
dtd 09/13/19					
Date of Start - 08.03.2019					
Date of Completion - 07.03.2020					
Date of Measurement -					

Record measurement

1/ p/v & fixing of working
bench mark pillars - -
- do -

Qty = 3 NOS, Qty = 3 NOS

2/ p/v & fixing of working
reference pillars - - do -
for direct - & tech. &

Qty = 11 NOS, Qty = 11 NOS

3/ clearing & grubbing Road
2/ Land - all for fuel -
- do -

$$2 \times 15 \times 30 \text{ m} \times 3.5 \text{ m} = 3150 \text{ m}^2$$

$$2 \times 15 \times 30 \text{ m} \times 3.5 \text{ m} = 3150 \text{ m}^2$$

$$2 \times 15 \times 30 \text{ m} \times 3.5 \text{ m} = 3150 \text{ m}^2$$

Continuation

$$\text{C.O. Qty} = 9450 \text{ m}^2$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					Bf of 9450 m ²
2 x 15 x 30 m x 3.5 m =					3150
2 x 15 x 30 m x 3.5 m =					3150
2 x 16 x 30 m x 3.5 m =					3360
2 x 12 x 20 m x 3.5 m =					140
					19250 m ²
Qty = 19250 / 10000 =					1.93 Ha.
4/ P/V # fixing of door					
15 board of project as per door - & lock - sp -					
Qty = 2 Nos.					Qty = 2 Nos.
5/ Dismantling of existing structure like culvert -					
(i) Cement concrete					
65 1 x 3.5 m x 1.1 m x 0.15 m =					0.60 m ³
4 x 3.5 m x 1.5 m x 0.15 m =					3.24 m ³
1 x 1.00 x 5.00 x 0.15 =					0.75 m ³
					Qty = 4.59 m ³
(ii) Dismantling of existing reinforced cement concrete as per - sp -					
1 x 1.00 x 5.00 x 0.30 =					1.50 m ³
2 x 1.00 x 0.30 x 0.30 =					0.18 m ³
					Qty = 1.68 m ³
6/ Dismantling of existing stru. like culvert - cement mortar -					
1 x 2 x 4.20 x 0.85 x 25 =					17.33 m ³
4 x 2 x 6.20 x 0.85 x 30 =					122.76 m ³
1 x 2 x 5.00 x 0.85 x 30 =					24.75 m ³
					Qty = 164.84 m ³

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
2/ P/V remaining & existing damaged H-P					
(i) 600mm dia					
67	3	2.5m			7.5m
(ii) 600mm to 900mm					
67	8	2.5m			20.8m
8/ Earth/W in excavation for founding of strud up to 3.0m depth					
600mm Ø					7 Nos
1000mm Ø					1 No
for 600mm Ø					
H.W	7	2	3.9m	1.5m	94.19m ³
below					
puto	7	1	5.35m	1.30m	15.45m ³
for 1000mm Ø					
(a) Qty = 109.64m ³					
(b) Qty = 109.62m ³					
H.W	1	2	6.45m	4.0m	27.09m ³
below					
puto	1	4	8.50m	1.53m	2.708m ³
(b) Qty = 29.798m ³					
9/ P/V P.C.C. m/s in foundh.					
for 600mm Ø					
H.W	7	2	3.9m	1.5m	9.419m ³
below					
puto	7	1	5.31m	1.30m	10.503m ³
for 1000mm Ø					
(a) Qty = 19.922m ³					
H.W	1	2	6.45m	4.0m	2.71m ³
below					
puto	1	1	4.93m	1.30m	1.886m ³
(b) Qty = 4.596m ³					
10/ P/V P.C.C. m/s in foundh.					
P/V & laying R.R.C. pipe					
NP-3 for stage					
for 600mm Ø	7	3	2.50m		52.5RM
for 1000mm Ø	1	3	2.50m		7.5RM

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
Head - m/sy (GEN)					
N/work - Bikanerj - Dinara path to Mijapuri					
N/agency - m/s Durga Shakti Construction prop. - Pravin Kumar Singh					
Agreement No. - 34585/2018-19 dt. 09.03.2019					
Date of start - 08.03.2019					
Date of comp. - 07.03.2020					
Date of actual comp. - 18.12.2020					
2.					
Further measurement - Nil					
19.03.2021					
19.03.2021					
Final bill					

Head - m/sy (GEN)					
N/work - Bikanerj - Dinara path to Mijapuri					
N/agency - m/s Durga Shakti Construction prop. - Pravin Kumar Singh					
Agreement No. - 34585/2018-19 dt. 09.03.2019					
Date of start - 08.03.2019					
Date of completion - 07.03.2020					
Date of actual comp. - 18.12.2020					
1. P/V bench mark pillar					
Qty = 3 nos, 17mm dia					
@ 4808.80 each - Rs 13826.40					
2. P/V reference pillar on path					
Qty = 11 nos, 17mm dia - (6) - 6)					
@ 2093.70 each - Rs 23030.70					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
59. Back filling behind cul- 59 7 return wall - as					
Qty = 78.74 m ³ VTM BPN-74					
@ 13741.34/m ³ - 13					58521=00
60 painting on parapet wall 60 as - as					
Qty = 49.28 m ² VTM BPN-74					
@ 1108.98/m ² - 13					5370=00
61 Road marking with bit 19 - - - as -					
Qty = 4600 m ² VTM BPN-74					
@ 13850.93/m ² - 13					391427=00
62 Road marking on C.C. 20 Surbore - as -					
Qty = 90.0 m ² VTM BPN-74					
@ 13953.99/m ² - 13					85859=00
63 painting on parapet wall 26 600mm - as -					
Qty = 87.36 m ² VTM BPN-74					
@ 13108.98/m ² - 13					9520=00
64 painting on parapet wall 57 for 1000mm - H.P.C - cu					
Qty = 20.64 m ² VTM BPN-74					
@ 13108.98/m ² - 13					2249=00
65 P/V & fixing ordinary 14.12 km post 200m - as -					
Qty = 3 Nos, VTM BPN-74					
@ 132378.67/each - 13					7136=00
66 P/V & fixing 200m slab (precast) - as -					
Qty = 12 Nos, VTM BPN-74					
@ 13671.73/each - 13					8060=00
67 P/V & fixing boundary pillar 17 - as -					
Qty = 32 Nos, VTM BPN-74					
@ 13539.85/each - 13					38869=00

Continuation

20429827=00

Continuation

