

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 98763121 हिलसा, दिनांक 09.02.21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Jamuaara Road to Luchan Tola पथ
निर्माण कार्य का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत
Jamuaara Road to Luchan Tola पथ निर्माण कार्य का सम्वेदक श्री बेजनाथ प्रसाद है। इस
पथ का एकरानामा सं०-SBD-90/2018-19 एवं एकरानामा की राशि रु०-1583912.00 (पन्द्रह
लाख तैरासी हजार नौ सौ चारह रु०) मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-09.03.2019 एवं समाप्ति की
तिथि-08.12.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-20.02.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की मांग की
गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण भूमि विवाद एवं लॉकडाउन बताया गया है।
कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, हिलसा एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य
विभाग, कार्य अंचल प्रमण्डल, हिलसा के द्वारा दिनांक-20.02.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की
गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल
आवेदन को दिनांक-20.02.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित
की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ का फोटोग्राफ एवं मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति का
प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

61/मा/प
9.2.2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।
9.2.2021

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Jamuara Road to Luchan Tola mmsy (Gen)
- (2) Name of Contractor :- Sri Baignath Prasad
- (3) No. of agreement order :- SBD-90/2018-19
- (4) Date of commencement of work :- 09.03.2019
- (5) Contractor's date of completion of work :- 08.12.2019
- (6) Date of Actual Completion :-
- (7) Date of hindrance :- 01.04.2019 to 25.10.2020
- (8) Provision extension date :-
- (9) Further extension of time rewarded :- 20.12.2021
- (10) Reference of contractor's application if any :- NO
- (11) If any defects have been found the work date :- NO
- (12) Region :- Due to public hindrance
- (13) Proportion of work date up to completion of time :-
- (14) Proportion of up date work done :-
- (15) Recommendation of J.E. :- The work has been interrupted due to land
disputations created by public
- (16) Recommendation of A.E. :- Recommended
Cecel
30/11/2020
J.E.
- (17) Final order or recommendation of the E.E. :-

Baignath Prasad
Signature of Contractor

9.2.2021
Signature of
Executive Engineer
PWD Works Division
Hilsa
9.2.2021

ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर

मुखिया

जतन पासवान

मो०-9955835031

6201371501

आपका

ग्राम-सरदार विगहा, पो०-काजरी

हिलसा, (नालन्दा)

पत्रांक :- 113

दिनांक 10-6-2020

शेखर मि,

कार्यपालक आसमंता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमोडल दिखलवाने

विषय- शिर्ष- MAMLSU - GEN योजना अन्तर्गत
जमुकाश रोड से लुपकटोला का पथ निर्माण कार्य
कानूने के सम्बंध में।

महोदय, उपर्युक्त विषय के आलेख में बतलाई मिआप
के कार्यालय में विभाजित पथ का निर्माण कार्य
विभाग प्राप्त है। जिसमें पथ के कुछ भाग में ग्रामीणों
द्वारा अवरोधक काट लिया गया था। जिसके कारण
सेवेदक द्वारा कार्य बन्द काट दिया गया है, काजरी-
पिनोवाय ग्रामीणों का आपसी समझौता का उद्देश्य
पथ में अवरोधक को मुक्त किया गया है, अब कोई
कार्य करने में दिक्कत नहीं है।

आजुगी मान-ले निवेदन है कि उक्त पथ का
निर्माण कार्य करने की कृपा की जाय, ताकि ग्रामीण-
जनता का अवगमन में सुविधा हो सके, इसके लिए
सहयोग प्रार्थना है।

आपका विश्वासी
Jatam Paswan

गैर नि

कार्यपालक समिति
श्रीमती काशी विभागा
कार्य प्रमोद, दिल्ली

विषय :- mmmsy-0000 योजना अन्तर्गत प्रमुखा पत्र से लुप्त हो
पत्र के निर्माण कार्य के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है की विषयों के
पत्र का निर्माण कार्य में देरी करायी जा रही थी जिसके
कुछ प्रयोग पर श्रीमती काशी अतिक्रमण कर मिट्टी का
मोप डा बनाया हुआ है जिसके कारण पत्र
का कार्य ठीक ठीक से करवा दे रहे हैं

अतः श्रीमती काशी निर्माण है की उक्त पत्र
में किंचित् देरी उत्तीर्णता की सुझाव देना की
कृपा की जाय ताकि उक्त पत्र का कार्य करवा जा सके
सुनिश्चित है की वर्तमान में कारण की समय नष्ट
हो चुका है

आपका आशीर्वाद

Bejmath Bazar

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा I)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या .../.../...

हिलसा, दिनांक 22-9-20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
चिकसीरा, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Jamuaara Road to Luchan Tola पथ
निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत
Jamuaara Road to Luchan Tola पथ का निर्माण कार्य का समवेदक श्री बैजनाथ प्रसाद है।
द्वारा कराया जा रहा है। उक्त पथ के समवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि कुछ ग्रामीणों द्वारा
पथ के जमीन पर अतिक्रमण किये हुए हैं जिसके कारण पथ का निर्माण कार्य बाधित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पथ में ग्रामीणों द्वारा किये गये अतिक्रमण को मूक्त
कराने की कृपा की जाय ताकि सरकारी कार्य पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन


22-9-20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

MMGSY (GEN)

MB No 1488

Executive Engineer

Schedule XLV-Form

Works Division, Misa

पत्र का नाम -

सुश्री रीत दे देवी देवी

पत्र का

पत्र का -

देवी देवी देवी

Mobile - 9431487750

पत्र का -

SUB-DIVISION

Measurement Book

पत्र का - देवी देवी

AA, Genuah Memu Manda

TE-RP: chudhary

Executive Engineer
RWD Works Division
9.2.2021

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: construction of road from Jamuara road to Luchan Tola					

Name of Agency: Sri Rajinath Basad
 Village: Lokarong, P.S. H/189
 P.O. Chamerbigha, Noida

Agreement No: SBD 30/2018-19

Accepted Rate: 2.00% below

Agreement value: 10,83,12,50

Date of issue of LOA: 09.03.2019

Intended date of completion: 08.12.2019

Date of measurement:

— measurement as follows —

Item ① Providing & fixing of working

benchmark pillars & NE as per

km 2 & 40 m reference pillars

required for 1 km — as per

Qty 0.320 km

② clearing & grubbing

Road land — as per

1x 30.0x 5.0 = 150.0m²

1x 30.0x 5.0 = 150.0m²

1x 30.0x 4.80 = 144.0m²

Continuation

Qty 444.0m²

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					B = Rs 1536382=
(16) Provision & execution					
17 detection and place					
identification & to reflect					
work of 18750 m ² per 1000					
— do — F12					
Qty 1.0 m ² - 1.0 m ²					
page (9) & 10					
					(15)
@ Rs 9315 = 96/cum					B 9316=
					Total B 1545695=
less 2.0% below 20 per cent					B 30914=
agreement					B 1514781=

Page 10 of 10

Rev 15/12/2020 J.E.	Guided 15/12/2020 A.E.			
Up-to-date material statement				
(I) Earth			324.39 m ³	
(II) Stone aggregates			261.87 m ³	
(III) Coarse sand			84.26 m ³	
(IV) Stone screenings			17.625 m ³	
(V) Bricks			3858 nos	
(VI) Fine sand			6.40 m ³	
(VII) Local sand			1.80 m ³	
Rev 15/12/2020 J.E.	Guided 15/12/2020 A.E.			

Continuation

9/2/2021
Executive Engineer
RWD Works Division
Hilga
9.2.2021



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

योजना का नाम- जमुआरा पथ से लुचन टोला तक पथ निर्माण
पथ की लम्बाई- 0.320 कि.मी. प्रा.राशि- 1583912 लाख
5 साल तक रख-रखाव की राशि- 400-00
कार्य प्रारंभ की तिथि- 09/03/2019
कार्य समाप्ति की तिथि- 08/12/2019
संवेदक का नाम- श्री बैजनाथ प्रसाद लोहरवा बिगहा हिलसा (नालन्दा)
कार्यकारी एजेन्सी- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल हिलसा
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (बिहार सरकार) द्वारा संयोजित



SHANTON REBMIT
ANNUAL CAMERA




बिहार सरकार

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला-नालन्दा

सड़क का नाम- जमुआरा एव से सुख रोता तक पथ निर्माण
कुल लम्बाई- 0-320 कि.मी. बी.टी. सड़क- 11 कि.मी. सीमेंट कंक्रीट सड़क- 192 कि.मी.
पुलियाँ/पुल- सम R.C.C. कलमट- लग

सड़क पेवमेन्ट का विवरण

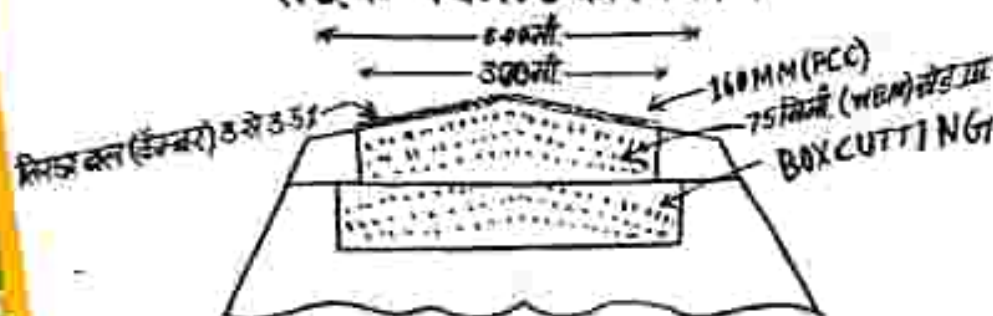

सड़क का (काट-संड) विवरण

1. बंधान का मिट्टी कार्य- 324-84 घन मी. (65 टक के समतुल्य)

पावो डालकर रैलर से दबाया हुआ।

2. दासदार उप आधार- 35-650 घन मी. (70 टक के समतुल्य)

पावो डालकर रैलर से दबाया हुआ।

3. मुक- 18-का घन मी. (36 टक के समतुल्य)

मिट्टी का कार्य- 18 (केस) घन मी. (36 टक के समतुल्य)

काट-संड का कार्य- 18-का घन मी. (36 टक के समतुल्य)

4. मिट्टी का कार्य- 75-440 घन मी. (15 टक के समतुल्य)

परत में काँच/मो. मिट्टी- 88-86 घन मी. (18 टक के समतुल्य)

पावो का कार्य- 12-62 घन मी. (4 टक के समतुल्य)

पावो का कार्य का मिट्टी का कार्य डालकर रैलर से दबाया जाएगा।

सीमेंट कंक्रीट का कार्य- 192 घन मी. (192 टक के समतुल्य)

स्टोन स्लैब का कार्य- 192 घन मी. (192 टक के समतुल्य)

काँच का कार्य- 70-50 घन मी. (70 टक के समतुल्य)

SHO... 350NI Y3...
CAMERA



Name D.D. 1. 1. 1.

Name of Road: Jomoro Road to
Lucham Tola

Ram
13.11.2020
J.E

Cenul
13/11/2020
J.E

9/11/2021
9.2.2021

~~World Bank~~
World Bank
World Bank



0001228642

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :	19-JAN-2021 12:15:27
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	GRII (R) RASTHURTURE FINANCE LIMITED
LOCATION :	CIVIL COURT HILSA
e-COURT RECEIPT NO.:	BRCT1503A2129T903
e-COURT FEE AMOUNT :	₹ 90 (Rupees Ninety Only)



BRCT1503A2129T903

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.e-courts.gov.in. Any discrepancy in the details on this receipt and/or available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is void and liable for verification & locking by the Court Official.

Certified that Sri
*who has been identified by Sri
Advocate has Affirmed on S.A. before me
the facts stated in the Affidavit.

Dilip Kumar
NOTARY
H. No. Nalanda Bih.

No. 1385 Date 11/1/2021

NOTARY प्रमाणक, हिलसा (नालन्दा)
Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S 11(18)
of the Notary Act

शपथ-पत्र

मैं श्री बैजनाथ प्रसाद, साकिन-लोहरवा विगहा, पो0-समरविगहा, थाना हिलसा, जिला नालन्दा, राज्य बिहार शपथ पूर्वक ध्यान करता हूँ।

1. यह कि मैं तृतीय श्रेणी के ग्रामीण कार्य विभाग का संवेदक हूँ।
2. यह कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, हिलसा में MMGSY Gen योजना अन्तर्गत जमुआरा रोड से लुचन टोला पथ निर्माण कार्य करा रहा हूँ। पथ का विवरणी निम्न प्रकार



करारनामा संख्या:- SBD-90/2018-19
करारनामा की राशि:-15,83,912.00
कार्य प्रारंभ की तिथि 09.03.2019
कार्य समाप्ति की तिथि 08.12.2020

कि उपरोक्त कार्य स्थानीय लोगो द्वारा विवाद के कारण कार्य करने में काफी समय नष्ट हुआ
4 यह कि पुनः कार्य प्रारंभ कर दिनांक 20.02.2021 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा
5 यह कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार का वित्तिय दावा पेश नहीं करूँगा।

Identify the deponent
who has put his/her Signature
in my Presence

Advocate

उपरोक्त शपथ पत्र को पढ़कर समझ लिया और सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
Baidnath Prasad.
