

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)
[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 275-6377

हिलसा, दिनांक 10-2-21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Bele Panchayat ke Bakaur PMGSY Road to Thudhani Par via Yogi Bigha पथ निर्माण कार्य का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Bele Panchayat ke Bakaur PMGSY Road to Thudhani Par via Yogi Bigha पथ निर्माण कार्य का संवेदक श्रीकान्त प्रसाद है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-68/2018-19 एवं एकरारनामा की राशि ₹0-1583912.00 (पन्द्रह लाख तेरासी हजार नौ सौ चारह ₹0) मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-09.03.2019 एवं समाप्ति की तिथि-08.03.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-30.04.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की मांग की गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण भुनि विवाद एवं लॉकडाउन बताया गया है। कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, एकंगरसराय एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, एकंगरसराय के द्वारा दिनांक-30.04.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल आवेदन को दिनांक-30.04.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ का फोटोग्राफ एवं मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासप्रजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Construction of Road From Gade Panchayat Kasa Kaur
Thuanhar via fogi Bigha with five yards. (M.O.S.Y)
- (2) Name of Contractor :- Srikant Prasad
- (3) No. of agreement order :- 09/03/2019
- (4) Date of commencement of work :- 09/03/2019 ALB - S.B.D 68/2018-19
- (5) Contractor's date of completion of work :- 8-3-2020
- (6) Date of Actual Completion :-
- (7) Date of hindrance :-
- (8) Provision extension date :-
- (9) Further extension of time rewarded :- 30-04-2021
- (10) Reference of contractor's application if any :-
- (11) If any defects have been found the work date :-
- (12) Region :- Land dispute Covid-19
- (13) Proportion of work date up to completion of time :-
- (14) Proportion of up date work done :- 55%
- (15) Recommendation of J.E. :- जमीन विवाद एवं Covid-19 के कारण लगभग कार्य पूर्ण
नहीं हो सका। कार्य पूर्ण करने हेतु 30-04-21 तक काम लिया
जाएगा।
- (16) Recommendation of A.E. :- *[Signature]* 30-04-21
- (17) Final order or recommendation of the E.E. :-

Srikant Prasad
Signature of Contractor

[Signature]
9.2.2021
Signature of
Executive Engineer



H.

BAR ASSOCIATION, HILSA (NALANDA)

G

शपथ-पत्र Affidavit

No. 1295 Date 9.2.2021

Notified that Sri. Sankant Poojari
has been identified by Sri. [Signature]
who has affirmed on S.A. before me
the facts stated in the Affidavit

Dilip Kumar
NOTARY
Hilsa, Nalanda, Bihar

समक्ष,
NOTARY लेख्य प्रमाणक
Hilsa (NALANDA)
Authorised U/S of the Notary Act

शपथ-पत्र

मैं श्रीकान्त प्रसाद पिता स्व० हरिहर प्रसाद साकिन मो०- मोगल कुओं पोस्ट+थाना-
सोहसराय जिला नालन्दा शपथपूर्वक व्यान करता हूँ कि :-

- 1 यह कि मैं उपरोक्त वर्णित पता का स्थायी निवासी हूँ।
- 2 यह कि मैं प्रथम श्रेणी के ग्रामीण कार्य विभाग का संवेदक हूँ।
- 3 यह कि मैं ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हिलसा में MMGSY(Gen)
योजना अंतर्गत बेल पंचायत के बकौर MMGSY पथ से तुठनी पर भाया
योगी बिगहा पथ का निर्माण कार्य करा रहा हूँ। पथ का विवरण निम्न प्रकार
है :-

एकरारनामा सं०- SBD-68/2018-19

एकरारनामा की राशि- 9851921.00

कार्य प्रारंभ की तिथि- 09.03.2019

कार्य समाप्ति की तिथि- 08.03.2020

यह कि स्थानीय लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण पथ निर्माण कार्य
करने में काफी समय नष्ट हुआ है।

यह कि लॉकडाउन के कारण पथ का निर्माण कार्य में काफी समय नष्ट हुआ
है।

यह कि अब मेरे द्वारा यह कार्य दिनांक 30.04.2021 तक पूर्ण करा दिया
जायेगा।

यह कि समय वृद्धि की स्वीकृति के उपरांत भुगतान के अलावा अन्य किसी
प्रकार बड़े हुए दर का वित्तीय दावा नहीं करूँगा।

शपथ पत्र के मजबुन को पढ़कर वो
पढ़वाकर सुन वो समझ लिया और सही
पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

893

I identify the Signature L.T.I.
of deponent. Sankant Poojari
Who has put his/her signature

Sri Kant Prasad
Govt. Contractor

Mohalla-Mogai Kuan
P.O. - Sohrai (Nalanda)
Mob.: 9955010160

Ref.:

Date 10/12/2021

श्रीमान श्री

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रभाग दिल्ली

13/12/2021

विषय - समझौता के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव - म.म.क.पु. मोगाई कुआँ नौदागंज निजामी को-ऑपेरेटिव सोसाइटी पत्रा के सम्बन्ध में।

प्रस्तावक,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लॉड अगुतीवाई कि
ग्रामीणी निवासी एच.के.बीड-19 से कारण एक परतार
के कारण कार्य बन्द कर दिया गया है। उक्त
पत्र में अगुती 0.54.2021 से एक फुल कुलीया
नव्य P.C.C की कार्य समाप्त हो चुका है। निम्न
प्रमाणों के साथ कार्य जारी है। अतः लिए मुझे
31/12/2021 तक समझौता दिलाया जाय।

अतः श्रीमान् के निवेदन है कि उक्त कार्य को
एक दिन में रखते हुए समझौता दिये की रूप
लिखा जाय।

चित्पाल मोगाई
श्रीकांत प्रसाद
निवेदक

WORK PROGRAMME
NAME OF CONTRACTOR- SRIKANT PRASAD

CONSTRUCTION OF ROAD FROM BELE PANCHAYAT KE BAKAUR PMGSY ROAD TO THUDHANI PAR VIA YOGI BIGHA ROAD.

क्रम संख्या	कार्य का नाम	09 March-2019 to 08 March-2020	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	28-Feb-21
1	Earth Work	ग्रामीणों द्वारा जमीन विवाद एवं अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित											
2	GSB Grading-I												
3	WBM Gr-III												
4	1000mm HPC												
5	RCC Box Culvert												
6	PCC M30												
7	Premixing												
8	Sign Board												
9	Road Marking												

Sri Kant Prasad

जिला परिषद् नालन्दा

प्रतीमा सिन्हा

सदस्य जिला परिषद् नालन्दा
एकमंस्तराय दक्षिणी-6

स्थायी निवास :-

ग्राम-हॉसेपुर, पो-0-ब्रौह

धाना-ब्रौहारी, एकमंस्तराय (नालन्दा)

मो-9386494651

पत्रांक 594

दिनांक 17/3/2021

श्री 17/3/20 सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य समण्डल, हिलसा

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत बेलें पंचायत के बकौर PMGSY रोड से कुदनीपर माया जेजीविय तक पथ निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में कहना है कि बेलें पंचायत के बकौर PMGSY रोड से कुदनीपर माया जेजीविय पथ के निर्माण कार्य में कुछ ग्रामीणों द्वारा अपना भी जमीन बताकर कार्य माह दिसम्बर से मार्च तक को अवरुद्ध किया एवं कोविड-19 के कारण भी लगभग तीन महीना कार्य अवरुद्ध रहा। बाद में ग्रामीणों के समझौता का कार्य शुरू किया गया है।

आपका विश्वासी

प्रतीमा सिन्हा

सदस्य

जिला परिषद् नालन्दा
(दक्षिणी)

सहायक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, एकंगरसराय

पत्र संख्या ...32...

एकंगरसराय, दिनांक ...03.05.2019

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, एकंगरसराय।

सेवा में,

अंचलाधिकारी, एकंगरसराय
नालंदा।

विषय :-


शीर्ष मुख्यामंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत बेले पंचायत के बकौर पीएमजीएसवाई रोड ठूढ़नी पर भाया योगी बीघा पथ की मापी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यामंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत बेले पंचायत बकौर पीएमजीएसवाई रोड से ठूढ़नी पर भाया योगी बीघा पथ निर्माण का कार्य संवेदक द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा रैयती जमीन बताकर योगी बीघा गांव के पास कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। जिसके कारण कार्य बाधित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकारी अमीन से पथ का मापी कराते हुए मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन


03.05.2019

सहायक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अवर प्रमण्डल एकंगरसराय।

MMGSY (GEN)

Construction- 9007391.00
 Maintenance- 844530.00

 Total- 9851921.00

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Hilsa

Construction & Five Year Maintenance of Road from Bele Panchayat ke Bakaur PMGSY Road to Thudhani Par via Yogi Bigha (Tender ID-75293) Under MMGSY(Gen) Year 2018-19

Name of Contractor & Address:- Srikant Prasad, At- Mogalkuan,
 Sohsarai, Biharsharif
 Nalanda (Bid I.D-344204)

Agreement No.-SBD.6.8./2018-19

Accepted Rate:- 0.01% Below

Agreement Value:- 98,51,921.00


Date of Issue LOA:- 03/03/2019

Intended Date of Completion:- (12 Months)

PAN	ARSPP8856G
GST NO	10ARSPP8856G1ZA
REGISTRATION NO	1180072
	1 ST Class RWD, BIHAR

Sri Kant Prasad

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Hilsa

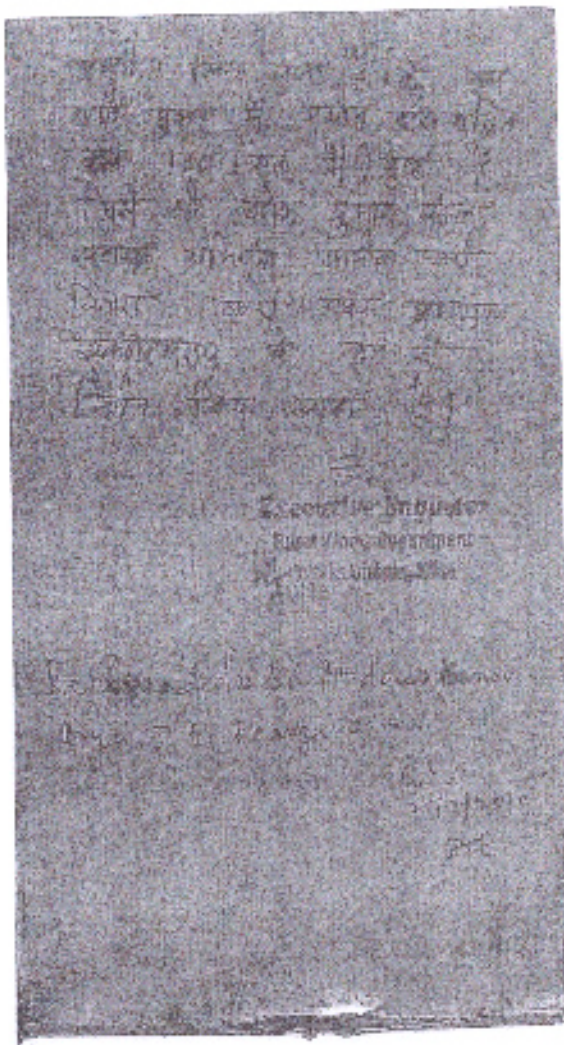

Sch. KLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

9/11/21
9.2.2021
Executive Engineer
RWD Works Division
Hilsa
BDM

Measurement Book
No. 1405.

Name of Officer Shri Ganesh Kumar Mandal
RWD works Sub div. Changanassari
Date of first entry _____
Date of last entry _____

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(i) Name of work— <u>Back porch at K. A. K. K.</u>					
<u>PMGry road to the main bar via</u>					
<u>Yard back on Ekangamoni place.</u>					
(ii) Name of Agency— <u>Shri Kant K. K.</u>					
(iii) Agreement at <u>72-5/10/18-19</u>					
(iv) Date of start <u>9/10/19</u>					
(v) Date of completion <u>2/2/2020</u>					

Details of actual measurement					
Stn.	Chainage	Area	Mean Area	Dist.	Volume
1	0	2.180			
2	50	2.109	2.641	50	132.125 m ³
3	100	2.655	2.828	50	141.400 "
4	150	4.343	3.577	50	178.854
5	200	5.147	4.823	50	242.651
6	250	3.733	4.413	50	222.151
7	300	3.032	3.416	50	170.751
8	350	2.210	2.309	50	115.050
9	400	4.500	3.605	50	190.251
10	450	2.793	3.617	50	180.825
11	500	3.52	3.127	50	156.325
12	550	5.499	4.570	50	228.475
13	600	3.011	4.255	50	212.75
14	650	2.915	2.988	50	149.400

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	Di.	
<u>Material date to mail</u>					
(i) E/W	69244	2.875.56			3072.902
(ii) P.W.					
	85352	45.495	12.762		34.605
	13.672	107.072			
Corrected		15.672			
Stone chp	914				
(iii) M/W	53.870	32.944			94.262
Amended		32.944			
Corrected		30.152			
Am					
871619					

memo of Payment - 20010460	
S.D.S.V.	2100052
P.S.D.V.	26003120
G.T.V.	22001020
L.S.V.	22001020
S.H.S.T.V.	22001020
C.H.S.T.V.	22001020
Roy (M.D)	210551920
by chem	2165540620
	20010460

Added For Rs 200104600

Twenty lac one thousand four hundred

Six only

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण विकास विभाग

कार्य प्रमंडल, हिलसा

9.8.19

Continuation

Scanned by

Executive Engineer
RWD Works Division
Hilaa

Sri Kant Prasad
Govt. Contractor

Mohalla-Mogai Kuan
P.O. - Sohrai (Nalanda)
Mob.: 9955010160

Ref. :

Date 10/12/2020

सेवा में

कार्यपालक अभियंता

आमनीय कारीबिगारा

कार्य प्रमोदल विभाग

विषय - समग्र वृद्धि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव - समग्र वृद्धि आगंतु रजिस्ट्रार विभाग की ओर से।
ले मकडुपुल पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लार्ड अटोरीयाई कि
आमनीय विभाग एवं को-वीड-19 के कारण एवं परामर्श
के कारण कार्य प्रमोदल वा फुल गरी ड्रॉइंग। उक्त
पत्र में अटोरीयाई रजिस्ट्रार एवं फुल फुललीया
नव्य P.C.C. का कार्य प्रमोदल हो चुका है। विभाग
किंगडम x 4 का कार्य वाकी है। अतः लार्ड अटोरीयाई
31/3/2021 तक समग्र वृद्धि दिया जाए।

अतः यीमान् कि निवेदन है कि उपरोक्त कार्य का
हमारे एवं लार्ड अटोरीयाई के लार्ड अटोरीयाई
किंगडम वाकी।

विश्वास आगंतु
श्रीकांत प्रसाद
निवेदन
