

535

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा

पत्रांक1282-अनु०...../

नालन्दा/दिनांक 07.10.2020/

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हरनौत।

विषय :- शीर्ष-PMGSY योजनान्तर्गत L133-Pamara L056 To Santanbigha (VR133) Under PMGSY तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि के संबंध में।

प्रसंग :- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-मु0अ0-4(मु0) विविध कार्य-23-265/2016-721 दिनांक-12.02.2020, इस कार्यालय का ज्ञापांक-230(अनु०) दिनांक-15.02.2020 एवं आपका पत्रांक-1435(अनु०) दिनांक-24.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके पत्रांक-1435 (अनु०) दिनांक-24.09.2020 द्वारा प्राप्त समयवृद्धि का प्रस्ताव को मूल में लौटाते हुए निर्देश दिया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देश के आलोक में प्रस्ताव ऑनलाईन भेजना सुनिश्चित करें।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Akshay
7/10/20

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

Sujay
7/10/20

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 1435/2020

हरनौत,

दिनांक 24/09/2020

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।



सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:-

शीर्ष-PMGSY अंतर्गत L133-Pamara L056 To Santanbigha (VR133) Under PMGSY तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष-PMGSY अंतर्गत L133-Pamara L056 To Santanbigha (VR133) Under PMGSY तक पथ निर्माण कार्य संवेदक Shri Manoranjan Kumar Singh, Narayanpur, Tharthari (Nalanda) को आवंटित है। उक्त पथ की एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 19.12.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 18.12.2018 थी। परन्तु उक्त पथ में स्थानीय विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में करीब 13 माह का विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक-20.01.2020 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-20.01.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु०-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 9 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।
राम प्रसाद
24-9-2020

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of Contractor:- manoranjan kumar singh
2. Name of Work:- L133 - Ramara L056 to Janten high (WR 133)
3. Agreement No. & Date:- 31/SBO/2017-18(S)
4. Agreement Value:- Rs. 58,35,800.00.
5. Date Of Commencement:- 19-12-2017
6. Date of Completion:- 18-12-2018
7. Actual Date Of Completion:- 20-01-2020
8. Extension On Previously Given On:-
9. Extension Applied For:- 20-01-2020
10. Reason For Hindrance:- local hindrance.
11. Percentage Of Work Done:- 100-1.
12. Recommendation BY The J.E. :- *एवढा का समय था है। समयवृद्धि की अनुमति दी जाती है - 20/01/2020*
13. Recommendation By The S.D.O. :- Time extensim may be given. *12/09/20*
14. Recommendation By The Executive Engineer:-
15. Recommendation BY The S.E. :- *24.9.20*
16. Final Order Of The C.E. :-

Manoranjan Kumar Singh
Signature of the Contractor



(B.A.H.)

BAR ASSOCIATION, HILSA (NALANDA)

शपथ-पत्र Affidavit

No. 3068^C Date 27.8.2020

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक,

Dilip Kumar
NOTARY
Hilsa, Nalanda (Bihar)
हिलसा नालन्दा

who has identified by Sri Manoranjan Kumar Singh
Advocate has affirmed on S.A. before
the facts stated in the Affidavit

NOTARY
Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S (1) of
the Notary Act

मैं मनोरंजन कुमार सिंह पिता स्व. प्रदोस सिंह, ग्राम-श्रीनगर,
पोस्ट-शंकरडीह, थाना-धरदरी, जिला-नालन्दा, धर्म-हिन्दु,
राष्ट्रीयता-भारतीय नगरिक निम्नलिखित कथनों की धर्म एवं
ईमान से घोषणा करता हूँ कि -

1. यह कि, मैं उपरोक्त वर्णित पते का निवासी हूँ।
2. यह कि, मैं पी.एम.जी.स्त.वाई के अन्तर्गत पथ का स्वीकारनामा सं.-
31/स्त.बी.डी./2017-18 55 कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग
हरनौत से किया था।

1. पथ का नाम - पैकेज संख्या

1।एल.133- पमारा एल.ओ.56

दुसतन विगडा भी.आर.आई.33" बी.आर.-24 आर-316
अंडर पी.एम.जी.स्त.वाई

3. यह कि, समय वृद्धि के पश्चात भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय दावा प्रस्तुत
नहीं करूंगा।

4. यह कि, एक पथ में समय वृद्धि की आवश्यकता है।

शपथ पत्र के मजबूत हाजा को पढ़कर समझ लिया
तथा सहीपाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

Manoranjan Kumar Singh.
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

I identify the Signature L.T.I.
of deponent. Manoranjan Kumar Singh
Who has put his/her signature/
or L.T.I. in my presence.

Advocate

27.8.2020

En. No.

हवा में

कार्यपालक अभियंता
ग्राम कार्य विभाग ११
कार्य प्रमंडल हरनोत

Sup
12.11.18

विषय:- विद्युत P.M.C.S.P योजना अन्तर्गत 11/133
पंसार L056 से संतन विजेटा पैकेज सं० - BR 2MR-316
पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि
विषयावृत्ति पथ निर्माण कार्य द्वारा किया जा रहा है
उक्त कार्य का एकराशना के अनुसार कार्य पूर्ण
करने की तिथि 18.12.18 है; परंतु जमीनी विवाद
के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतः प्रमाण से अनुरोध है की पथ की
जाँची के लिए अधिकारी की अनुरोध किया
जाए।

अपका विश्वासयोगी

Mamoranjan Kumar Singh.

Date: 12-11-18

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक.....1253.....

हरनौत

दिनांक.....3.9.20.....

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संवेदक Shri Manoranjan Kumar Singh, Narayanpur, Tharthari (Nalanda) द्वारा इस प्रमण्डल के अंतर्गत शीर्ष-PMGSY अंतर्गत L133-Pamara L056 To Santanbigha (VR133) Under PMGSY तक पथ निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा संख्या 31/SBD/2017-18 एवं एकरारित राशि 58,35,800.00 रुपये मात्र है, कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप दिनांक-20.01.2020 को पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना में कुल राशि रू0 54,38,128.00 मात्र का भुगतान किया गया है। कार्य संतोषप्रद है।

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत

3/9/2020

03.9.2020

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Home Master Data Entry E string Road Core Network Proposal NIT Agreement Execution Quality Monitoring Maintenance General Facility Report Variance Reports

Execution Details List

Execution Details

Block
Road Name:
Overall Cost (Rs. in Lakhs):

Thachari
L133-Pamara L056 To Santalbhiga (VR133)
56.79

Package No.
Agreement Date
Sanction Length (in Km)

BR24RD16
19/12/2017
1.053

CDWorks Details Physical Details Connected Habitations Financial Details Remarks Details Image Details Executing Officer Details Technology Progress Details Road Safety Details Execution Technology Image Details

Road Physical Progress List

Month	Year	Work Status (Completion Date)	Preparatory Work (Length in Km)	Subgrade (Length in Km)	Subbase (Length in Km)	Base Course (Length in Km)	Surface Course (Length in Km)	Road Signs (Nos)	CDWorks (in Nos)	LS Bridges (in Nos)	Miscellaneous (Length in Km)	Completed (Length in Km)
1	January 2020	Completed (20/01/2020)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	13	2	0	1.053	1.053
2	March 2019	In Progress	1.053	1.053	1.053	1.053	1.000	0	0	0	0.000	1.000
3	March 2018	In Progress	1.053	1.053	0.500	0.000	0.200	0	0	0	0.000	0.200
4	February 2018	In Progress	1.053	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0.000	0.000

Page 1 of 1

4 records found

State : Bihar | District : Nalanda | Department : DPU Of Nalanda

GEO PMGSY App

Node II

Email - ommashep2018@gmail.com | Phone - 020-23503201

User Manual

© 2014 NBRCCL. All rights reserved.

કામો ભેગાં અને માળાધિકારી ખરબરી નામ-દા

પત્રેક્ર - ૪૦૪ તિનાંક 12/6/2019

પ્રેમકુ:-

અંબલાધિકારી
ખરબરી

સેવા મે

કમિષનર અધિકારી
ગ્રામીણ કૃષિ વિભાગ
વૃન્દાવન નામ-દા

વિષય:- પુચ્છાનમેલી ગ્રામ સડક મેજના કે નિર્માણાધિક

" L133 પામવા L056 To Santanકંગ્રહ (VR 133)"
ગ્રામ તક પચ નિર્માણ હેતુ જમીન કે માપી કરાને કે સંબંધી

મહાશય!

રવમુલ્ય વિષય કે સંદર્ભ મે પુચ્છાનમેલી ગ્રામ સડક
મેજના કે નિર્માણાધિકાર L133 પામવા L056 To Santanકંગ્રહ
(VR 133)" ગ્રામ તક નિર્માણ હેતુ જમીન મે માપી પુરિતે
હવે વત કે સ્થાય સંબંધી મે મેજા મે રવાં હી





વિરુવાલ મારક
16/6/2019
અંબલાધિકારી ખરબરી

लेना है:

अंशक पिंडारी घर पर

विषय:- मौजा की भूमि का भूना संख्या 151 के शासन सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की गई थी।
दस्तावे में कार्य करने हेतु विवरित भूमि की नापी के संबंध में प्रस्ताव !

उपरोक्त विषय के संबंध में नापी विवरित निम्न है।
2011 के संचालन पर गये नापी के शासन शासीन जगह संख्या 12
उपरोक्त हुए उनके उपनिषत् में नक्शा अनुसार नापी के
प्रारम्भ हुआ गया। नापी करने से स्पष्ट होता है कि सच
संख्या 1323, 1337, 1338 कि एम भूमि गरमजुआ जगह के
हमें सच नाका भाग पर शासीन के द्वारा पूर्व से निम्न
वना हुआ मंडान पत्ता जो निम्नलिखित प्रकार है।

क्रमांक	मौजा/मालिक	पट्टा नाम	संख्या-मोटा	नापी मोटा	लेना/लेना
1.	मि-डी गोप	नरेश भादव	19.25X37.16	7.15.1.10 = 0.1482570	 1323
2.	रंगपुर भादव	अरुण भादव	20X31.16	6.3.2.10 = 0.1522	 1337
3.	लागपुर भादव	पट्टी भादव	42X17.5	7.35.1.10 = 0.1693750	 1338
4.	देव भादव	भिरम भादव	30X34	10.4.1.10 = 0.4080	 1338

सभी भूविज्ञान की लाइन-मंडलियां के निवासी हैं।

26/3/2019

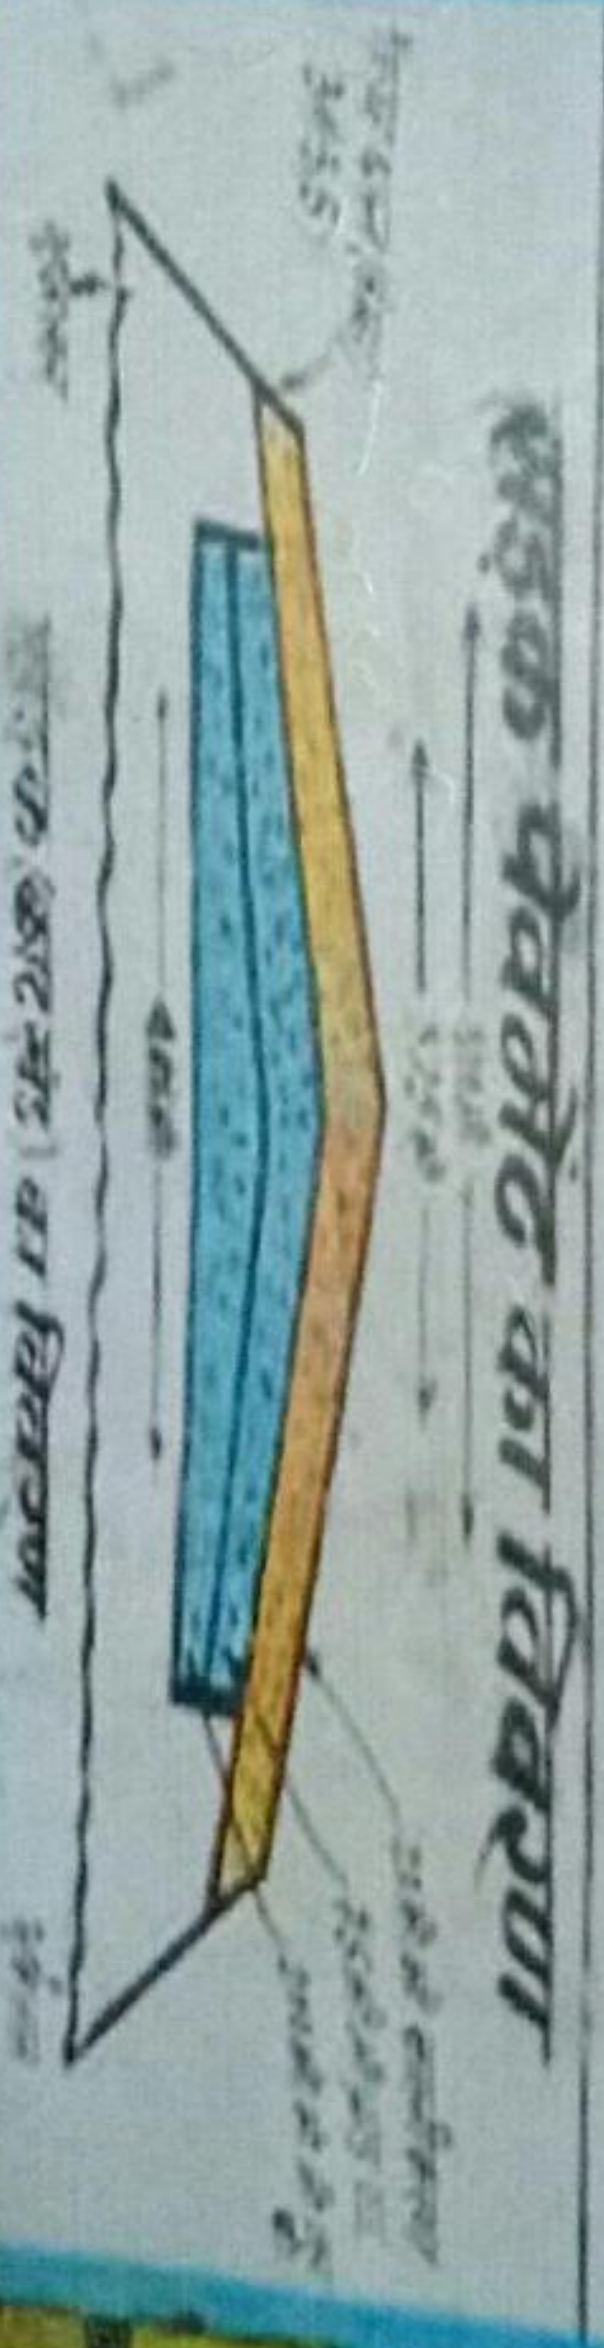








સરકારી સ્કોલરશીપ
સરકારી યોજના
 સરકારી સ્કોલરશીપ માટેના અરજીનામું
 નંબર: 1234567890
 તારીખ: 15/05/2018



1. સરકારી સ્કોલરશીપ - 3773.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 2. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 3. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 4. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 5. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 6. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 7. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 8. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 9. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)
 10. સરકારી સ્કોલરશીપ - 1113.18 લા. રૂ. (સરકારી)

જાહેરાત કરવા
 3.86 લા. રૂ.
 18/12/2018
 ના.સરકારી સ્કોલરશીપ

पक्ष का नाम - पञ्जाब लोकोत्पन्न पञ्जाब (V R 15-3)
कुल टारगट - 1000 टारगट
पुनितार 3 दीवार
कोनारो:
पुनितार 1000 टारगट - 1000

क्र.सं.	वर्ष	प्रारम्भिक	अन्तिम
		(ला.रु.प.सं. में)	(ला.रु.प.सं. में)
1.	1940-41	1000	1000
2.	1941-42	1000	1000
3.	1942-43	1000	1000
4.	1943-44	1000	1000
5.	1944-45	1000	1000
6.	1945-46	1000	1000
7.	1946-47	1000	1000
8.	1947-48	1000	1000
9.	1948-49	1000	1000
10.	1949-50	1000	1000
11.	1950-51	1000	1000
12.	1951-52	1000	1000
13.	1952-53	1000	1000
14.	1953-54	1000	1000
15.	1954-55	1000	1000
16.	1955-56	1000	1000
17.	1956-57	1000	1000
18.	1957-58	1000	1000
19.	1958-59	1000	1000
20.	1959-60	1000	1000
21.	1960-61	1000	1000
22.	1961-62	1000	1000
23.	1962-63	1000	1000
24.	1963-64	1000	1000
25.	1964-65	1000	1000
26.	1965-66	1000	1000
27.	1966-67	1000	1000
28.	1967-68	1000	1000
29.	1968-69	1000	1000
30.	1969-70	1000	1000
31.	1970-71	1000	1000
32.	1971-72	1000	1000
33.	1972-73	1000	1000
34.	1973-74	1000	1000
35.	1974-75	1000	1000
36.	1975-76	1000	1000
37.	1976-77	1000	1000
38.	1977-78	1000	1000
39.	1978-79	1000	1000
40.	1979-80	1000	1000
41.	1980-81	1000	1000
42.	1981-82	1000	1000
43.	1982-83	1000	1000
44.	1983-84	1000	1000
45.	1984-85	1000	1000
46.	1985-86	1000	1000
47.	1986-87	1000	1000
48.	1987-88	1000	1000
49.	1988-89	1000	1000
50.	1989-90	1000	1000
51.	1990-91	1000	1000
52.	1991-92	1000	1000
53.	1992-93	1000	1000
54.	1993-94	1000	1000
55.	1994-95	1000	1000
56.	1995-96	1000	1000
57.	1996-97	1000	1000
58.	1997-98	1000	1000
59.	1998-99	1000	1000
60.	1999-00	1000	1000
61.	2000-01	1000	1000
62.	2001-02	1000	1000
63.	2002-03	1000	1000
64.	2003-04	1000	1000
65.	2004-05	1000	1000
66.	2005-06	1000	1000
67.	2006-07	1000	1000
68.	2007-08	1000	1000
69.	2008-09	1000	1000
70.	2009-10	1000	1000
71.	2010-11	1000	1000
72.	2011-12	1000	1000
73.	2012-13	1000	1000
74.	2013-14	1000	1000
75.	2014-15	1000	1000
76.	2015-16	1000	1000
77.	2016-17	1000	1000
78.	2017-18	1000	1000
79.	2018-19	1000	1000
80.	2019-20	1000	1000
81.	2020-21	1000	1000
82.	2021-22	1000	1000
83.	2022-23	1000	1000
84.	2023-24	1000	1000
85.			







पंचाजमंथी ग्राम सड़क योजना

पथ कोलास-मुआग 10.56 से अंगल विओहा (VR 153) तक पथ लेआवा कार्य
पथ की लंबाई - 1.053 कि. मी.
वे.अ.सं.- BR-24R-316
5 वर्षीय पूरा बसाव की राशि - 3.032 लाख
कार्य प्रारंभ की तिथि - 19/12/2017 कार्य समाप्ति की तिथि - 18/12/2018
संवेदक का नाम - अनोरेंजल सुंदर सिंह
कार्यकारी एजेंट सी - कार्य. अधिक. ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमुख कोलास
ग्रामीण विकास अंशालय आएल सरकार द्वारा संगोषित
