

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 1897 (अनु०) / पटना, दिनांक 30.12.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना ।

विषय :- शीर्ष-पी.एम.जी.एस.वाई. योजना अन्तर्गत "CONSTRUCTION OF BRIDGE KHARBHAIYA TO SIAGRAIWAN HARIJAN TOLA (PACKAGE NO.- BR-26R-431)" निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसागिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि पी.एम.जी.एस.वाई. योजना अन्तर्गत "CONSTRUCTION OF BRIDGE KHARBHAIYA TO SIAGRAIWAN HARIJAN TOLA (PACKAGE NO.- BR-26R-431)" निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है ।

योजना का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है ।

1. स्थल विडियो ग्राफी का सी.डी.
2. दिनांक-27.11.2020 को स्थल निरीक्षण किया जा चुका है और कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पाया गया है ।
3. (i) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि- 12.12.2019 है ।
(ii) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि-11.12.2020 है ।
(iii) कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तिथि-30.03.2021 है ।
4. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है । अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है ।
5. संलग्न सी.डी. - 1 अदद ।
6. फोटोग्राफ - अदद मूल में ।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय ।

अनु:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना
54/12/2020
28/12/2020

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- KAMLAPATI, GOBARSAHI CHOWK,
NEAR RAILWAY GUMTI NO.-4,
BHIAGWANPUR, MUZAFFARPUR, BIHAR
2. Name of Work :- "CONSTRUCTION OF BRIDGE KHARBHAIYA
TO SIAGRAIWAN HARIJAN TOLA (PACKAGE
NO.- BR-26R-431"
(Head of Expenditure) PMGSY
3. Agreement No. :- 10-SBD/2019-20
4. Agreement Amount :- Rs. 2,01,38,512.00
5. Date of Commencement of Work :- 12.12.2019
6. Date of Completion stipulated in the Agreement :- 11.12.2020
7. Period of Which Extension has been given previously :- No
8. Work done % :- 60%
9. Period for which Extension now Applied for :- 30.03.2021
10. Reason for delay given by Contractor :-

① Due to COVID 19

② Due to Flood in Mahatmaien River (Falgu Distributaries)

अमर उपा

11. Recommendation by J. E. :- Extension of Time may be granted

Johph
27.11.2020.
J.E

12. Whether Programme of work approved :-

13. Whether fund available :-

14. If spill over from previous financial :-

15. Year whether included in the current :-

16. Work Programme or not :-

17. Recommendation of A. E. :- The above mentioned reasons are correct.
Hence time extension may be granted

Himmanshu
27.11.2020

18. Recommendation of Executive Engineer :-

Recommendation
28/11/20

19. Recommendation of S. E. :-

Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division, Patna

अमर उपा
Signature by Contractor

DATE & TIME:

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

LOCATION :

e-COURT RECEIPT NO :

e-COURT FEE AMOUNT :

19-OCT-2020 11:21:08

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

CIVIL COURT MUZAFFARPUR

BRCT1904J2001L345

₹ 90

(Rupees Ninety Only)

27 NOV 2020

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

Book No. 27/SI No. 170
Date.....

HS 0001645171



BRCT1904J2001L345



₹ 10

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified by the user on the website www.e-courts.gov.in or by the user on the website of the court. This receipt is valid only after verification & locking by the Court.



समक्ष,

Book No. 27/170
Date 27 NOV 2020



लेख्य प्रमाणक,

मुजफ्फरपुर।

शपथ-पत्र

मैं, कमलापति गोबरसही चौक, नियर रेलवे गुमटी नं०-04, भगवानपुर, जिला - मुजफ्फरपुर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ :-

(1) यह कि मैं शीर्ष- पी०एम०जी०एस०वाई योजना अन्तर्गत

CONSTRUCTION OF BRIDGE NH-30A SIGRIYA DALANI TOLA (KHARBHAIYA) KHARBHAIYA TO SIAGRAIWAN HARIJAN TOLA (PACKAGE NO-BR-26R-431) IN DANIAWAN BLOCK OF PATNA DISTRICT (TENDER ID-81112) UNDER PMGSY का निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा संख्या-10-SBD/2019-20 है।

(2) यह कि कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

(3) यह कि मार्च 2020 में महतमाईन नदी में भारी पानी आने के कारण कार्य में काफी विलम्ब हुआ।

(4) यह कि उपरोक्त कार्य में 25 मार्च से जून तक कार्य कोरोना के चलते कार्य में बिलम्ब हुआ है।

(5) यह कि उक्त कार्य ^{30 मार्च} 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ण कर दिया जायेगा अतएव दिनांक-30.04.2021 तक समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाए।

यह कि उपरोक्त बातें हमारी जानकारी में सही वो संत्य है।

अतः यह शपथ-पत्र है।

कमलापति

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने

मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया है।

The undersigned documents identified as the Affidavit has solemnly affirmed & declared before me that the contents of this affidavit are true & correct to the best of my knowledge.

MANOJ KUMAR KAHN
NOTARY, MUZAFFARPUR (BIHAR)

अधिवक्ता

27/11/20

KAMLAPATI

Gobarsahi Chowk, Bhagwanpur, Muzaffarpur,

Mob.-09431813687

R.W.D. Class-II, 208/08
P.W.D. Building Class-III, 359/09
P.W.D. Road Class-II, 162/08
P.U. Nigam Class-II, 420/10
Zila Parishad Class-III, 1/2009-10
W.W.D. Class-III, 98/11

Ref: _____

Date 27/1/2020

Work Programme

Name of work:- Construction of Bridge NH-30 A Sigriya- dalani Tola (Kharbhalya) Kharbhalya to Slagralwan Harlijan Tola, (Pkg/No:- BR-26R-431) Under PMGSY R.W.D works Division, Patna in Block Danyawan Distric Patna.

Agreement No.- 10/SBD/2019-2020

Lenth of Bridge-50.52 Mtr


SI No.	ITEM OF WORK	MONTH 15.01.2021	MONTH 18.02.2021	MONTH 29.02.2021	MONTH 30.03.2021
1	2 nd Spen gutter & Super Structure				
2	3 rd spen gutter & Super Structure				
3	Baring Court/Ralling /Approach slab				
4	GSB/Grade-III/Pre Mixing Bolder Pitching				

अनुमोदित

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क का नाम - NH-30 A सिविलियन दरमोही रोड (करनौली) करनौली
से सिविलियन रोडों द्वारा जुड़ा होगा।
पैकेज संख्या - BR-268-431 प्र. सं. 18/11/18
पुल की लम्बाई - 50.52 मीटर
5 साल तक रख रखाने की राशि - 3.124 लाख कार्य समाप्ति की तिथि - 11.12.18
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 12.12.2018
सर्वेक्षक का नाम - कमलेश पाली ग्रामीण विकास संगठन, भारत सरकार, ग्रामीण विकास, ग्राम प्रशासन, ग्राम कार्यकारी एजेंसी - कार्य, ग्रामीण विकास, ग्राम प्रशासन



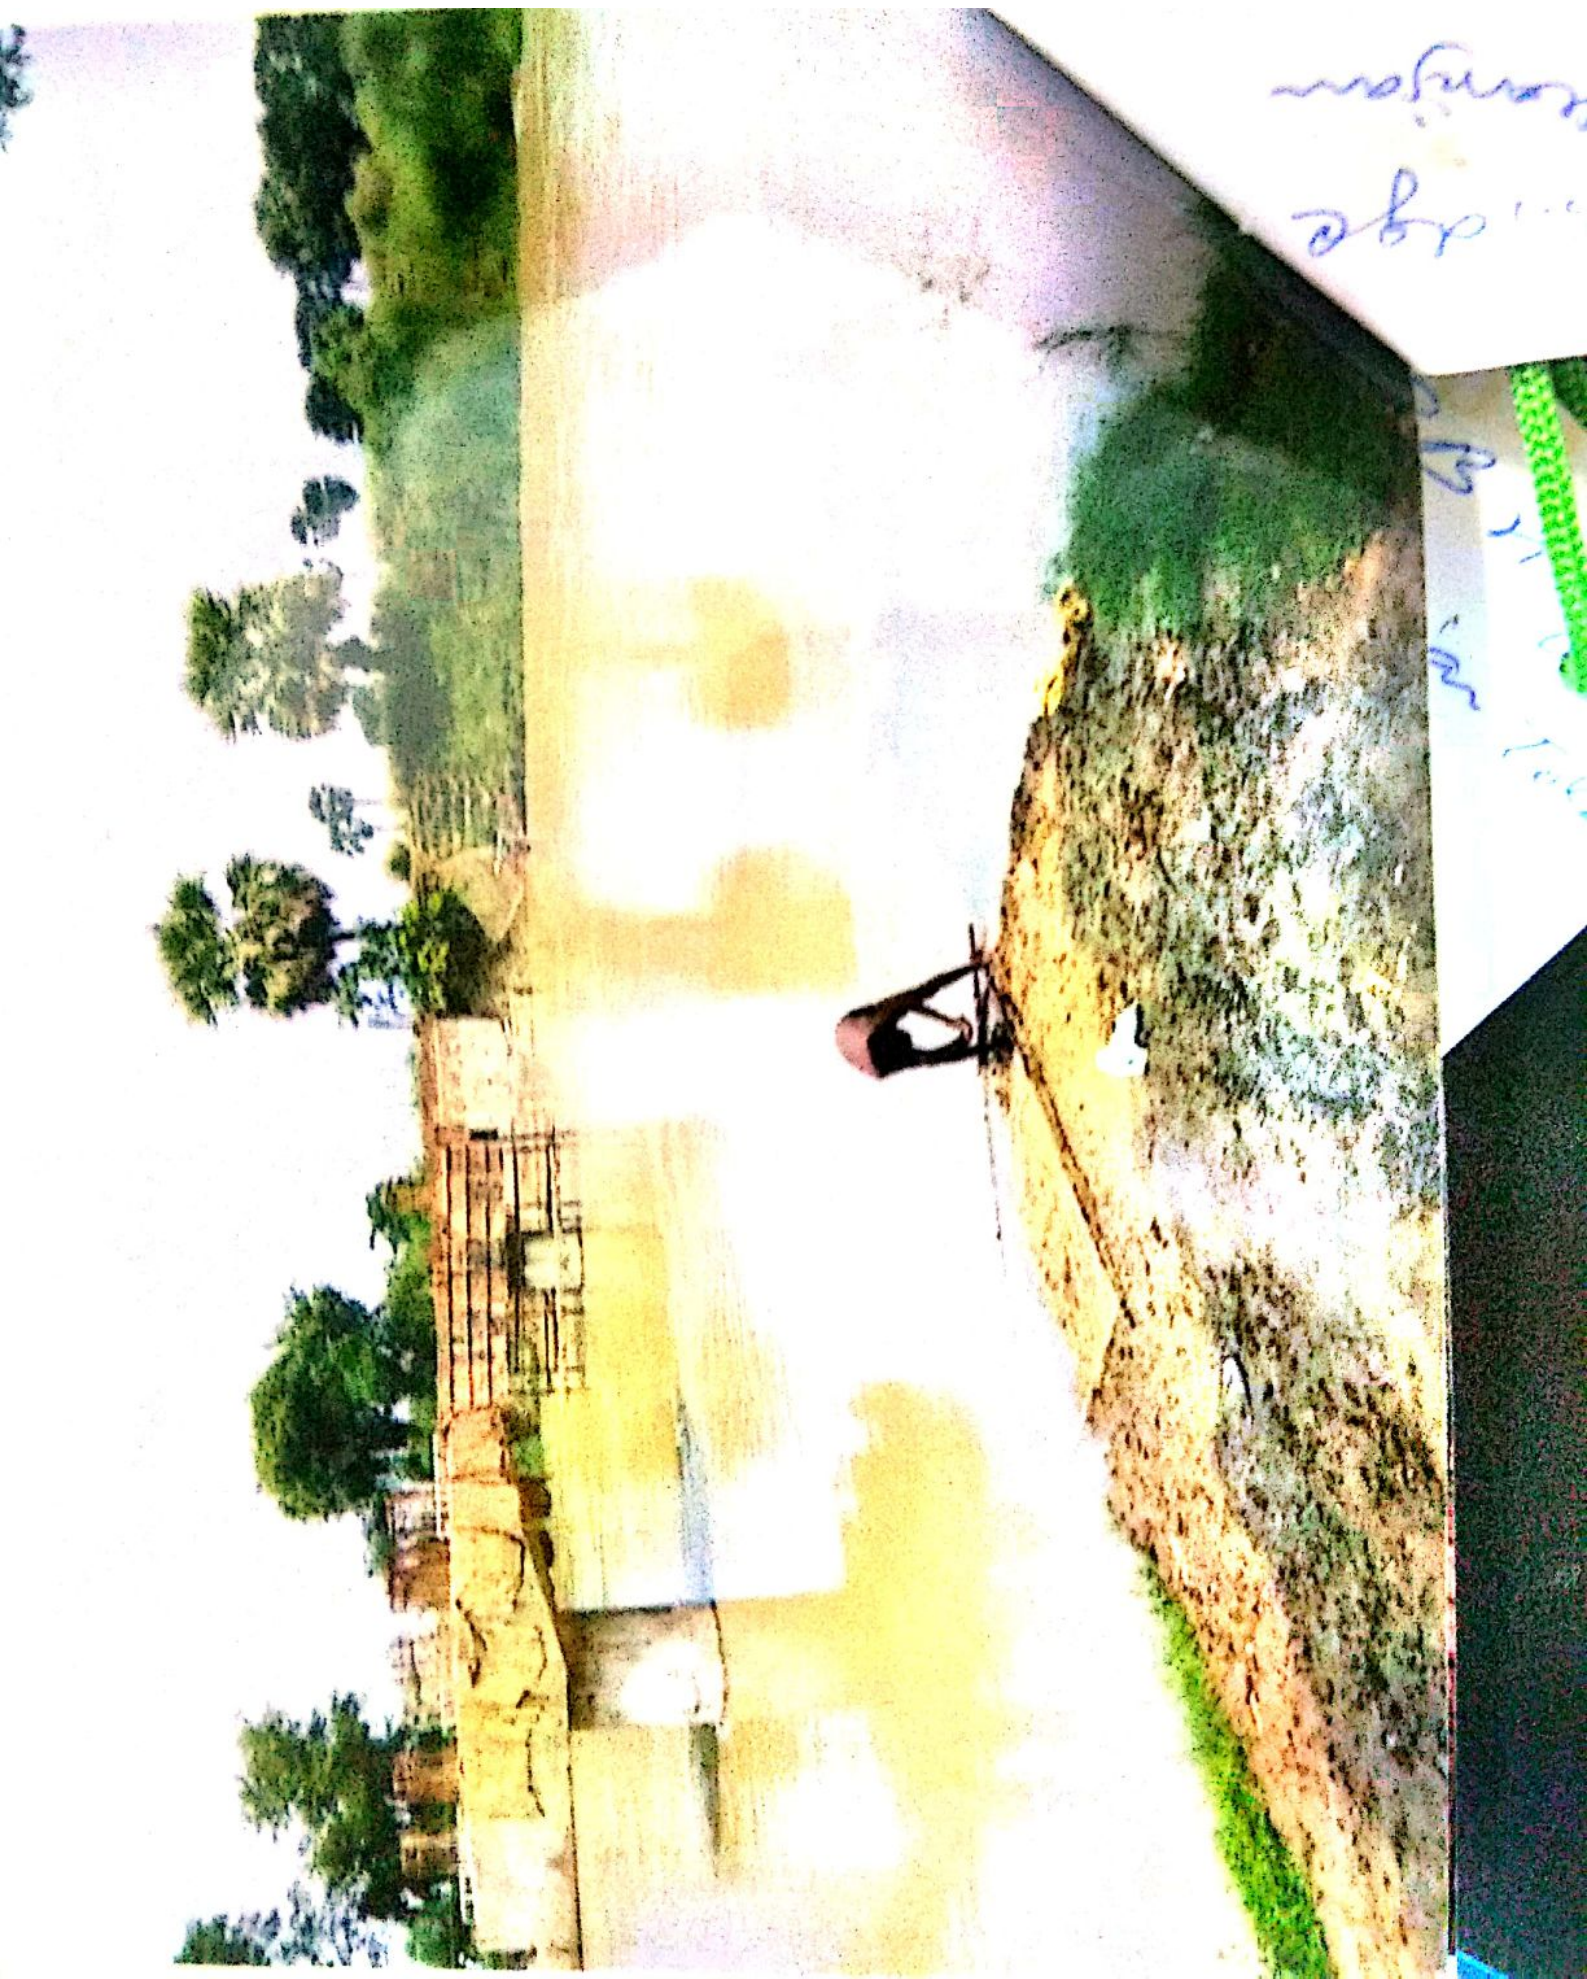





1 Name of work - construction of Bridge,
Charbhaya to Diagonal Harjan Tola
(BR-2GR-431)

Joseph Harjan
27.11.2020, 27.11.2020
J.E
