

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)
[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या39/34/17

हिलसा, दिनांक 26/1/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत लालसे भदौल पथ से टाड़पर पथ का
समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत लालसे भदौल पथ से टाड़पर पथ का समवेदक रविरंजन कुमार है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-19/2018-19 एवं एकरानामा की राशि रू०-1,06,32,566.00 (एक करोड़ छः लाख बत्तीस हजार पाँच सौ छियासठ) रू० मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-09.03.2019 एवं समाप्ति की तिथि-08.03.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-30.04.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की माँग की गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण ग्रामीणों द्वारा विवाद बताया गया है। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, हिलसा के द्वारा दिनांक-30.04.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल आवेदन को दिनांक-30.04.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ के फोटो ग्राफ एवं सी०डी० संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/1/2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Large Bhadani road to Panipat
- (2) Name of Contractor :- Ravi Ranjan Kumar
- (3) No. of agreement order :- 19 SBD / 2018-2019
- (4) Date of commencement of work :- 09.03.2019
- (5) Contractor's date of completion of work :- 08.03.2020
- (6) Date of Actual Completion :- Work in Progress
- (7) Date of hindrance :-
- (8) Provision extension date :- Nil
- (9) Further extension of time rewarded :- 30.04.2020
- (10) Reference of contractor's application if any :-
- (11) If any defects have been found the work date :- NO
- (12) Region :- public hindrance
- (13) Proportion of work date up to completion of time :-
- (14) Proportion of up date work done :-
- (15) Recommendation of J.E. :- works remained interrupted due to public hindrance
recommended. 22.09.2020 J.E.
- (16) Recommendation of A.E. :-
- (17) Final order or recommendation of the E.E.:-

Ravi Ranjan Kumar
Signature of Contractor

6.1.2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, HNSA



HS 0000530829
 COURT OF BIHAR
 e-Court Fee

DATE & TIME : 14-OCT-2020 11:16:38
 NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
 LOCATION : CIVIL COURT HILSA
 e-COURT RECEIPT NO : BRCT0427F2013M329
 e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 90
 (Rupees Ninty Only)



BRCT0427F2013M329

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Certified that Sri Ravi Ranjan Kumar
 who has been identified by Sri S.K.
 Advocate has affirmed on S.A. before me
 the facts stated in the Affidavit.

NOTARY
 Hilsa (Nalanda)
 Authorised U/S (1)(8)
 of the Notary Act

Dilip Kumar No 5257.. Date 30/12/2020
 NOTARY
 Hilsa, Nalanda (Bihar)

लेख्य प्रमाणक, हिलसा (नालन्दा)

शपथ-पत्र

मैं रविरंजन कुमार, पिता परमानंद प्रसाद, ग्राम गोखुलचक मिल्की, पोस्ट कपसियावाँ, थाना हिलसा, जिला नालन्दा, राज्य बिहार शपथ पूर्वक व्यान करता हूँ।

1. यह कि मैं MMGSY योजना के अन्तर्गत लालसी -भदौल रोड से टाड़पर तक पथ निर्माण कार्य पथ तक का निर्माण कार्य किया हूँ। जिसका एकरारनामा संख्या-580/17/18-17 है एवं एकरारनामा की राशि-1,06,32,566.00 है। कार्य प्रारंभ की तिथि 03.03.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 08.03.2020 था एवं कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि-30.04.2021 अनुमानित होगा।

यह कि उपरोक्त कार्य ग्रामीण जनता के द्वारा बाधित के कारण कार्य करने में काफी समय नष्ट हुआ है। जिसके कारण कार्य निष्पादन करने की अवधि के अन्तर्गत कार्य पूरा नहीं हो सका है।

जिसके अब यह कार्य दिनांक 30.04.2021 तक पूर्ण हो जायेगा।

यदि कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के बढ़े हुये दर का दावा पेश नहीं करूँगा।

उपर लिखी गयी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य है।



I identify the deponent
 Ravi Ranjan Kumar
 who has put his/her Signature
 c LTI in my Presence

Ravi Ranjan Kumar
 शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Seema Kumari
 Advocate Adv
 30/12/2020
 EN/NO-2420/11

पंचायत समिति
अकबरपुर पंचायत
पश्चिमी-17

उप प्रमुख
प्रखण्ड-हिलसा
नालन्दा, बिहार

किरण सिन्हा
ग्राम+पो०-अकबरपुर
हिलसा (नालन्दा)
मो०:-9431663815, 9798231491

पत्रांक.....

प्रेषक
प्रखण्ड उप-प्रमुख
हिलसा (नालन्दा)

दिनांक

प्रति
आजपासक अभियंता
ठासीन क्षेत्र इन्फ्रस्ट्रक्चर विभाग
आरे प्रखण्ड हिलसा
विषय:- आपसे अंदोलन से होकर आये
ठासीनों द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध में
अद्यावत.

निवेदन पूर्वक कहना है कि उपरोक्त
पत्र का निर्माण क्षेत्र ठासीन क्षेत्र विभाग
क्षेत्र प्रखण्ड हिलसा के अन्तर्गत चल रहा है
आम होठ पर के ठासीनों के द्वारा पत्र निर्माण
क्षेत्र में कई महीने से बाधा उत्पन्न किया
जा रहा था इस स्थिति पर जाकर समस्त
ग्राम सभी ठासीनों को बुलाकर सम्मेलन दिया
है। ठासीन लोग संतुष्ट होकर आगे कार्य
करने देने के लिए तैयार हो गये हैं। पत्र निर्माण
का कार्य करने में अब बाधा उत्पन्न नहीं है।

सुचमन सम्पति

किरण सिन्हा

उप प्रमुख
प्रखण्ड-हिलसा
(नालन्दा)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा I)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या ...3415...

हिलसा, दिनांक 20/12/19

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
हिलसा, नालन्दा।

विषय:-


MMGSY-Gen योजनान्तर्गत लालसे भदौल रोड़ से टॉडपर पथ निर्माण कार्य में
ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY-Gen योजनान्तर्गत लालसे
भदौल रोड़ से टॉडपर पथ का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा कराया जा रहा है। पथ के कुछ भाग
कुछ ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ के विवादित स्थल से अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा
की जाय ताकि पथ का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

M/S RAVI RANJAN KUMAR

GOVERNMENT CONTRACTOR

Gokhulchak Milki, Hilsa (Nalanda) 801302

Mob No.-7870812853

Pro-Ravi Ranjan Kumar

Email : raviranjankum1526@gmail.com

Ref.

Date 15/12/2019

सेता में

कर्मपात्रक अगियता
शामीन कर्म विभाग
कर्म प्रमोदय स्थिति

विषय कि शीर्ष M.M. 15.2.5. योजना अन्तर्गत आत्यन्त मेदय 15.2.5
होइपर पय निर्माण कर्म के संवेद्य में

महशय

उपयुक्त विषय के संवेद्य में कहना है कि विपक्ष पय का
निर्माण कर्म में द्वारा कराया जा रहा है। उक्त पय में कुछ शमीन
द्वारा कर्म में वाद्य उत्पन्न किया जा रहा है। जिसके कारण कर्म
वर्धित है। निवेदन है कि उक्त पय में विवाद को सुकरा
कि कृपा कि जाइ ताकि कर्म पूरे कराय जा सके

विश्वासभाजन

Ravi Ranjan Kumar

M/S RAVI RANJAN KUMAR

GOVERNMENT CONTRACTOR

Gokhulchak Milki, Hilsa (Nalanda) 801302

Mob No.-7870812853

Pro-Ravi Ranjan Kumar

Email : raviranjankum1526@gmail.com

Ref:-

Date.12/03/19

सेवा में

कार्मपालक अनुमति

प्राप्ति का कार्य विभाग

कार्म प्रमंडल हिलसा

विषय :- श्री M.M.D.SY-PAEN प्रोजेक्ट अन्तर्गत लालस विभाग के
रौड पर पक्का निर्माण कार्य के संबंध में

प्रति,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधायिका
पक्का का निर्माण कार्य मेरे द्वारा कारगर जा रहा है
उक्त पक्का में कुछ शारीरीय द्वारा कार्य में बाधा
उत्पन्न किया जा रहा है जिससे कारण कार्य बाधित है
निवेदन है कि उक्त पक्का में विवाद को मुक्त कारगरि
कृपा कि जाए ताकि कार्य पूर्ण कारगर जा सके

विश्वासगान

Ravi Ranjan Kumar

17.01.19
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

Lalbe Bhadral Road to Taxpa MBNO-1423
MMGSY (GEN) 2018-19
Schedule XLV-Form No. 134

Ravi Ranjan Kumar

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

CC - 97,17,189
MC 915377

MMGSY-GEN 1,06,32,566

DIVISION

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

प्रमाण - हेतु

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		1st A/C Bill			
Name of work - Lalase bhadaul Road					
to harper in construction					
of 4 Nos Home pipe Culvert					
and R.C.C Slab Culvert					
2 x 1.5 m Span					
Name of Agency - Ravi Ranjan Kumar					
Ward No of Gokhul					
Chak Milkhi Dist					
Talanda					
Agreement No 19 S.B.S 2018-19					

Date of work entry - 09-03-2020					
Date of completion - 08/03/2020					
Date of measurement - 26/12/2019					
Item - Earth work in excavation for					
Foundations of structures					
As per drawing and technical					
Spec clause 1104					
All dimensions in meter					
H.W					
$2 \times 3.900 \times 1.50 \times 1.500$				=	13.455 m^3
Below Pipe					
$\frac{1 \times 6.13 \times 5.97}{2} \times 1.13 \times 0.365$				=	20.495
					$\text{Total qt} = 15.59 \text{ m}^3$
					$\text{Limit qt} = 15.66 \text{ m}^3$
3 No total qt					
3×15.66				=	46.98 m^3

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
To	page	18	total	Rs	1298060

Taken					
28/01/2020					
JE					

Material State mentz

Cements 12.41 bags

✓ Sand 62.04 m³ 55.39 m³

flashed = 93.08 m³

HYDS 0.653 Tons

✓ Brick 39978

Taken
28/01/2020
JE

Lid
28/01/2020
JE

BRDA no

Allotment 79 we dt. 15.5.20 Rs 15,00,000.

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Memo of Payment, (12,98,060).					
By SD @ 5%.		64	903		
By PSD @ 3%.		38	942		
By IT @ 1%.		12	981		
By L/c @ 1%.		12	981		1,62,467
By CGST @ 1%.		12	981		
By SGST @ 1%.		12	981		
By Key		6	698		
By CRM S		11	35	593	
To		12	98	060	
Passed for Rs. 12,98,060/- Rupees Twelve					
Lakhs, ninety eight thousand six hundred only.					
12,98,060					
Executive Engineer					
Rural Works Department					
Works Division, Hilsa					
18/5/20					
Token - PNB20200507894					
date - 27/05/2020					
Executive Engineer					
Rural Works Department					
Works Division, Hilsa					

7/June
6.11.2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

हक का लाभ-लालसा भटोल रोड से टाड़पर तक पथ निर्माण
 थकी लवार्ड-1710 कि०मी० प्रा० राशि-10632566-00
 साल तक रस-रसाव की राशि- 5,15,377-00
 वर्ष प्रारंभ की तिथि- 09/03/2019
 कार्य समाप्ति की तिथि- 08/03/2020
 संवत्सक का लाभ-रवि रंजन कुमार
 पर्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-तिलसा
 बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संचालित



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला-लालनदा

सड़क का नाम-नरपत शंकर राय से अमल नंद पथ निर्माण
 कुल लंबाई-1.716 कि०मी० 4.12 मीटर जेडी संख्या-10632566-00
 प्रशिक्षी/आ. सं. 10632566


सड़क प्रोफाइल का विवरण




सड़क का (कर-सड़) विवरण

1. कर्मचारी का सिटीटी कार्य: एम.डी. (हक के लालनदा), एम.डी. (हक के लालनदा) एम.डी. (हक के लालनदा)
2. एम.डी. (हक के लालनदा): एम.डी. (हक के लालनदा) एम.डी. (हक के लालनदा)

सड़क का नाम-नरपत शंकर राय से अमल नंद पथ निर्माण
 कुल लंबाई-1.716 कि०मी० 4.12 मीटर जेडी संख्या-10632566-00
 प्रशिक्षी/आ. सं. 10632566

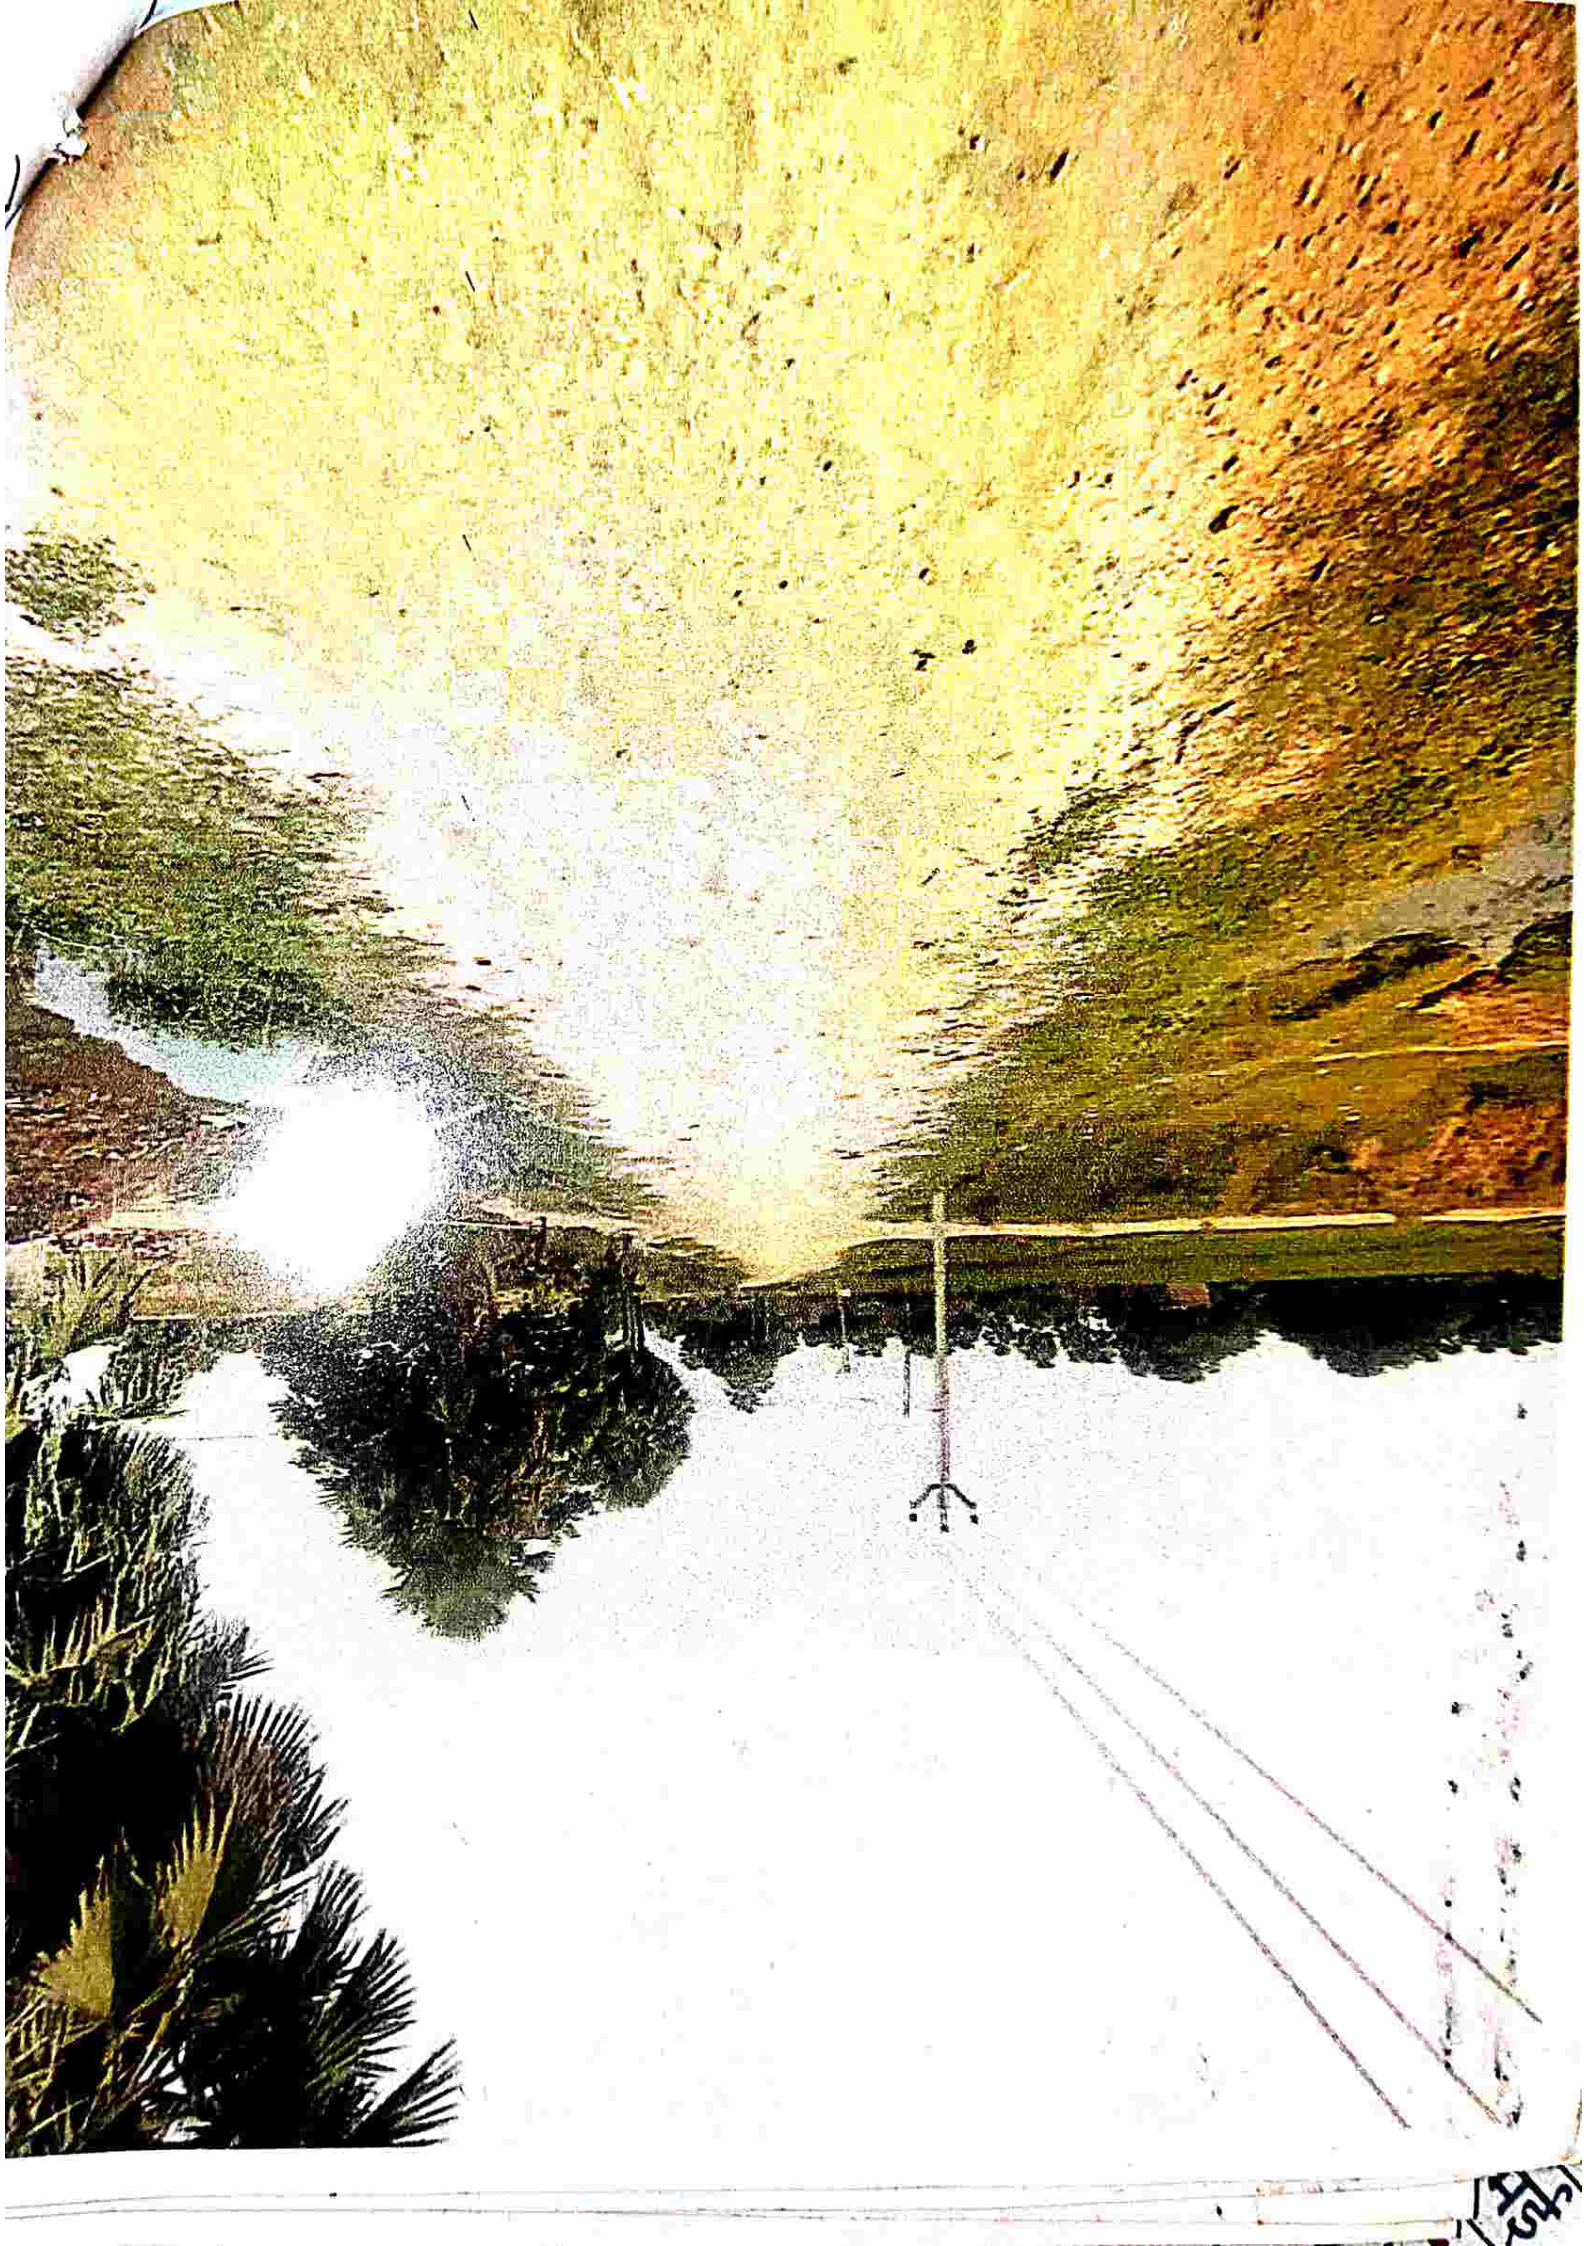

name of work

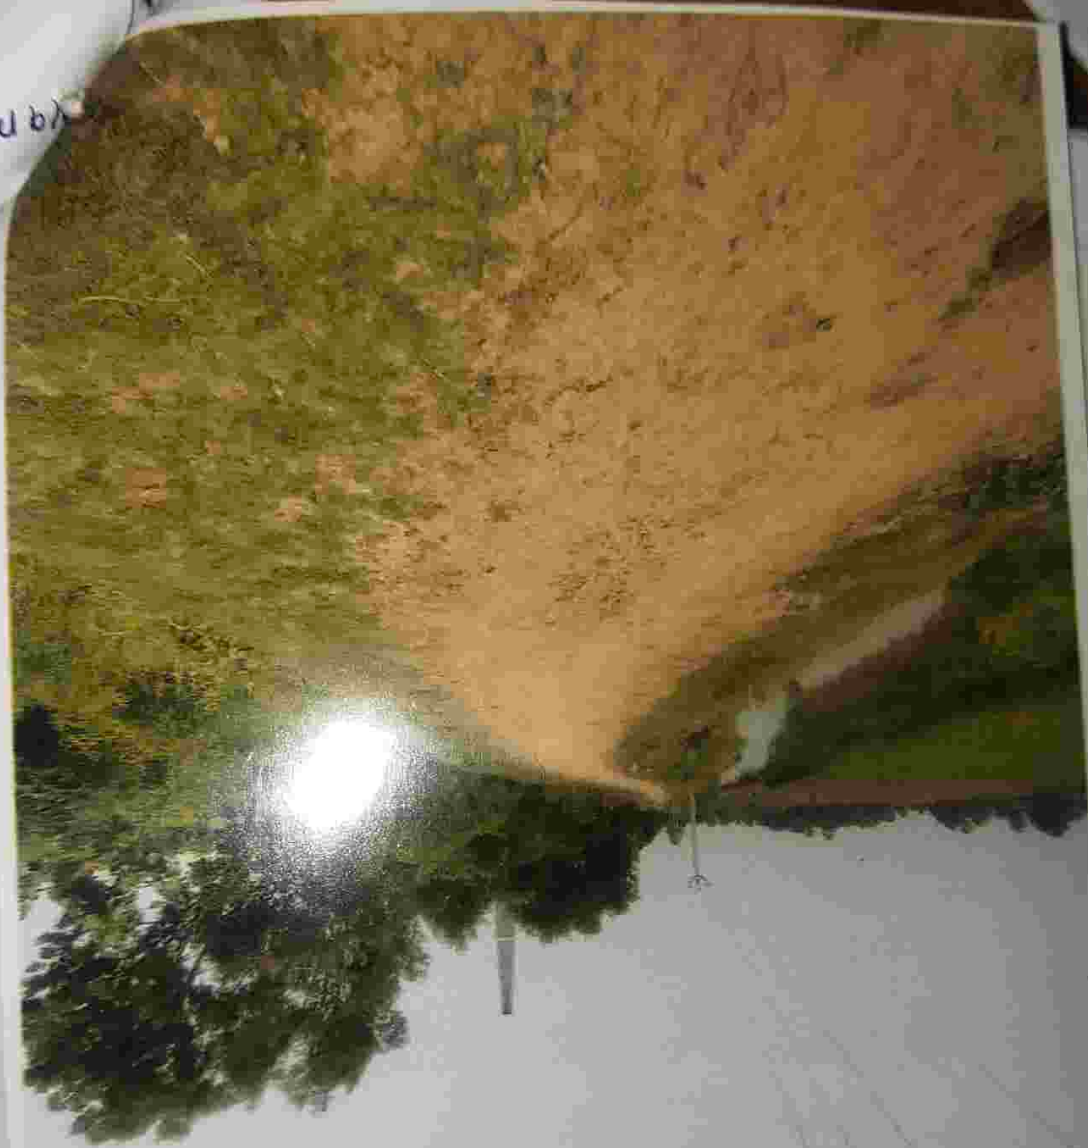

CLINICAL RPD EVALUATION
RPD WORK

वि
2018

सोमवार	1	8
मंगलवार	2	9
बुधवार	3	10
गुरुवार	4	11
शुक्रवार	5	12
शनिवार	6	13
	14	15
	16	17
	18	19
	20	21
	22	23
	24	25
	26	27
	28	29
	30	31

मई

13	20	27
14	21	28
15	22	29
16	23	30
17	24	31
18	25	
19	26	
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

सोमवार
मंगलवार
बुधवार
गुरुवार
शुक्रवार
शनिवार

सितम्बर

30	2	9
1	3	10
2	4	11
3	5	12
4	6	13
5	7	14
6	8	15
7	9	16
8	10	17
9	11	18
10	12	19
11	13	20
12	14	21
13	15	22
14	16	23
15	17	24
16	18	25
17	19	26
18	20	27
19	21	28
20	22	29
21	23	30
22	24	31
23	25	
24	26	
25	27	
26	28	
27	29	
28	30	
29	31	



