

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1
Email-eerwddarbhangal@gmail.com

पत्रांक— 6833 लहेरियासराय / दिनांक— 11/11/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा

विषय:— MMGSY(SC) योजनांतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन चनखेरिया से लक्ष्मीपुर पथ निर्माण कार्य के समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि MMGSY(SC) योजनांतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन चनखेरिया से लक्ष्मीपुर पथ का एकरारनामा संख्या-10 SBD/2017-18 है। पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-13.06.2018 को समाप्त करना था। लेकिन पथ में जमीन विवाद के कारण पथ का कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। वर्तमान में कार्य दिनांक-29.06.2019 को पूर्ण हो चुका है। उक्त पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।

निदेशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:—

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त आभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय, निगरानी जॉच नहीं है।
6. मापी पुस्त का छायाप्रति संलग्न।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।


अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1


11.01.2021

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

Email-eerwddarbhangal@gmail.com

पत्रांक- 69 लहेरियासराय / दिनांक- 11/11/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना


विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत " चनखेरिया से लक्ष्मीपुर " पथ निर्माण कार्य के समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत " चनखेरिया से लक्ष्मीपुर " पथ निर्माण कार्य के संवेदक- श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, रजि0 नं0-5200332 ग्राम-मकसुदपुर, पो0-हायाघाट, जिला-दरभंगा का नाम इस प्रमंडल अन्तर्गत न ही काली सूची में दर्ज है और न ही डिबार सूची में दर्ज है। तथा इसके लिए न ही अनुशंसा की गई है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ का समय वृद्धि स्वीकृत करने की कृपा की जाय।
सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1


11/11/2021

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

मैं **Mritunjay Kumar** मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत (MMGSY-SC) एकरारनामा सं०-10SBD/2017-18 अंतर्गत का निर्माण कार्य आवंटित की गई, जो दिनांक-14-12-2017 को प्रारम्भ कर दिनांक-13.06.2018 को समाप्त करना था। लेकिन निजी जमीन विवाद के कारण पथ कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका, वास्तविक रूप से दिनांक- 29.06.2019 को पूर्णरूपेण समाप्त किया गया है। कार्य विशिष्टि के अनुरूप है। इस पथ में कोई ए०टी०आर० लंबित नहीं है।



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1



S.L. No. 163
Date 06/7/20



समक्ष,
लेख्य प्रमाणक,
प्रभारी शपथ-पत्र, दरभंगा

शपथ-पत्र

मैं, मृत्युंजय कुमार सिंह पिता श्री गेष्ठा प्रसाद सिंह उम्र लगभग 36 वर्ष,
निवासी ग्राम मक्सुदपुर, पो-0-हायाघाट, थाना-हायाघाट, जिला-दरभंगा,
शपथपूर्वक ध्यान करता हूँ कि :-

- 1। यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ ।
- 2। यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रभंडत दरभंगा-1 में मुख्यमंत्री योजना में काम मिला इसका एकरारनामा 10 एस0बी0डी0-2017-18 किया गया ।
- 3। यह कि एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि 13-6-2018 को थी परन्तु पथ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, बातू पत्त अन्य मटेरियल के अभाव के कारण कार्य और ग्रामीणों द्वारा अवरोध के कारण समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका ।
- 4। यह कि समय पर कार्य पूरा नहीं होने के कारण विभाग द्वारा समय वृद्धि के रूप में 10 प्रतिशत की कटौती कर ली गयी है ।
- 5। यह कि कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार पथ का कार्य-29-06-2019 को पूर्ण कर लिया गया है एवं अनुरक्षण कार्य भी जारी है ।
- 6। यह कि उक्त पथों में समय वृद्धि के एवज में 10 प्रतिशत के हिसाब से भुगतान में मेरा पैसा काट लिया गया है जिसके लिये मैं राशि की वापसी हेतु उचित माध्यम के द्वारा विभाग को सभी कागजात समर्पित कर रहा हूँ ।
- 7। यह कि उक्त पथों में समय वृद्धि राशि के अलावा भविष्य में किसी भी राशि का दावा मैं नहीं करूंगा ।
- 8। यह कि उक्त कथन मेरी जानकारी में सही वो सत्य है ।



Sri/Smt. who is identified by Sri/Smt. Advocate Sole before me

Mirshanjay Singh
Kumar

M. A. Ali
of Bihar
Darbhanga 06/7/20

मृत्युंजय कुमार सिंह
I identify the deponent who has signed in my presence
Kishan Kumar
Advocate
31-10-2020

समय वृद्धि प्रपत्र

- (1) कार्य का नाम - चनरवेरिया से लक्ष्मीपुर पथ
- (2) सम्बेदक का नाम - श्री मृत्युंजय कुमार सिंह
- (3) एकरारनामा संख्या लागत राशि के साथ 10530 रु 2017-18, Rs 26,91,207.00
- (4) कार्य आरम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि - 14.12.2017
- (5) कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि - 13.06.2018
- (6) संहिता तिथि तक कार्य की राशि - Rs 25,52,271.00
- (7) कार्य पूर्ण करने का प्रतिशत - 100 %
- (8) अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका ब्योरा - -

(9) समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि - 29-06-2019

(10) समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित - जमीनी विवाद के कारण

(11) सम्बेदक का हस्ताक्षर तिथि सहित - मृत्युंजय कुमार सिंह

(12) प्रशाखा पदाधिकारी की अनुसंशा - जमीनी विवाद के कारण कार्य के विलम्ब हुआ।
10/06/19
J.E.

(13) अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुसंशा - संवेदन एवं करीब अभियंता द्वारा उपलब्धित कारण से कार्य वृद्धि में हुए विलम्ब के लिए भाषित दण्डमूल्य प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।
10/06/19
J.E.

(14) कार्यपालक अभियन्ता की अनुसंशा - जमीनी विवाद के कारण कार्य वृद्धि में हुए विलम्ब के लिए भाषित दण्डमूल्य प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।
10/06/19
J.E.

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी का ह०

सेवा में

कांचे पालक अभियंता गांधीनगर कांचे विभाग

कांचे प्रमंडल दरभंगा।

विषय:- संगम विद्युत के सम्बन्ध में

महोदय:-

उपरोक्त विषय के आलोचन में कहना है कि

मे भिन्नुजय कुमाल सिंह, गांधीनगर-मन्सुखपुरा बाना- हाथी पाट
जिला - दरभंगा का वासी हूँ आपके कांचे प्रमंडल के अन्तर्गत
न्यूनरेवेरिमा T, लक्ष्मीपुरा छोटे बाग के काम मिला जिसको
नव प्रकेंद्र काम कर दिया। दरम प्रकेंद्र काम बचा है/ जिसका
कारण गांधीनगर द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण कांचे
को स्व संगम पूरा नहीं किया जा सका है,

शेखर जी.
लक्ष्मीपुरा

आज श्री जान से अनुरोध
है कि मुझे कांचे को पूरा करने के
लिए अनिवार्य संगम दिया जाय।

आपका विश्वासुभाजन
भिन्नुजय कुमाल सिंह

गांधीनगर - मन्सुखपुरा
जिला - दरभंगा

116
06/11/19

Rural Works Department, Govt. of Bihar



Wing:-CE-3, Patna
Circle:-Darbhanga
Division:-Darbhanga-1
No Of Visit:-53

Home User,Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports GMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request Contractors Debar Class 1 Road Format Time Extension
Contractors Black List Maintenance Contractor Revoke Flood/Rain Damage Roads Poorak Core Network Crash Inspection Contractor Emergent Repair User Registration Maintenance Allotment Road / Bridge Allotment
Maintenance Observation Offline Inspection Left Habitation Survey

MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme MGSY[SCJ]

Name of Road(English) Chankheria Main Road to Laxmipur(Complete)

Fin Year All

Selection of Schemes

Technical Approval Amount: 35.47600

Length(In KM.): 0.525

DPR Submitted

Amount: 35.47600

Length(In KM.) 0.525

Administrative Sanction / Administrative Approva

Amount: 35.47600

Length(In KM.): 0.525

Technical Sanction

Amount: 0.00000

Length(In KM.) 0.525

Updated Expenditure (Maintenance Amt)

Amount: 0.000

Length(In KM.): 0.525

Amount: 29.902310

Length(In KM.) 0.525

Agreement

Main Work Amt: 26.912070

Maintenance Amt: 1.245540

Length(In KM.): 0.525

Work Started: Yes

Date: 1/1/1900 12

Expenditure(In Lakhs)

Upto 31/03/20: 25.215740

Upto Last Month: 0.000000

During This Month: 0

Total: 0.000000 Gran

Sub Base(In KM)

Upto 31/03/20: 1.050

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000 Gran

Base(In KM)

Upto 31/03/20: 0.525

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000 Gran

Surface(In KM)

Upto 31/03/20: 0.525

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000 Gran

Project Status: Complete

Actual Date of Completion: 29-Jun-2019

No of Habitations: 1

Connected Habitations: 1

Re

Environmental Social Management & Framework

Road Insurance

ESMF(IF any) Yes

ESMF Remarks y

Utility stringing(if any) Yes

Utility

Signature



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना


मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्राम सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
प्रस्तावित ग्राम सड़क परियोजनाओं की सूची
ग्राम सड़क परियोजनाओं की सूची
ग्राम सड़क परियोजनाओं की सूची

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्राम सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्राम सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्राम सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

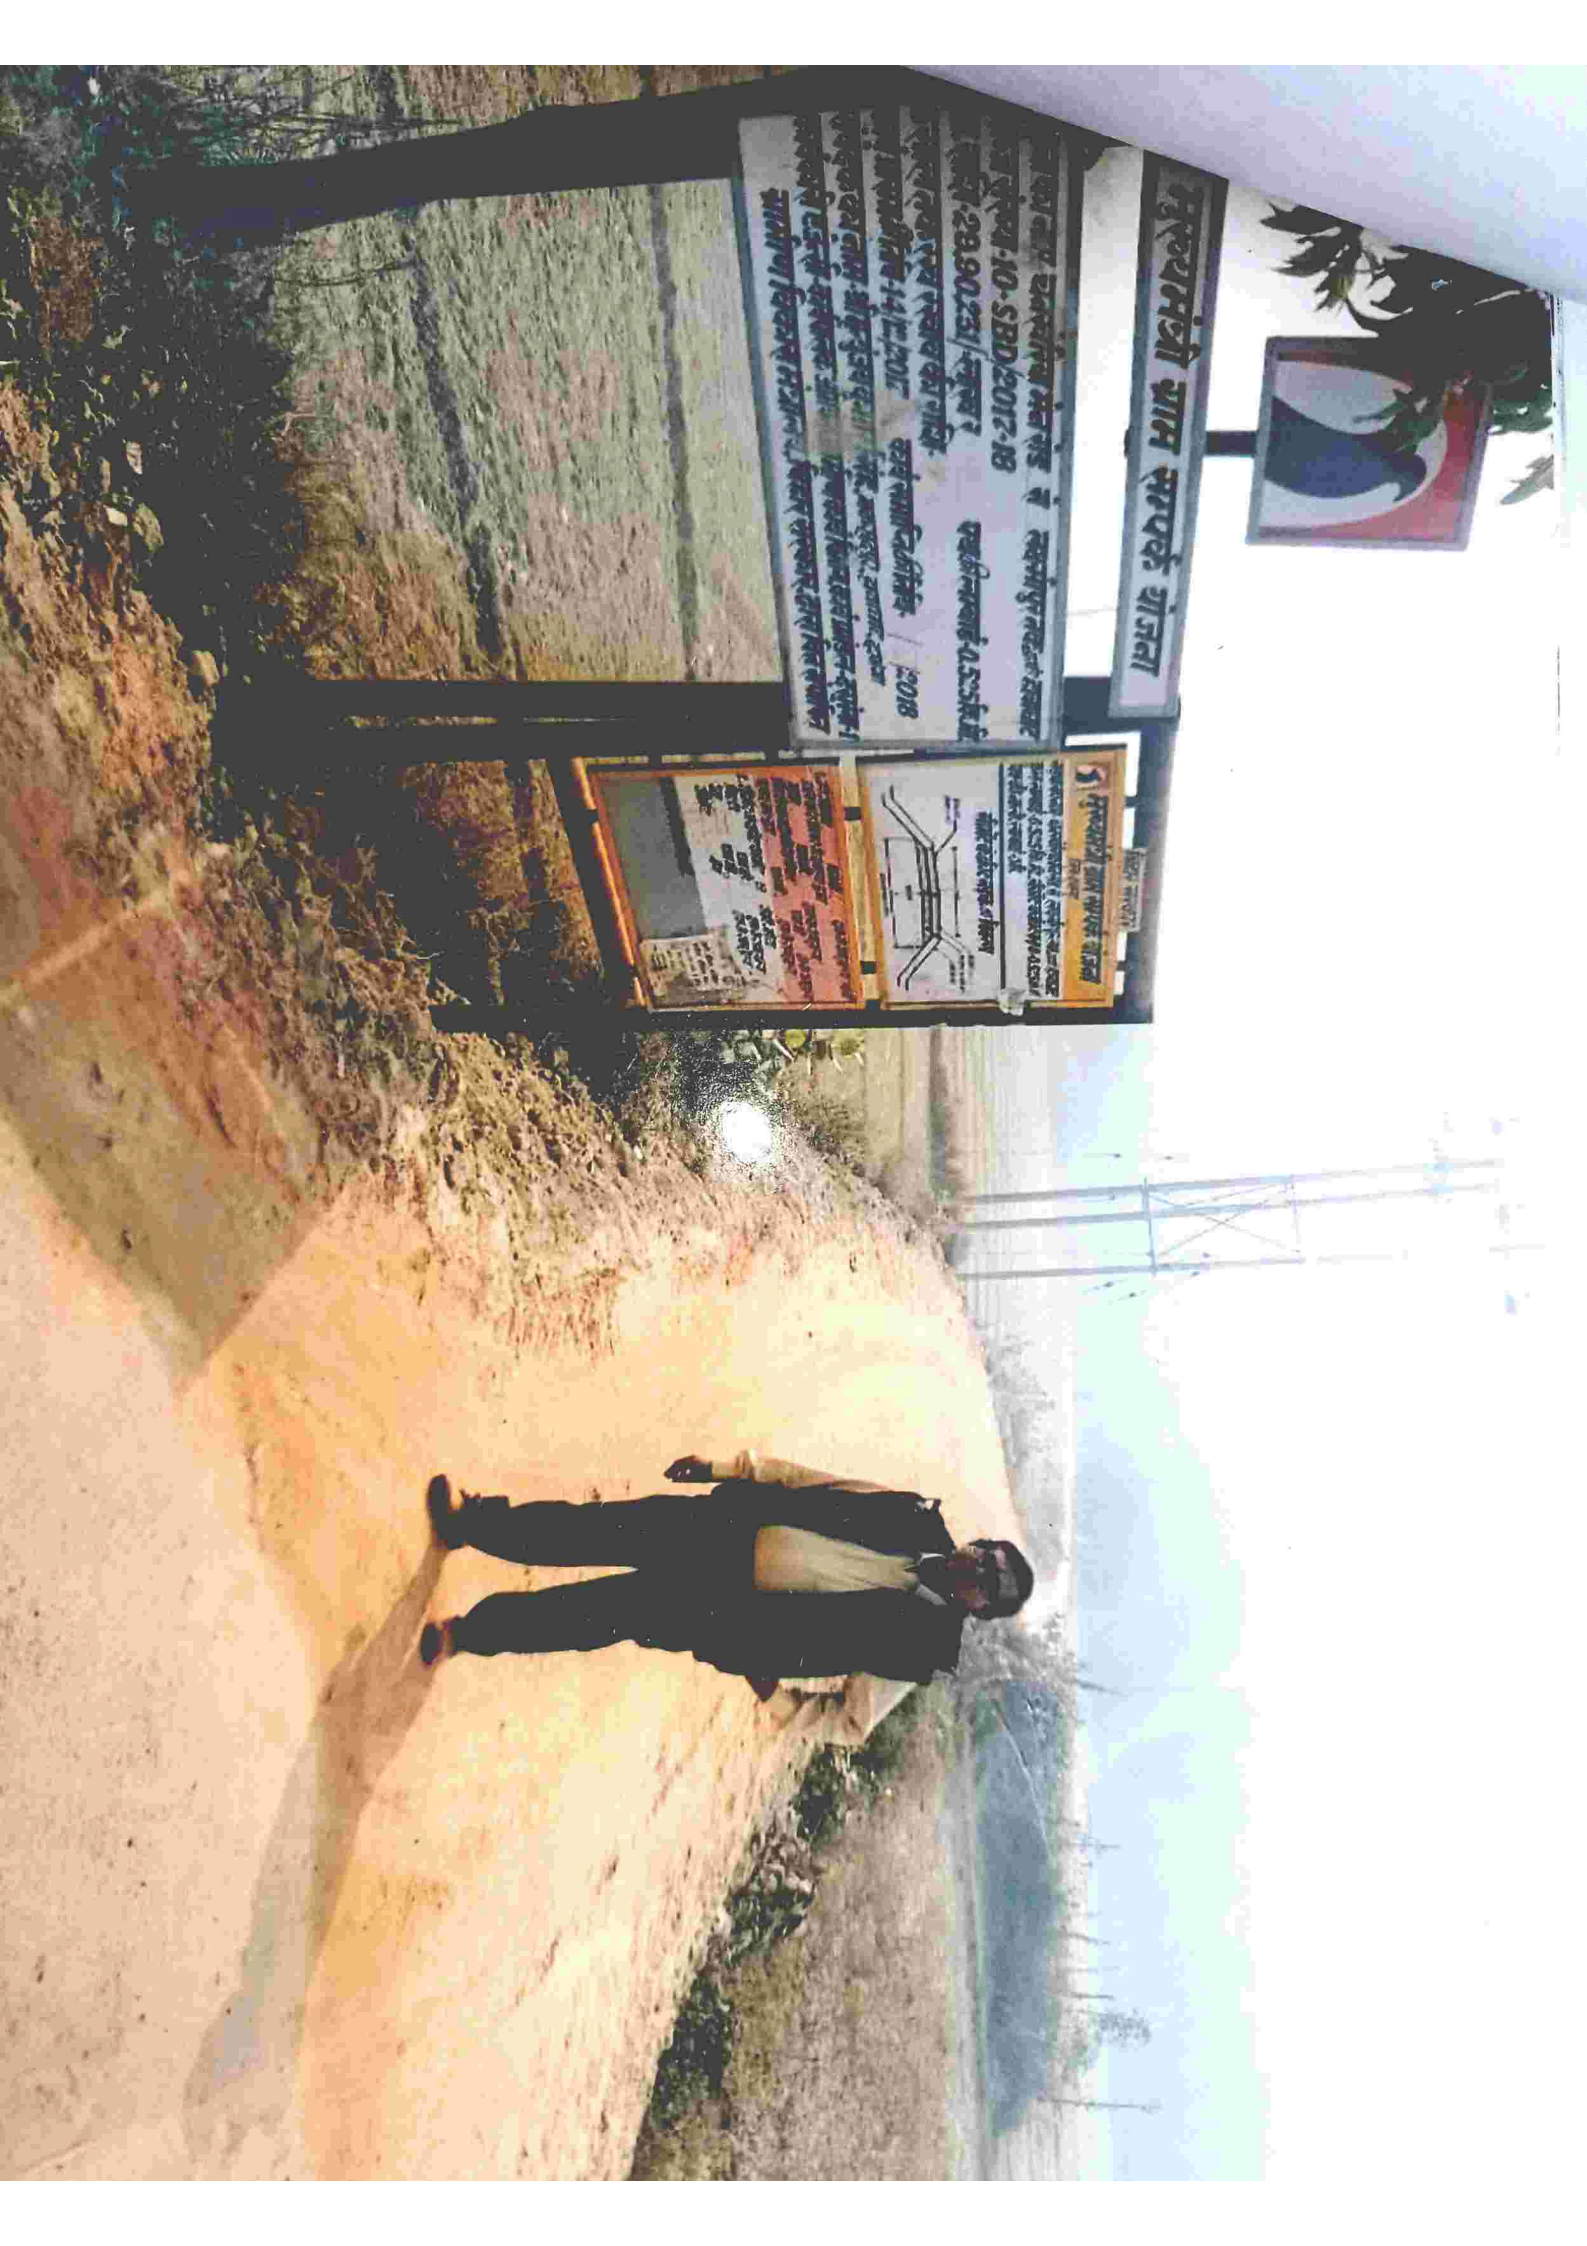



पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना

पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना



पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना

पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना
पर्यावरण और स्वास्थ्य योजना

1.2.2

2. 8. 10. 9

3. 10. 10. 10

Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement -
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>1st on A/c Bill</u>					
<u>Name of work - Construction of</u>					
<u>Road from Chankharia Main road</u>					
<u>to Laxmipura under M.M.C.S.Y. in</u>					
<u>Hayaghat Block.</u>					
<u>Agency - Sri Mridul Jay Kumar Singh</u>					
<u>Agreement No. - 10 S.B.D of 2017-18</u>					
<u>Agreement value Rs 26,91,207.00</u>					
<u>Rate of B.O.D. 10 % below</u>					
<u>Date of start - 14.12.2017</u>					
<u>Date of completion - 13.06.2018</u>					
er Division and 11)	<u>Record Measurement</u>				
	<u>P/V and fixing working</u>				
	<u>bench mark. = 1.00 Nos.</u>				
	<u>② P/V and fixing of reference</u>				
	<u>Pillars = 2.00 Nos</u>				
	<u>③ clearing and grubbing</u>				
	<u>$525.00 \times 3.50 = 1837.50 M^2$</u>				
	<u>$\approx 0.18 Hec.$</u>				
	<u>④ Excavation in soil using</u>				
	<u>hydraulic excavator cutting</u>				
<u>and loading.</u>					
<u>$2 \times 525.00 \times 0.275 \times 0.10 = 28.88$</u>					

Engineer
 Sub-Division
 Ardhanga-1)

13/10/18 qm 13/10/18

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
② P.V. Cast. of Subgrade and earthen shoulder at all Comp 3'	03	210.0 m			
③ ordinary kilometer stone ch all Comp 3'	03	2.0 m			
④ 200 meter stone ch all Comp 3'	03	3.0 m			
⑤ P.V. Reflectorised traffic sign fixing of informational sign board at all Comp 3'	03	2.0 m			
⑥ P.V. & fixing of reflectorised informational sign board at all Comp 3'	03	2.0 m			
⑦ 600 mm x 450 mm Rectangular	03	2.0 m			
Approved 18/6/19 J.E.					A.P. Singh 20/6/19 A.E.
Asstt. Engineer R.W.D. Works Sub-Division Hayaghat (Darbhanga-1)					

Particulars	Unit				or area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
① For Working bench mark Page No 10					
Q ₁ 1.0 No CR 4057-29 Each					Rs. 4057.00
② For reference pillar Page No 10					
Q ₂ 2.0 Nos CR 1868246 Each					Rs. 3737.00
③ For clearing and grubbing Page No 10					
Q ₃ 0.18 Hec CR 46880-98 Hec					Rs. 8439.00
④ For excavating work work in soil with hydraulic excavator Page No 10					
Q ₄ 28.88 m ³ CR 72141 m ³					Rs. 2083.00
⑤ For casting embankment from borrow pits cr. Page No 10 13					
Q ₅ 38.80 m ³ CR 17217 m ³					Rs. 15289.00
⑥ For casting embankment from borrow pits cr. Page No 13 Q ₆ 207.20 m ³					
CR 15349 m ³					Rs. 31803.00
⑦ For casting subgrade and earthen shoulder Q ₇ width 7.0 m Page 14 Q ₇ 210.0 m ³					
CR 173.79 m ³					Rs. 36406.00
⑧ For casting 26.5 m Q ₈ width 7.0 m Page 11					
Q ₈ 41.89 m ³ CR 273935 m ³					Rs. 114751.00
⑨ For laying spreading and compacting WBM cr. Page No 11					
Q ₉ 122.50 m ³ CR 344041 m ³					Rs. 421450.00
⑩ For casting unconfined concrete pavement cr. Page No 11 Q ₁₀ 260.18 m ³					
CR 739130 m ³					Rs. 1923068.00
					Rs. 2561173.00

Continuation
 Attached
 R.W.D. Works Sub-Division
 Mahaghat (Darbhanga-1)

11	Piv kiln under stone	Pg No 14			
03' 2.0 nos	CB 2438.07	Each	-B	4876.22	
12	Piv 200 under stone	Pg No 14			
03' 3.0 nos	CB 614.30	Each	-B	1842.22	
13	Piv and fix mg of 659 in form of 5' 9"				
03' 4.0 nos	CB 9538.22	4 Each	-B	38153.22	
14	Piv and fix mg of reflectorised sup ^{sup} board				
03' 2.0 nos	CB 1655.63	Each	-B	3311.22	
15	Piv and fix mg of reflectorised information ^{sup}				
03' 2.0 nos	CB 1718.29	Each	-B	3437.22	
16	Piv 600mm x 450mm duct engine in Piv				
03' 2.0 nos	CB 1711.88	Each	-B	3424.22	
17	Piv E/W in excavation for structure in 03'				
Pg No 10	03' 37.26	m ³			
CB 244.76	/m ²	-B	9120.22		
18	Piv 1st class bedding 03' Pg No 10				
03' 4.26 m ³	CB 448.35	/m ³	-B	1910.22	
19	Piv 1st class foundation 03' Pg No 10				
03' 10 03' 3.24	m ³				
CB 5728.06	/m ³	-B	18721.22		
20	Piv 11W 1/2 Brick masonry with c.m				
(1:4) in 03' Pg No 10					
03' 27.96	m ³	CB 5906.82	/m ³	-B	165153.22
Attached at 1/12/2019 28/11/2019 28/11/2019					B 28/11/2019

Continuation
 Asstt. Engineer
 R.W.D. Works Sub-Division
 Muzhat (Dahaga-1)

अंचल कार्यालय, हायाघाट

पत्रांक:- 546 -

दिनांक...15-12-18

प्रेषक:- अंचलाधिकारी,
हायाघाट।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल दरभंगा-1

विषय:- अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में।

महाशय,

एम0एम0जी0एस0 वाई-योजना अन्तर्गत चनखेरिया मेन रोड से लक्ष्मीपुर एम0एमजी0एस0वाई सड़क पथ में ग्रामीण द्वारा जो नीजी जमीन बताकर निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया था, उसे सरकारी अमीन द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।

विश्वासभाजन

Rawal
15-12-18
अंचलाधिकारी

क्रि. ६
15/12/18
हायाघाट

