

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक ११/३५० / बिक्रमगंज / दिनांक १७/६/२०२१

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:— MMGSY (SC) योजनान्तर्गत NH-30 to Munara via Khalsapur पथ में समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि MMGSY (SC) योजनान्तर्गत NH-30 to Munara via Khalsapur पथ का कार्य संवेदक Lalu Hitech Works Private Limited (Prop-Sudarshan Mahto Vill+ Po- Jagdishpur Bhojpur Ara को दिनांक-11.06.2020 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का समय दिनांक-10.06.2021 था परन्तु कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा प्राप्त आवेदन में ससमय Bitumen Unavailable and Lock Down का उल्लेख किया गया है। जिसके कारण कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक-30.09.2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा, संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के द्वारा अनुशंसित आवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक Lalu Hitech Works Private Limited (Prop-Sudarshan Mahto द्वारा कार्य में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

अतः उक्त कार्य का दिनांक-30.09.2021 तक समय वृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/06/2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

17/06/21

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- N.H. 30 to Munara via Khalsapur
2. Name of Agency :- Lahu Hitech Works Private Ltd.
3. Date of written order to commence the work :- 11-06-2020
4. Contract date of the Completion :- 10-06-2021
5. Extension date of the Completion :-
6. Agreement No. :- 15 / S.O.D. / 2020-21
7. Upto date Payment :- 58,26,943 Lakh
8. Agreement Value :- 1,09,10,976 Lakh.
9. Time applied for :- 30-09-2021
10. Cause of extension of time :- Unavailable Bitumen & Lock down
11. Signature of contractor with date :-
21/6/21 HEST
14.6.2021
12. Recommendation of Junior Engineer :-
R Patel Unavailable Bitumen
14/6/21
JE
13. Recommendation of Assistant Engineer :-
Prasad
14.6.2021
AE
14. Recommendation of Executive Engineer :-
G. Kulkarni
14/06/2021

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



सत्यमेव जयते

ON
HUNDRED

मेरे समक्ष शपथकर्ता श्री सुदर्शन महतो
के द्वारा शपथपत्र दायर किया गया
जिसकी पहचान श्री सुदर्शन महतो
अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

क्रम सं० १५९२ दिनांक १५/६/२१

नोटरी बदामिकारी
आरा (भोजपुर)

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



बिहार BIHAR

बिक्री की गुद्राक का मूल्य केता का अभिग्राही
लिखित वर्ग की कोटो नाम एवं पता
संख्या सहित

रयाम नन्दन सिंह

स्टाल विक्रेता ला. नं० ०४/०४
AC 614941

19 APR 2021

604

BHAGALPUR

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक,
जगदीशपुर, भोजपुर

शपथ-पत्र

मैं, सुदर्शन महतो डाइरेक्टर लालू हाईटेक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, पता- वार्ड नं० 04 नियर महिला कॉलेज जगदीशपुर, थाना+पोस्ट- जगदीशपुर, जिला- भोजपुर, बिहार शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि पथ का नाम NH 30 TO MUNARA VIA KHALSPUR पथ पैकेज संख्या- MMGSY कार्य द्वारा संपन्न किया जाना है।
3. यह कि मेरे द्वारा जमा किया गया सभी कागजात सही है।
4. यह कि कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है।
5. यह कि बढ़े हुए दर का दावा नहीं करेंगे।

सत्यापन

मैं पुनः शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका 1 से 5 तक में लिखी गयी सारी बातें सही एवं सत्य है।


मेरे समक्ष शपथकर्ता ने अपना हस्ताक्षर बनाया।

अधिवक्ता

Mr. Girish
99-6-21

शपथकर्ता

सुदर्शन महतो



Lalu Hi-Tech Works Pvt. Ltd.

Near Mahila College, Sasta Bazar, Jagdishpur (Bhojpur)-802158

Mob. 9801817758, 7004072352

GSTIN : 10AADCL5348L1ZJ

Ref.

Date 14-06-2021

श्रीवा में,

कार्यपालक इन्जिनियर
ग्रामिण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, विठ्ठलगंज।

विषय - MMRSY सन्तुलित पथ NH-30 to Munar via Khalgaपुर पथ
में 30-09-2021 तक समय वृद्धि की समझ में

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैंने छाप उपरोक्त पथ
का निर्माण कार्य आपके कार्यालय में कराया जा रहा है। उपरोक्त
पथ के निर्माण हेतु ससमय अलकाटा उपलब्ध न होने के
कारण तथा उसके lock down लगने के कारण पथ का
निर्माण कार्य संकरनामित समय पूर्ण नहीं हो सका। मैंने पथ
का कार्य 14.11.2021 तक पूर्ण हो चुका है। केवल विद्युत
कार्य बच रहा था। इस पथ को मैं 30-09-2021 तक पूर्ण
कर दूंगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि 30-09-2021 तक समय वृद्धि
प्रदान करने की कृपा करें।

Lalu Hi-Tech Works Pvt. Ltd.

सुदीप कुमार
Director

Paja
14-06-2021

viddy 12/6/2021
सुदीप कुमार
14/06/2021

Name of Work-
 Situation of Work-
 Agency by which work is executed-
 Date of Measurement-
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
Record measurement-					
Name of Road:- NH 3010					
Munara via Khalspur					
Agency - Lalit Hitech works Private Limited.					
Agreement No - 15/SB3/2020-21					
Agreement Date - 30/6/2020					
Start Date - 11/06/2020					
completion date - 10/06/2021.					

Item (1) Providing and
 and fixing of typical
 masonry informative
 sign board with Logo.
 Qty = 2.00 Nos.

Item (1) Providing and
 clearing and grub-
 bing Road Land. - - - 14ct
 $2 \times 5 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.105$
 $2 \times 5 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.105$
 $2 \times 5 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.105$
 $2 \times 5 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.105$
 $2 \times 5 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.105$
 $2 \times 5 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.105$

Continuation

53 14ct

2
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF Qty = 0.53 HCL
2x5x80.0x3.50x				10mm	0.105
2x5x30.0x3.50x				10mm	0.105
2x5x30.0x3.5x				10mm	0.105 HCL
2x3x30.0x3.5x				10mm	0.065 HCL
2x1x25.0x3.5x				10mm	0.018 HCL
					BF = 0.92 HCL
Item (3) providing and					
benchmark pillars -					
					BF = 2.0 Nos

Item (4) providing and					
Reference pillars -					
					BF = 5.0 Nos
Photo					
Station					
8/9/2020					
JE					

Record measurement -
Name of Road - NH 30 to
Munaga via Kholapur -
Agency - Lata Hitech Works
Private Limited.

Agreement No - 19/SB/2020-21

Continuation

Agreement No - 19/SB/2020-21

3
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item ① Providing and					
Embankment with					
Material obtained					
from borrow pits - -					
Ch.	Pill	Area	mean Area	Dft	Vol.
0.	1.110	-	-	-	-
50	1.152	1.183	50	56.65 ⁸	
100	0.773	0.965	50	48.225	
150	0.707	0.740	50	37.000	
200	0.619	0.663	50	33.15	
250	0.844	0.732	50	36.575	
300	0.662	0.753	50	37.650	
350	0.843	0.753	50	37.625	
400	0.539	0.671	50	34.55	
450	0.740	0.840	50	31.975	
500	0.606	0.673	50	33.65	
550	0.769	0.688	50	34.375	
600	0.865	0.817	50	40.850	
650	0.475	0.670	50	33.500	
700	0.507	0.491	50	24.550	
750	0.548	0.528	50	26.375	
800	1.032	0.790	50	39.50	
850	1.093	1.063	50	53.125	
900	0.976	1.035	50	51.725	

Continuation

3rd of A/C Bill
Abstract of cost

34

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road - NH 30 to					
Mungah via Khalspur.					
Agency - L & H Hitch Works					
Pvt Ltd.					
Agreement No - 15/330/20-21					
Start date - 14/06/2020					
Completion date - 10/6/2021					
Measurement NIL					
Item (1) Providing and					
String of typical					
primary information					

Sign board					
vide T.M.B page - (26)					
Qty = 2.00 Nos.					
@ Rs = 9310.76 / Nos = 18622.52					
Item (2) Providing and					
clearing grubbing road					
land					
vide T.M.B page - (26)					
Qty = 0.72 Hch					
@ Rs = 511.33 / Hch = 368.043					
Item (3) Providing and					
benchmark pillar					
vide T.M.B page - (26)					

Continuation




मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

योजना का नाम - NH 30 मुतरा भाया खलसापुर
पथ की लंबाई - 1.315 कि.मी. विदुमिनस पथांश - 1.115 कि.मी.
पी.सी.सी. पथांश - 0.20 कि.मी.
प्राक्कलित राशि -
5 साल तक रख-रखाव की राशि - 1.1183000 रु.
पुलिया - 5
कॉजवे -
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 11.06.2020 पुल -
संवेदक का नाम - लालु हॉइटेक वर्क्स प्रा. लि. कार्य समाप्ति की तिथि - 10.06.2021
कार्यकारी एजेन्सी - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज





REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

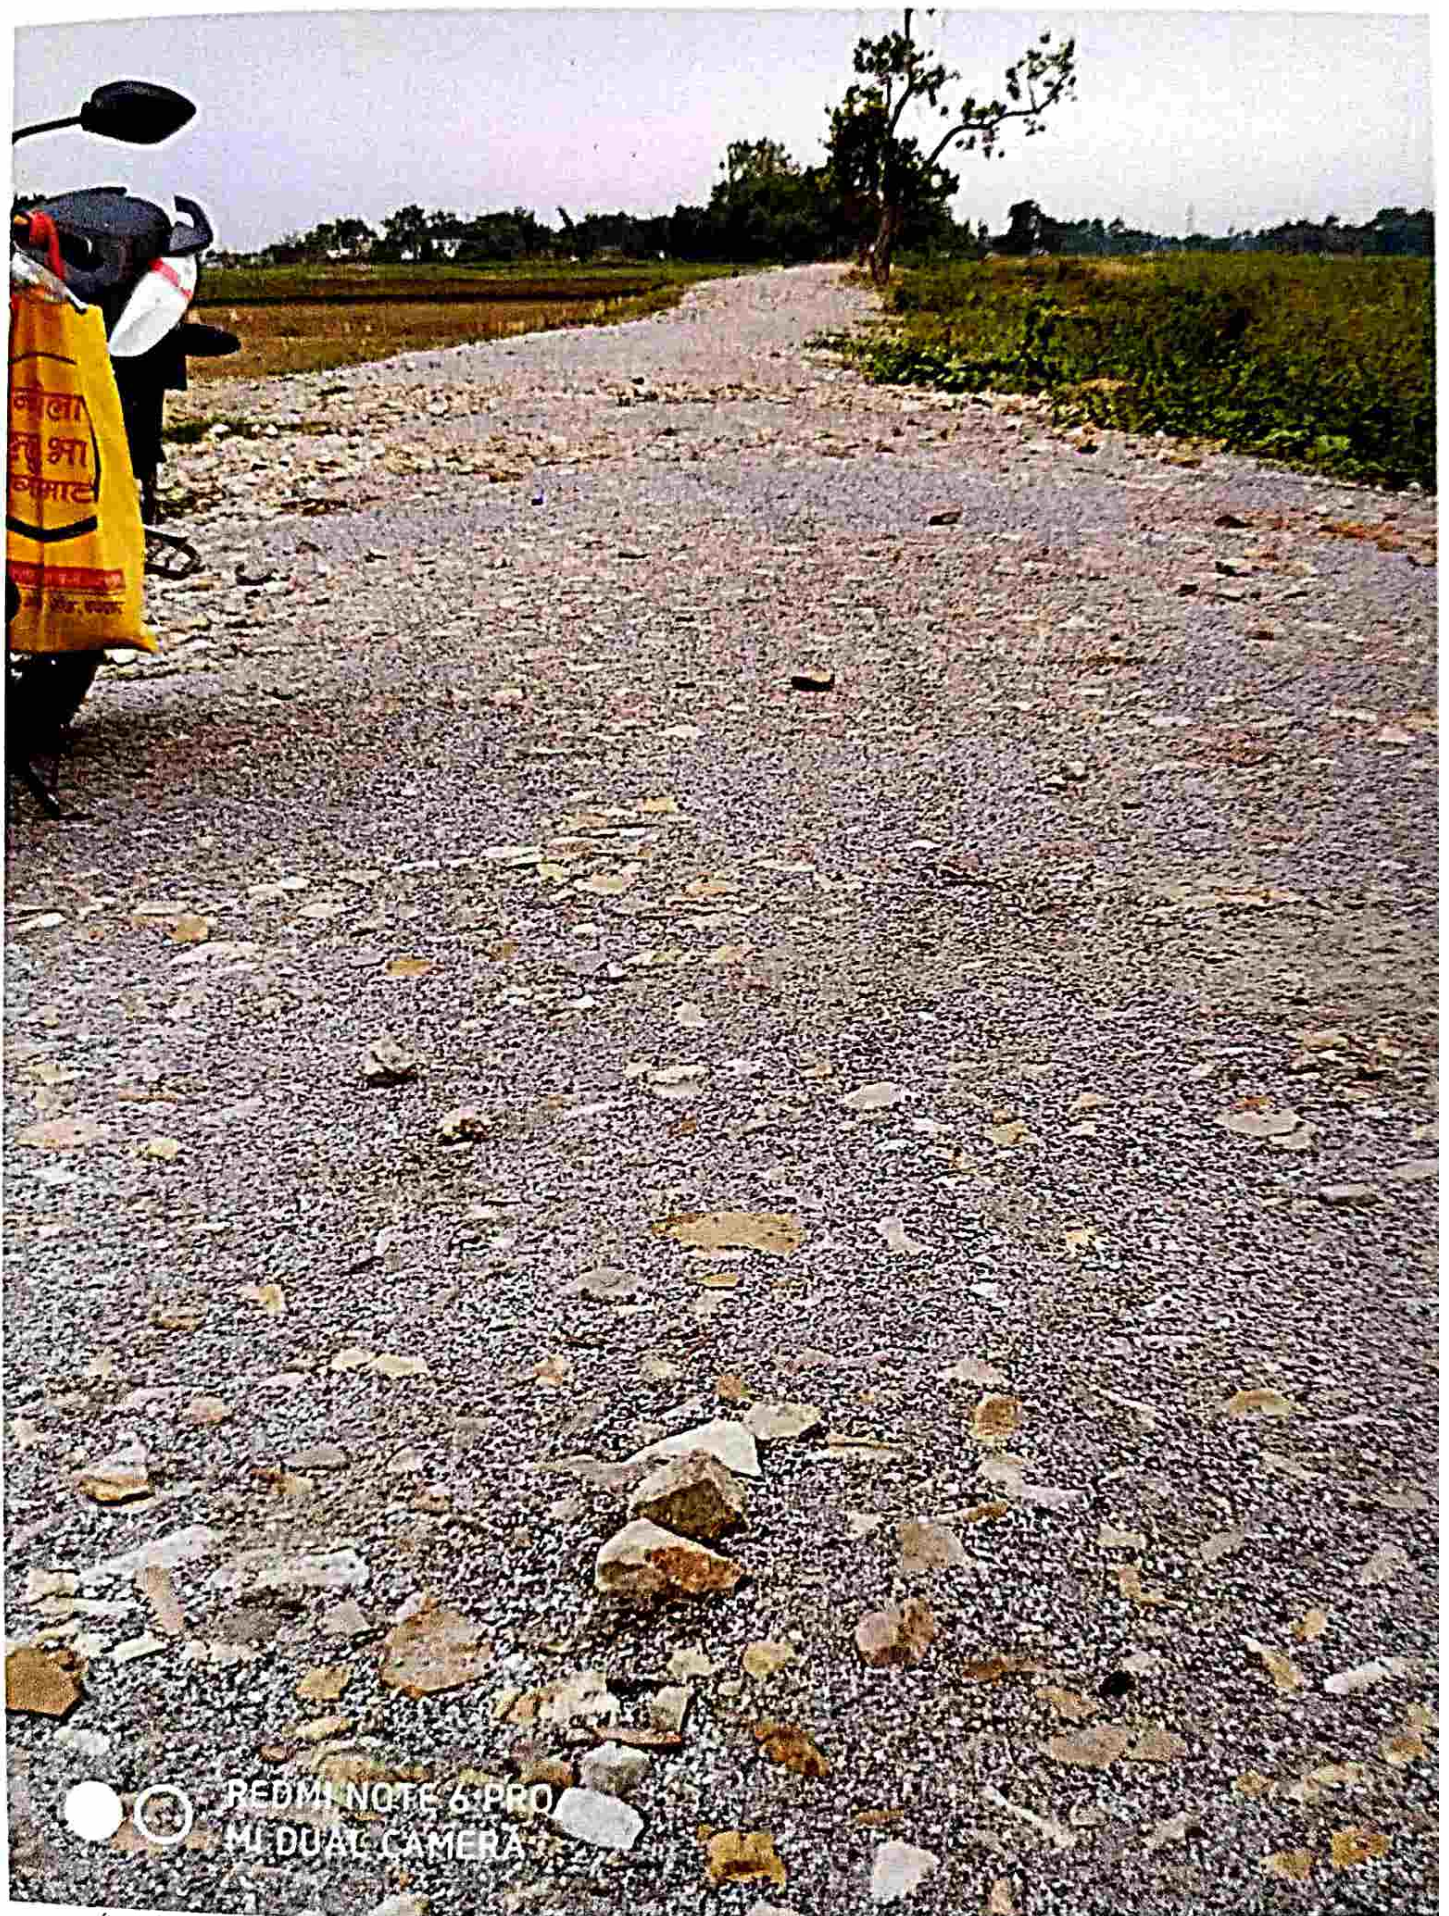

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
