

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 397 (3720) / पटना, दिनांक 09/03/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत खरभईया पथ से चमरटोली तक पथ निर्माण कार्य का समय-वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हैं पथ के स्थल में Water Logging के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है। उक्त पथ का समय-वृद्धि की स्वीकृति हेतु विहित-प्रपत्र, शपथ पत्र, पथ का फोटोग्राफ एवं सी.डी. एवं मापी पुस्त का छायाप्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना का समय-वृद्धि की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।


09/03/2021

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- DEEPAK KUMAR, SHEKHPURA, ANCHAL-PUNPUN, DIST.-PATNA
2. Name of Work :- "CONSTRUCTION & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM KHARBHYA PATH TO KHARBHYA CHAMARTOLI TAK IN BLOCK DANIYAWAN"
(Head of Expenditure) PMGSY
3. Agreement No. :- 25-SBD/2018-19
4. Agreement Amount :- Rs. 33,57,828.00
5. Date of Commecement of Work :- 12.12.2018
6. Date of Completion stipulated in the Agreement :- 11.09.2019
7. Period of Which Extension has been given previously :- No
8. Work done % :- 100 %
9. Period for which Extension now Applied for :- 14.09.2020
10. Reason for delay given by Contractor :- (1) Due to water logging
11. Recommendation by J. E. :- work delayed due to water logging, Hence Extension of Time may be granted. *[Signature]*
13.10.2020
12. Whether Programme of work approved :- Work completed J.E.
13. Whether fund available :-
14. If spill over from previous financial :-
15. Year whether included in the current :-
16. Work Programme or not :- NA
17. Recommendation of A. E. :- Work delayed due to water logging. Hence time extension may be granted. *[Signature]*
13.10.2020
AE
18. Recommendation of Executive Engineer :- *[Signature]*
13/10/20
Executive Engineer
R.W.D. (W) S Division
Patna
19. Recommendation of S. E. :-

[Signature]

Signature by Contractor

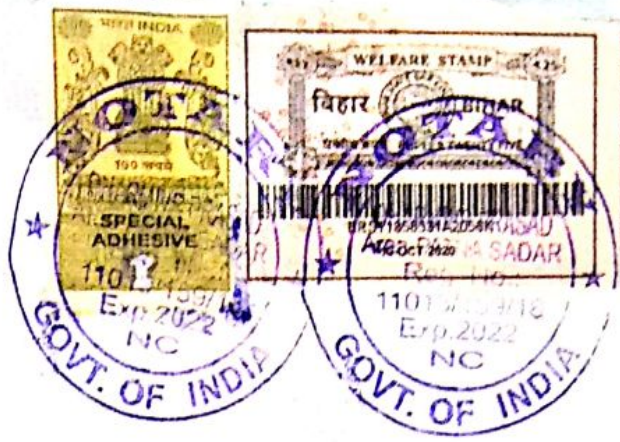

शपथ-पत्र

मैं, DEEPAK KUMAR, SHEKHPURA, ANCHAL-PUNPUN, DIST.-PATNA शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ।

1. यह कि मैं शीर्ष-एम.एम.जी.एस.वाई. योजना अन्तर्गत "CONSTRUCTION & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM KHARBHYA PATH TO KHARBHYA CHAMARTOLI TAK IN BLOCK DANIIYAWAN" का निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा संख्या-25-SBD/2018-19 है।
2. यह कि उपरोक्त कार्य में मिट्टी का कार्य करने के उपरांत ही जमीन-विवाद हो जाने के कारण कार्य विलम्ब हुआ।
3. यह कि उपरोक्त कार्य में विगत वर्ष भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ के पानी पथ पर चढ़ गया जिससे कुछ किये गये कार्य क्षतिग्रस्त हो गया एवं कार्य भी 5 से 6 माह बंद करना पड़ा जिसके कारण कार्य काफी विलम्ब हुआ।
4. यह कि उपरोक्त कार्य में कोरोना के चलते मार्च 2020 से कार्य में विलम्ब हुआ है।
5. यह कि उक्त कार्य मेरे द्वारा दिनांक-14.09.2020 को पूर्ण कर दिया गया। अतएव दिनांक-14.09.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाय।

यह कि उपरोक्त बातें हमारी जानकारी में सही वो सत्य है।

Deepak Kumar
शपथकर्ता का हस्ताक्षर



Identify the dependent's Signature
L.T.I. who has been affirmed in
My Presence
[Signature]
Advocate

शेवा में,

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रखंड, पटना।

RKP
13/10/2020

विषय:- बुधबर्दी ग्राह संपर्क योजना अर्कात (SC)
सबसे पक्ष ले रहा मेमा चक्रोली पक्ष का समग्रवृद्धि
के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के- संबंध में कहना है कि
उक्त योजना का समग्रवृद्धि कार्य पूर्ण है। स्थल पर
जल जनक के कारण कार्य कराने में विफल हुआ है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना- का समग्रवृद्धि
की स्वीकृति देने की कृपा की जाय इसके लिए
श्रीमान का आभारी- 2 हूंगा। साथ पक्ष संलग्न है जिससे मुझे
14.9.2020 तक समग्रवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा
की जाय।

विश्वासपूर्ण-
Deetank Kumar
13/10/2020
सर्वेक्षक

મનુષ્ય (સ) જાનના સ્વચ્છતા વધારવા માટે જાહેરાતો નક્કર કરવા



કો-ઈ-10/2028, 15.10.2020

15/10/20



J.E.
 13.10.2020
 J.E.

13.10.2020
 J.E.

9/13/2021
