

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 1444/3130

हरनौत,

दिनांक 12/09/2021

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- शीष-G.T.S.N.Y योजनान्तर्गत L023 To Moniyampur तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीष-G.T.S.N.Y योजनान्तर्गत L023 To Moniyampur तक पथ निर्माण कार्य संवेदक Sidhi Vinayak, Pro-Digvijay Kumar, को आवंटित है। उक्त पथ की एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-30.11.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-29.08.2019 थी। परन्तु उक्त पथ में स्थानीय विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक-20.03.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-20.03.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु०-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 06 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of Contractor:- Sidhi Vinayak Const Prop-Dignitary
2. Name of Work:- L023 To Moniyampur under GTSNY
3. Agreement No. & Date:- 81/SBD/18-19 / 30/11/2018
4. Agreement Value:- 30,22,599/-
5. Date Of Commencement:- 30/11/2018
6. Date of Completion:- 24/08/2019
7. Actual Date Of Completion:- 12/03/2021
8. Extension On Previously Given On:-
9. Extension Applied For:- 729/03/2021
10. Reason For Hindrance:- Public hindrance and water logging.
11. Percentage Of Work Done:- 100 %.
12. Recommendation BY The J.E.:- सर्वेक्षक का कथन सत्य है। समय वृद्धि की अनुशंसा की जाती है। - Lead
13. Recommendation By The S.D.O.:- As per recommendation of J.E. 3
Time Extension may be granted up to 12/03/21
14. Recommendation By The Executive Engineer:- As per recommendation of J.E.
06.05.21
15. Recommendation BY The S.E.:-
16. Final Order Of The C.E.:-

Sidhi Vinayak Const Prop

Signature of the Contractor

SI No. 155-08/9/2021

समक्ष,

नोटरी पब्लिक, पटना सदर



शपथ - पत्र

मैं, सिद्धि विनायक कन्सल्टेशन & प्रोजेक्ट दिग्विजय कुमार & पिता- श्री कृष्णा प्रसाद, पता- ग्राम + पोस्ट + थाना- नगरनौसा, जिला- नालन्दा बिहार का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यहाँ मेरे द्वारा जी०टी० एस० एन० वाई० योजना के अन्तर्गत पथ का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी एकरारनामा संख्या-81 सबीडी 2018-19 है एवं कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 30/11/2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि - 29/08/2019 है।

2. यहाँ उपरोक्त ससमय पर पुरा नहीं होने के कारण यह है कि स्थानीय लोगों के द्वारा विवाद पैदा होने पर एवं अत्याधिक वर्षा के पानी से जल जमाव के कारण तथा कोरोना महमारी के कारण बन्दी रहने के कारण विलम्ब कार्य हुआ।

3. यहाँ उपरोक्त कारणों के द्वारा मुझे काफी मानसिक एवं आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ा है जिसके फलस्वरूप कार्य करने में विलम्ब हुआ, इसलिए मुझे 20/03/2021 तक का समय वृद्धि प्रदान किया जाय।

यहाँ समय वृद्धि की स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावा किसी भी प्रकार के राशि का दावा पेश नहीं करूँगा।

यहाँ उपर लिखी गई सारी बातें मेरी जानकारी में सही व सत्य है।

Identify the deponent's Signature
L.T.I. who has/have affirmed in
My Presence

दिग्विजय कुमार
शपथकर्ता का हस्ताक्षर



02 SEP 2021



IT 00000363989

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :

02-SEP-2021 10:54:31

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREINFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT PATNA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT1919D2119M309

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 95

(Rupees Ninety Five Only)



BRCT1919D2119M318



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shclilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

श्री का मे,

कार्यपालक अधिकारी
आसीन कार्य विभाग
कार्य सचिव, हरिद्वार
जिला।

विषय: - समयसिद्ध प्रदान करने के आदेश में,

महोदय,

उपरोक्त विषय में कहना है, कि लाइन्स अंतर्गत
'LO 23 to Hanipompani' का कार्य के समाप्ति का दिनांक
29/08/2019 है, परन्तु बीपी द्वारा विवाद एवं पानी के जमाव
के कारण कार्य को पूर्ण करने में अल्पाधिक समय लग
चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि मुझे 12/03/2021
तक समयसिद्ध प्रदान करने का कष्ट करे।

दिनांक: - 25/08/2021

विश्वनाथ झा
विश्वनाथ झा
सिद्धि विनायक फाई



G T S N Y

ग्रामीण टोला सार्वर्क निष्ठय योजना

सड़क का नाम - L 0 2 3 से मोनीया मपुर तक ।

एकरावनामा संख्या - 81/5B0/2018-19
 एकरावनामा की राशि - 29,35,226/-
 पछा की लम्बाई - 0.430 कि.मी.
 5 साल तक रख-रखाव की राशि - 87,373/-
 कार्य प्रारम्भ की तिथि - 30.11.2018
 कार्य समाप्ति की तिथि - 29.08.2019
 कार्य समिति की सिधि - 29.08.2019
 सर्वेदक का नाम - मेन्सर्स सिद्धि विनायक
 सर्वेदक का नाम - मेन्सर्स सिद्धि विनायक
 कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत
 कार्यकारी एजेंसी - कार्य, अभि, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत
 कार्यकारी एजेंसी - कार्य, अभि, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत
 बिहार राज्य ग्रामीण पछा विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संचालित


बिहार सरकार



ग्रामीण टोला सार्वर्क निष्ठय योजना
 जिला - नालन्दा

सड़क का नाम - L 0 2 3 से मोनीया मपुर तक ।
 कुल लम्बाई - 0.430 कि.मी. सीमेंट कंक्रीट सड़क - 0.430 कि.मी.

सीमेंट कंक्रीट सड़क का विवरण

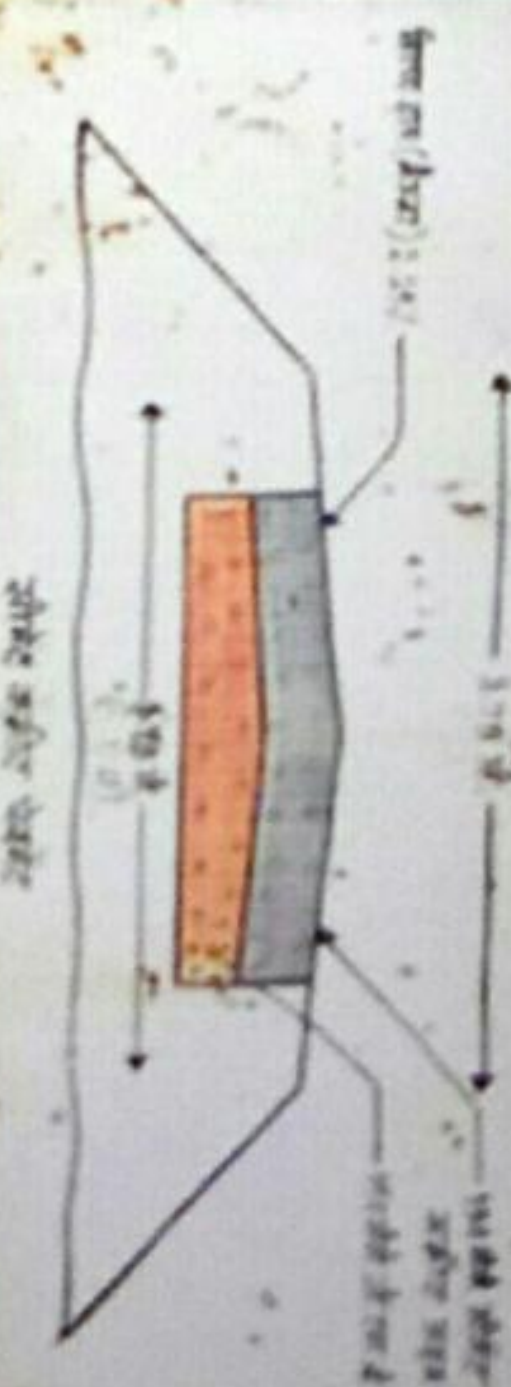

1. उप आधार पल मो.। दृक के समतुल्य

पार्श्व ड्रॉल कर रोलर से दबाया हुआ ।

मुख्य पल मो.। दृक के समतुल्य

निट्टी या नदी की रेत (जेल) पल मो.। दृक के समतुल्य

पट्टर का पूरा पल मो.। दृक के समतुल्य

2. सीमेंट कंक्रीट पंचमेंट से. मो. मोटा

निट्टी पल मो.। दृक के समतुल्य

रेल पल मो.। दृक के समतुल्य

सीमेंट केला







