

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1।

पत्रांक- 1354-मुठ

दिनांक- 6/8/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा 1।

विषय-एम0एम0जी0एस0वाई0(एस0सी0) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा के अधीन KATWTIYA TOL to HARHCHCHA GANESH SINGH KE GHAR PMGSY SARAK(MMGSY-SC) पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि एम0एम0जी0एस0वाई0(एस0सी0) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1 के अधीन एकरारनामा सं0-85SBD/2018-19 का KATWTIYA TOL to HARHCHCHA GANESH SINGH KE GHAR PMGSY SARAK(MMGSY-SC) निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-08.03.2020 को समाप्त करना था। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा निजी जमीन बताकर निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया था जिसके कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। अब वर्तमान में कार्य 31.12.2020 तक पूर्ण कर दिया जायगा। किया गया कार्य विषिष्टि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है। निदेशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. Revised Work Programe संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1।

06/08/2020

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1।

समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1. अभिकर्ता का नाम:- BHABESH KUMAR JHA, AT+PO+PS-Baheri, Dist-Darbhanga
2. कार्य का नाम:- KATWTIYA TOL to HARHCHCHA GANESH SINGH KE GHAR PMGSY SARAK(MMGSY-SC)

3. एकरारनामा संख्या:- 85SBD/2018-19

4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य:- 64.44233 लाख

5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- 76.85000 लाख

6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि:- 09.03.2019

7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:- 08.03.2020

8. वास्तविक के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि:- ~~08.03.2020~~ 31.12.2020 08.02.2021 10

9. कार्य विलम्ब का कारण:- ~~वैज्ञानिक~~ ग्रामीणों के द्वारा निजी जमीन बताकर निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया था जिसके कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका।

10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात:-%

11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें:-
नहीं।

12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी:- नहीं।

13. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति:- अपूर्ण।

14. अभिकर्ता का हस्ताक्षर:-

15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:- संवेदन द्वारा वर्णित कारणों के आधार पर समय वृद्धि दी जा सकती है।

16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :- संवेदन द्वारा वर्णित कारणों से समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ अनुमति है। 6.3.2020 75

17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-

कार्य के विभाग 11- 23/9 21/11 2019
निर्माण कार्य विभाग 11- 23/9 21/11 2019
निर्माण विभाग 11- 23/9 21/11 2019
18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:- 26.12.2020 14- 11- 21/11 2019
निर्माण विभाग 11- 23/9 21/11 2019

दिनांक 21/11/2020

भवेश कुमार झा
(सचिवक)

ग्रामोपचारिक अधिकारी

Registration No.- 2150841

आवास:

ग्राम+पोस्ट- बहेड़ी, घाना-घाना-बहेड़ी

जिला- दरभंगा

(बिहार), पिन कोड-847105

पत्रांक -

दिनांक..९.....

सेवा में:-

कार्रपासक मजिस्ट्रेट

ग्राम कार्र विभाग

कार्र प्रमण्डल - दरभंगा - 1

विषय:- समग्र वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि
PMJDSY (SC) मजिस्ट्रेट कार्रवारिज होत से
हरद्वारा जेम्स सिंह के धर PMJDSY पत्र में
आमि विवाह हो जाने के कारण कार्र सलमन
पूर्ण नहीं हो सका।

आतः श्रीमान से निवेदन है कि
उपर्युक्त पत्र में दिनांक 02/02/2021 तक
समग्र वृद्धि स्वीकृत करने की ह्वा
प्रधान की जाय।

आपका विश्वासी
भवेश कुमार झा
ग्राम बोर्ड - बहेड़ी
पिता: दरभंगा

अनुलग्नक

अन्यताप्यकारी का रिपोर्ट

अंचल कार्यालय बहेड़ी।

पत्रांक-

591

दिनांक- 07-3-2020

प्रेषक,

अंचलाधिकारी
बहेड़ी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

विषय:-

एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अंतर्गत कटवरिया टोला से हरहच्चा गणेश सिंह के घर पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क पथ को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अंतर्गत कटवरिया टोला से हरहच्चा गणेश सिंह के घर पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क पथ में ग्रामीणों द्वारा जो निजी जमीन बताकर निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया था, उसे सरकारी-अमीन द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।

विश्वासभाजन

अंचलाधिकारी

बहेड़ी।

9/3/2020



S.L. NO. 14
Date 07/08/20



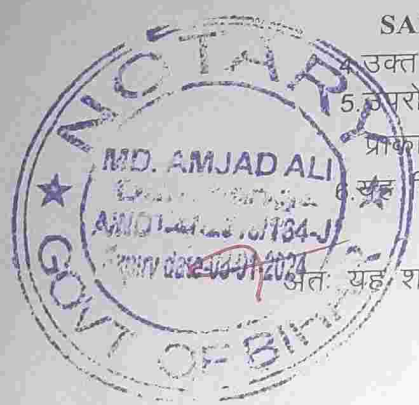
लेख्य प्रमाणक महोदय,
प्रभारी शपथ पत्र दरभंगा ।

शपथ पत्र

मैं **BHABESH KUMAR JHA, AT+PO+PS-Baheri, Dist-Darbhanga** उम्र-47 वर्ष, शपथ पूर्वक वयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं (MMGSY-SC) योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।
- 3 KATWTIYA TOL to HARHCHCHA GANESH SINGH KE GHAR PMGSY SARAK(MMGSY-SC) तक पथ निर्माण कार्य।
- 4 उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 08.08.2020 को कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
- 5 उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूंगा।
- 6 यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।



शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

Sri/Smt. **Bhabesh kumar - Me**
who is Identified by Sri/Smt. **MD. AMJAD ALI**
Advocate Solemnly affirmed and Declared before me

MD. AMJAD ALI
Notary Public, Govt. of Bihar
Darbhanga

Identify the deponent who has
Subscribed to my presence
MD. AMJAD ALI
07/08/20

Revised Work Programme

Name of Work- KATWTIYA TOLA TO HARHCHCHA GANESH SINGH KE GHAR PMGSY
SARAK (MMGSY-SC)

Name of Division-RWD WORK'S DIVISION DARBHANGA1

S.No	ITEM	Status	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
1	E/W	Complete					
2	GSB	Complete					
3	CD	Complete					
4	GRILL	Ongiong					
4	PCC						
5	Road Furnitures						

Contractor Sign

Bhaghpung me

Rural Works Department, Govt. of Bihar



PIUDarbhanga-1

Wing:-CE-3, Panna
Circle:-Darbhanga
Division:-Darbhanga
No Of Visit:-8

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports QMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request Contractors Dabtar Class 1 Road Formla Time Extension Contractors Black List

MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme MNGSY(SJ)

Fin Year All

Name of Road(English) KATWTIVA TOL to HARHCHHA GANESH SINGH KE GHAR PMGSY SARA(On-going)

DPR Submitted

Amount: 76.85000

Length(In KM): 1.270

Selection of Schemes

Amount: 76.85000

Technical Sanction

Amount: 65.00090

Length(In KM): 1.270

Technical Approval

Amount: 71.60207

Length(In KM): 1.270

Tender

Length(In KM): 1.270

Amount: 65.000900

Length(In KM): 1.270

Administrative Sanction / Administrative Approva

Amount: 76.85000

Length(In KM): 1.270

Date

Date: 1/1/1900 1:

Updated Expenditure (Maintenance Amt)

Amount: 0.000

Work Started: Yes

Length(In KM): 1.270

Maintenance Amt: 6.125180

Main Work Amt: 58.683460

Expenditure(In Lakhs)

Upto 31/03/20: 0.000000

Upto Last Month: 2.413930

During This Month: 0

Total: 2.413930

Grand Total: 2.413930

Sub Base(In KM)

Upto 31/03/20: 1.270

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000

Grand Total: 1.270

Base(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0.270

Total: 0.270

Grand Total: 0.270

Surface(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000

Grand Total: 0.000

Project Status: On-going

No of Habitations: 2

Connected Habitations: 0

Remarks: GRILL Work

Environmental Social Management & FrameWork

https://sqms.mwbihar.gov.in/Entry/RoadMonthlyProgress.aspx

06.08.2020

MM954 SC

Schedule XLV-Form No.-134

Executive Engineer
R W D Works Division
Darbhanga-1

DIVISION

Baheri

SUB-DIVISION

Cont. → Bhawesh Kumar Jha.

MEASUREMENT BOOK

3397
18-19

MD No - 3397/18-19

INDEX

Page-Conc

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

[Signature]
09/3/19
Executive Engineer
RWD Works Division
Darbhanga-1
09.3.19

INDEX

Page-Concl'd.

Agency by which
 Date of measurement
 No. and date of agreement -
 (These four lines should be repeated at the commencement
 of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Name of work:- Construction of road with maintenance work from Katwaria to Hachhik Ganesha Singh Kh. where PMGSY road (Length - 1.270 KM) under Baheri block</u>					
<u>Name of Agency:- Sri Bhawesh Kumar</u> <u>Ther, At-Baheri, Dist - DBT</u>					
<u>Estimated cost:- 71,60,207 = 10</u>					
<u>Agreement value:- 64,44,233 = 10</u>					
<u>Rate:- 10.00 % below from B.O. P</u>					

Date of start - 09.03.2019					
Date of completion - 08.03.2020					
① P/V & fixing of Benchmark pillar -					
Qty - 01.00 NOS					
② P/V & fixing of reference mark pillar -					
Qty - 5.00 NOS					
③ clearing & grubbing road land					
(By manual means) -					
42 X 30 X 3.5 = 4410.00 m ²					
01 X 10 X 3.5 = 35.00 m ²					
Total Qty = 4445.00 m ²					
= 0.445 Hect					

Sch. XL Form No. 154					
Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(4) Excavation for roadwork in Soil with hydraulic excavator					
	2	4	30	0.375	$0.10 = 9.00$
	2	1	15	0.375	$0.10 = 1.13$
	Total Qty				$= 10.13 \text{ m}^3$
(5) PN USB Grading I in box cutting & levelling course in CC Portion					
	2	4	30	0.375	$0.10 = 9.00 \text{ m}^3$
	2	1	15	0.375	$0.10 = 1.13 \text{ m}^3$
	1	1.70	1.5	0.10	$= 0.26 \text{ m}^3$
	1	11	1.20	0.10	$= 1.32 \text{ m}^3$
	1	14	1.45	0.10	$= 2.03 \text{ m}^3$
	Total Qty				$= 13.74 \text{ m}^3$

(6) PN WBM (Grade - 3) in CC Portion -					
4	30	3.75	0.075	$= 33.75 \text{ m}^3$	
1	15	3.75	0.075	$= 4.22 \text{ m}^3$	
Total Qty				$= 37.97 \text{ m}^3$	
 16.12.2019 J.E					

Record measurement of H.P. Culvert					
(1) E/W excavation for structure -					
Head wall	2	4.15	1.40	1.47	$= 17.08 \text{ m}^3$
bedding	1	5.78	1.07	0.25	$= 1.55 \text{ m}^3$
	Total Qty				$= 18.63 \text{ m}^3$

(2) Type B (first class) Bedding					
	1	5.78	1.07	0.55	$= 3.40 \text{ m}^3$
Less pipe embedment	1	5.78	0.22		$= 1.27 \text{ m}^3$
	Net Qty				$= 2.13 \text{ m}^3$

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
③ PA RCC M/S in open foundation					
					$2 \times 3.85 \times 1.40 \times 0.15 = 1.62 \text{ m}^3$
④ Head wall in Brick masonry (1:4)					
Head wall -					
	2	3.85	(1.25 + 0.40)	2.00	$= 12.71 \text{ m}^3$
Parapet -					
	2	3.85	0.60	0.40	$= 1.85 \text{ m}^3$
Less (pi x r x r) x					
	2	3.465	0.61		$= 0.570 \text{ m}^3$
					Net Qty = 14.02 m ³
⑤ PA & laying RCC Pipe NP3 (Gopindra)					
	3	2.50			$= 7.50 \text{ M}$

⑥ Plastering with cement mortar (1:4)					
Parapet side -					
	4	3.85	1.00		$= 15.40 \text{ m}^2$
Parapet face -					
	4	0.50	0.40		$= 0.80 \text{ m}^2$
Parapet top -					
	2	3.85	0.40		$= 3.08 \text{ m}^2$
Head wall sides -					
	2	3.85	0.60		$= 4.62 \text{ m}^2$
					Qty = 23.90 m ²
					Limit Qty = 18.00 m ²
Ticked & quantity checked					
initialled					
CMP					
A.E.					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1/2) P/V 3 Pines D.M. Pullan Qty - 6.00 m ³ vide TMB page No-1 @ 4170.30 / each Rs. 4170.00					
(2/3) P/V 3 Pines - 10 Pines in Pullan Qty - 5.0 m ³ vide TMB page No-1 @ 1912.46 / each Rs. 3562.00					
(3/5) Clearing & grubbing road land Qty - 0.445 Ha vide TMB page-1 @ 50148.62 / Hectare Rs. 22316.00					
(4/4) Excavation for road work - - Qty - 10.13 m ³ vide TMB page No-2 @ 77.76 / cum Rs. 787.00					

(5/2) P/W GSB Lr-I Qty - 13.74 Cum vide TMB page-2 @ 2508.25 / cum Rs. 3446.00					
(6/5) P/V WBM Lr-3 Qty - 37.97 Cum vide TMB page-2 @ 2983.85 / cum Rs. 113297.00					
(7/24) E/W in excavation for structure Qty - 18.63 Cum vide TMB page-2 @ 240.04 / cum Rs. 4471.00					
(8/25) Bedding type-B (1st class) Qty - 2.13 Cum vide TMB page-2 @ 391.79 / cum Rs. 835.00					
					Rs. 158884.00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B.F					Rs. 158884=00
9/26 P/V RCC MIS in foundation--					
Qty - 1.62 Cum					vide TMP Page-3
@ 5608.09 /Cum					Rs. 9085=00
10/27 Brick masonry work (1:4)					
Qty - 14.02 Cum					vide TMP Page-3
@ 6154.81 /Cum					Rs. 86290=00
11/28 P/V Jarring RCC Pipe No 600mm dia					
Qty - 7.50 M					vide TMP Page-3
@ 1424.27 /M					Rs. 10682=00
12/30 Plastering with CM (1:4)					
Qty - 18.00 m ²					vide TMP Page-3
@ 181.83 /m ²					Rs. 3273=00
					Rs. 268214=00
Less 10.00% below from B.O.G					Rs. 26821=00
Payable Amount					Rs. 241393=00

checked

Cmp 6/01/2020

A.E. Babori

04.01.2020
JE


Material Statement

stone metal -	59.13	m ³	
Coarse Sand -	3.30	m ³	
Screening material -	9.11	m ³	
Brick -	7010	nos	
Stone -	59.13 X 200	11826	
Coarse Sand -	3.30 X 100	330	
Screening material -	9.11 X 200	1822	
Brick -	7010 X 30	1000	210

Continuation

121 on A/C Bill
 Vt no 10 date 18.2.2020
 Method of Payment
 B. 24/1393


Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
SD 5.1.	120	70	7		
PSD 3.1.	724	2			
IT-1.1.	241	4	43	56	
GST 2.1.	482	8			
L. cess - 1.1.	241	4			
Royalty	141	88			
e Payment	19	8237			
Gross 70	241	393			
Gross B. 241,393 - Two Lac Forty one Thousand Three Hundred ninety Three only.					
 Executive Engineer R.W.D. Work Darbhanga					

Ref. No. → 20200218070273 dt. 18.2.2020

6.3.2020
 7.5

Bakeri


 6/3/2020
 A.E.



મુલ્યગતિ યામ અપેક્ષાઓના

ગણતરીના બેઠકોના નોંધણી નંબરો નીચેના પ્રમાણમાં મુજબ થશે.
નંબર-85 SBD-2019-205C) વાહન નંબર-1270 ફિક. મી.
વેગ-64+45.5 નામ-રે.
જાતક-સુવર્ણ ચંદ્રગણિત.
વિદ્યુત-મીટર-09.05.2019 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020

વિદ્યુત નોંધણી

વિદ્યુત નોંધણી નંબર-85 SBD-2019-205C) વાહન નંબર-1270 ફિક. મી.
વેગ-64+45.5 નામ-રે.
જાતક-સુવર્ણ ચંદ્રગણિત.
વિદ્યુત-મીટર-09.05.2019 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020

વિદ્યુત નોંધણી

વિદ્યુત નોંધણી નંબર-85 SBD-2019-205C) વાહન નંબર-1270 ફિક. મી.
વેગ-64+45.5 નામ-રે.
જાતક-સુવર્ણ ચંદ્રગણિત.
વિદ્યુત-મીટર-09.05.2019 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020

વિદ્યુત નોંધણી નંબર-85 SBD-2019-205C) વાહન નંબર-1270 ફિક. મી.
વેગ-64+45.5 નામ-રે.
જાતક-સુવર્ણ ચંદ્રગણિત.
વિદ્યુત-મીટર-09.05.2019 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020
વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020 વર્ષના અંતરે નોંધણી-09.05.2020







