

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़

पत्रांक1004...../बाढ़/दिनांक21/12/20.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़ ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना ।

विषय :- शीर्ष जी०टी०एस०एन०वाई० योजनान्तर्गत Khutman Khanda Kona Par To Chandania Village तक पथ निर्माण का समय-वृद्धि के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शीर्ष जी०टी०एस०एन०वाई० योजनान्तर्गत Khutman Khanda Kona Par To Chandania Village तक पथ निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है ।


योजना का बिन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है ।


- (क) स्थल का फोटोग्राफ ।
(ख) संलग्न स्थल का सी०डी० ।
- (क) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 28.12.2017 है ।
(ख) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.09.2018 है ।
- जमीन विवाद, टाल क्षेत्र में पानी आ जाने के कारण एवं लॉकडाउन में मजदुर नहीं मिलने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है । विषयांकित कार्य दिनांक 30.11.2020 तक पूर्ण करने का शपथ-पत्र दिया गया है । कार्य प्रगति पर है ।
- कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया जा रहा है । अतः दिनांक 30.11.2020 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की जाती है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़


2-12-20

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1 Name of Contractor

:- M/S Sanjeev Kumar

2 Name of Work

:- Constuction & Five year maintenance
of road from Khutuman Khanda Kone
Por to Chadni village

3 Agreement No. & Date

:- B/S 80/2017-18

4 Agreement Value

:- 1,31,41,495

5 Date of Commencement

:- 28.12.2017

6 Original Date of Completion

:- 27.09.2018

7 Extension Previously Granted or not

:- Yes

8 Extension applied for

:- 30/11/20

9 Head

:- G.T.S.N.Y

10 Percentage of Work Done

:- 90%

11 Reason of Hindrence

:- Covid-19 Lock down
जमिन विवाद के कारण water logging

12 Recommendation by J.E.

:- 10/7/2020

13 Recommendation by S.D.O.

:- 10.7.2020

14 Recommendation by the

Executive Engineer

:- T.E. may be granted. 02/12/20

15 Recommendation by S.E.

:-

16 Final Order of the C.E.

:-

Sanjeev Kumar
Signature

of the Contractor



समक्ष,

Sri/Smt. Sanjeev Kumar
 who is Identified by Shri. Alex Kumar Das
 Advocate, solemnly affirmed and
 declared before me.

लेख्य प्रमाणक,
 नोटरी पब्लिक, पटना ।

NO...5653.....


Date...26/11/2020

शपथ-पत्र

मैं, संजीव कुमार पिता-श्री विरेन्द्र आजाद, साकिन- ग्राम-सरकट्टी, पोस्ट- अटनावाँ,
 जिला-पटना, राज्य-बिहार, निम्नांकित बातों की घोषणा सत्य एवं निष्ठा से

शपथपूर्वक व्यान करता हूँ :-

- 1) यह कि मैं संजीव कुमार मेसर्स संजीव कुमार फर्म का एकमात्र प्रोपराइटर हूँ।
- 2) यह कि मेरे द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, बाढ़ अन्तर्गत जी.टी.एस. वाई. अन्तर्गत खुटमन खंधा कोना पर से चलनिया गाँव रोड एकरारनामा संख्या-23 एस.बी.डी./2017-18 कराया गया है।
- 3) यह कि विभिन्न कारणों से यह कार्य निर्धारित कार्य समय अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं हो पाया है।
- 4) यह आज के अनुसार कार्य प्रगति पर है।
- 5) यह कि नियमानुसार चालु विपत्र से समय वृद्धि के रूप में काटी गयी राशि 10 प्रतिशत की राशि का समय वृद्धि स्वीकृत कर वापस पाने के अलावा मेरे अथवा मेरे कम्पनी के द्वारा एस0बी0डी0 की अन्य कॉडिका के आलोक में अन्य कोई आर्थिक दावा नहीं किया जायेगा ।
- 6) यह कि अर्थात् समय वृद्धि के स्वीकृति के पश्चात समय वृद्धि की राशि के अलावा इससे संबंधित अन्य कोई आर्थिक दावा नहीं किया जायेगा ।
- 7) यह कार्य मेरे द्वारा 30/11/2020 तक पूर्ण कर दिया जायेगा ।
- 8) उपरोक्त तमाम बातें सही एवं सत्य है उद्धोषणा का कोई अंश गलत पाया गया तो मेरे विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह मुझे मान्य होगा ।



Sanjeev Kumar
 शपथकर्ता

I Identify the dependent who
 Signed: Alex Kumar Das

Arun Kumar

26/11/2020

01/11/20



HS 0001209379



GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :

26-NOV-2020 12:11:36

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREENIVASRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT PATNA

NAME OF LITIGANT :

SANJEEV KUMAR

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT2614K2011M297

e-COURT FEE AMOUNT :


₹ 100

(Rupees One Hundred Only)



BRCT2614K2011M297

Statutory Alert: The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shgileshamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



कार्य अंचल अधिकारी , बाढ़ (पटना)

पत्रांक - 367 दिनांक - 18-6-18

प्रेषक -

अंचल अधिकारी,
बाढ़ (पटना)

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बाढ़।

विषय = जी० टी० एस० एन० वाई० अन्तर्गत खुट्मनखंधा कोना पर से
चनैनिया पी० एम० जे० एस० वाई रोड तक पथ निर्माण के
संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मेसर्स संजीव कुमार फर्म प्रोपराईटर संजीव कुमार
ग्राम सरकट्टी , पो०- अटनावाँ थाना- बाढ़ जिला पटना के आवेदन के आलोक में
सूचित करना है कि खुट्मनखंधा कोना पर से चनैनिया पथ का निर्माण में ग्रामीण
द्वारा सरकारी अलंग में मिट्टी भरावट कर सड़क निर्माण में विरोध किया था । इस
कारण उक्त सड़क निर्माण में विलम्ब हुआ । जिसे स्थानीय मुखिया द्वारा समझौता
के माध्यम से विवाद समाप्त किया । स्थानीय मुखिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है
कि समझौता के आलोक में वर्तमान सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तथा
वर्तमान समय में ग्रामीण एवं निर्माण एजेंसी के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं
है।

सादर सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन

Attested



18/06/18
अंचल अधिकारी
बाढ़ (पटना)

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

सेना में,

कार्यपालक अभियन्ता-ग्राम-कार्य विभाग कार्य प्रमंडल

विषय:- शुद्धन-रचना से चलानिया-रोड में कार्य को रोकने के संवन्ध में।

महोदय,

सेना में मिले हुए पूर्वक कहे गए कि जो जमीन यादव दिना-रमदेव-यादव ग्राम-चलानिया-को-जमीन-रवजूशर-जमीन-संको-जिला-पटना का रहने वाला है। डीडीदार-द्वारा लड़क-कार्य को कार्य किया जा रहा उस समय छुषा यादव, राम-प्रवेश यादव और इनका लड़का श्री कान्त यादव सभी मिलकर कार्य को रोक दिया। पुल बंदि नहीं दिये और आगे रोड बनने नहीं दिये। यह जमीन मेरा है मैं उसे यादव और ग्रामीण सब मिलकर इसके लिए चिन्तित हो गये। तब हम लोग ने आपसे निर्यथ लिखा कि दोनो जमीन द्वारा नापी करवा ले-नापी के उपरान्त राम प्रवेश (जो छुषा यादव की बुलाये पड़े-हो-गये और सभी के सामने नापी हुआ। राम प्रवेश-जो छुषा यादव-ह-जमीन-गरी-जिकना-को रोड की नापी का कार्य चलाना है।

कार्य: श्री जमान से आग्रह है कि आपका वीचरी द्वारा नापी करा दिया जाये उन-देवगो द्वारा आगे रोड कार्य में बाधा नहीं हो।

आप का विश्वासी

उपेन्द्र-कुमार

पि.जि.ए. आर. 700485580

उमेश साहू

निर्मल-प्रसाद

जीतन

सुन महे


27/11/20

Attested

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

26/11/20

200 651

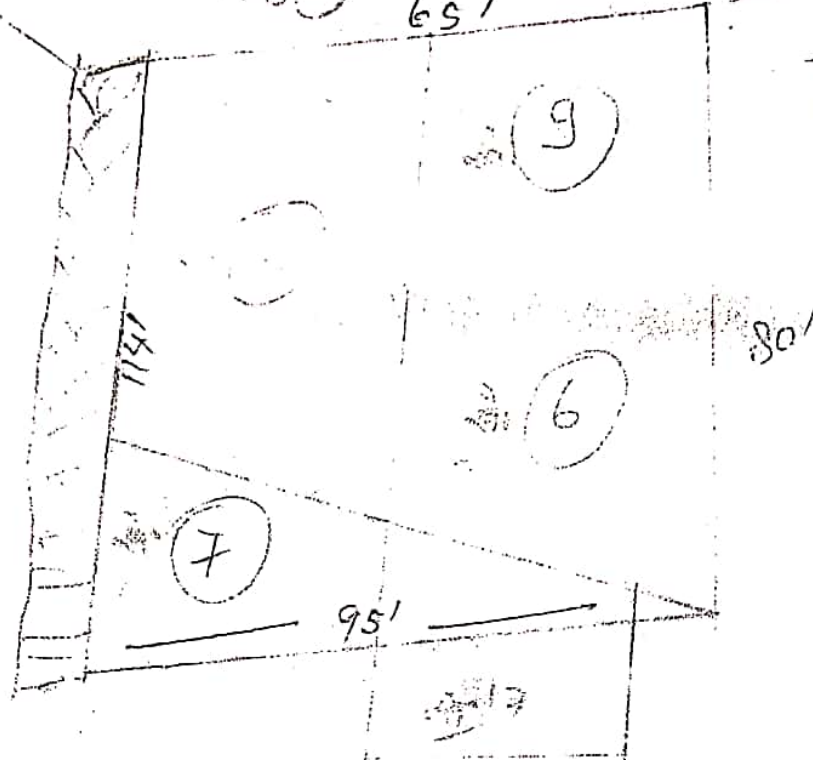

नोट:- दोनों पक्षों के एवं- एक आमीन लोग के लिए वहां
परहुत काम पड़ता है आखिरी बार वही आमीन आद
- आमीन का पैसा ईश्वर विचार। किसी पक्ष के तरफ से आमीन
आमीन पैसा ईश्वर के आमीन का नापी इस प्रकार है जो न
नगला पर वहां पर है। जमीन पाँच चक्कर 11/4 के आगे
आमीन 10/3 पर है। आमीन हजर की ओर 11/4 आमीन कोर निर

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

— १५५ —

$\frac{2509}{3104} \times \frac{1147}{1189} = \frac{2873212}{3690056}$

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

15/2/2020

የገንዘብ ምንጭ

$$\frac{99}{99} \quad \frac{211}{211}$$

173)

121

54

15

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

गांव-कस्बों से

सड़क निर्माण के दौरान पथराव

बाढ़। मंदार थाने के चनेनियां गांव में सरकारी पीसीसी सड़क निर्माण के दौरान दो गुटों के बीच विवाद होने पर जमकर पथराव हुआ, इसमें सुरेश यादव जखमी हो गया जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है। सुरेश यादव के घर के सामने पीसीसी सड़क की ढलाई की जा रही थी। इसी दौरान बिजली पोल लगाने के लिए जमीन छोड़ने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर पुलिस ने जखमी के बयान पर तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

भीतर सड़क पट्टी

ने दमक मोहन नारायण

26/11/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

पानाहचक्ष मसेदय अदोरे पाना पयना

महाराष्ट्र

स विनय निवेदन प्रेषित करना है कि मेरा नाम-सुकेश भादव-पिता-
भाषा भादव ग्राम-पनेनियौ पाना-अदोर-जिला-पयना का रहने वाला हूँ।
दिनांक २१/१०/२०२० को समय करीब-१०:०० बजे दिन में हमारे घर के बगल
से सरकारी रोड का काम चल रहा था। उसी बीच हमारे गाँव के (१) राजीव
भादव-पिता-राजेंद्र भादव ग्राम-पनेनियौ पाना-अदोर-जिला-पयना
हमारे घर के पास आ गये और बोलने लगे कि हमारा जमीन में बंदर
रोड नहीं बनेगा इतने में मैं राजीव भादव से बोले की रोड का नापी हो गया
है। उस पर बनेगा इतने में राजीव भादव ने मेरे पास गाली जलोज करके
लगे। उसी बीच (२) राजेंद्र भादव पिता-सीताराम भादव (३) क्षिण देव
पति-राजेंद्र भादव दोनों पनेनियौ पाना-अदोर-जिला-पयना अपने
अपने हाथ में लोहे का रड एवं पैना लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आ
गये और तीनों मिलकर गाली जलोज करते हुए राजीव भादव लोहे का
रड से मेरे सर पर मार दिये जिससे मेरा सर फट गया और खून
बहने लगा तब अगल बगल के लोग आने लगा तो मैं अपना घर
भागे तो उक्त सभी लोग मेरे घर में घुस कर मेरे परिवार वाल बच्चों
के साथ मारपीट करने लगे तब मेरा भाई निम्बलेदा भादव मुझे तथा बाल
बच्चों को बचाने लगाने लगे तो उक्त तीनों लाठी एवं लोहे का रड से
मारपीट करने लगे तथा घर में शरवा धरेलु हमान को क्षत्रियता करदि
तथा मारपीट की आवाज पर लोग आने लगे तो उक्त तीनों मेरे घर में
शरवा ईट पत्थर उड़ाकर चलाने लगे तब तब गाँव के कुछ लोग आ गये तो
बचाने तथा उक्त तीनों अगने लगे अगते समय जान मारने की धमकी दिये
अतः श्री मान से अनुरोध है कि उक्त तीनों पर कानूनी
कारवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी
सुकेश भादव

Attested
25/11/20
EXECUTIVE
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

7370001500

WORK PROGRAMME

Name of Work :- Khutman Khanda Kona Par To Chandania Village

	Up to July 2020	August 2021	September 2020	October 2020	November 2020
Site Clearance	100%				
E/W	100%				
CD	100%				
GSB	60%	40%		40%	
PCC			60%		100%
Road Furniture & Other Work					

Sangeet Kumar
Signature of Agency

Attested

26/11/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
26/11/20 BARH

10.11.20
26/11/20

G.T.S. No. 2
Name of Work → Const. of Road from Khutman Khanda
Kane Pore to Chandani Village
Schedule XLV Form No. 134
Agency → M/S Sanjeev Kumar

DIVISION

SUB-DIVISION

Date of Work Order - 28.12.17

Date of Completion - 27.04.18

0.05% Below

288

MEASUREMENT BOOK

Attested

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

INDEX

PAGE

પ્રાપ્તિ મિત્ર ગણે છે કે ૬૫
માર્ગ પુસ્તક મેં મલકા કાર દેવિત ૧૦૦
(૬૬૦ મેં ૧૦૦) ગુણ દેવ મિત્ર છે હિ મે
કી રામગુજ ગુમા, મહાપત્ર અમિપદ,
અમિપદ કાર્ મિત્ર, કાર્ મિત્ર ગુમા,
લેવિત કે ગાન લે મિત્ર મિત્ર ગણે છે

[Signature]
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Barh
28.12.17

INDEX

PAGE

Attested

[Signature] 02/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

2nd on Acc bill

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: - construction of P.C.C. road from Khutman Khandla Kona per to Chandani Village -					
Agreement No - 23/SB/D/2017-18					
Agency: - M/s. Sangev Kumar					
Date of starting: - 28/12/17					
Date of completion: - 22/09/2018					

measurement:

1) cement concrete pavement					
M30 - do do not complete					
505.					
5 x 30 x 3.75 x 19 = 106.875 m ³					
3 x 30 x 3.75 x 19 = 64.125 m ³					
6 x 30 x 3.75 x 19 = 128.25 m ³					
299.25 m ³					

2) Providing sign board -					
-- do do not complete					

Continuation

I H U

Chaitin
21/6/2020

Attested

02/12/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BAGU

Continuation

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
<u>material statement for Royalty</u>					
1) e/w - $\frac{1422.75}{2539.21m^3}$					
@ 23.65/m ³					$\frac{33648}{60052}$
2) (n.s.b) - 849.99m ³					
26.5m to 9.35m - 379.66m ³					
@ 595.12/m ³					225962
9.5m to 2.36m - 271.99m ³					
@ 441.94/m ³					120206
2.36m to 1.0m - 432.49m ³					
@ 146.32/m ³					63428
3) P.C.C - 655.0m ³					
Stone - 544.5m ³ @					
@ 566.04/m ³					308208
sand - 222.25m ³					
@ 146.32/m ³					39835
					$\frac{817692}{791288}$
791288					
<u>Statement of S. R. Bar</u>					
<u>Total Amount due</u>					
					791288 = 1104
					<u>79129 =</u>

Continuation

Attested

02/12/20

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Sahmudra Payable
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① E.W. 1422.75 m ² @ Rs. 25/m ²					469512
② Stone 625.11 m ² @ Rs. 150/m ²					93767=
③ Sand 277.25 m ³ @ Rs. 75/m ³					20794=
					312191=
1st & A.C. Ball.					140718=
Measure of Payment					
Work done as per mtd.					5845991=
① By S.D. 8%					467679=
② By 9.75% 3%					116920=
③ By C-Work 1%					58460=
④ By S. 5% 5.1%					58460=
⑤ By S. 5% 5.1%					58460=
⑥ By S. 5%					79129=
⑦ By Payable 5%					140718=
					312191=
					1151269=
					979826=
					4866165=
⑧ By Online Payment					4694722=
					5845991=

Passed for Rs. 5845991= (Payable)
eight lac forty five thousand nine
hundred ninety one only.
Pay by online Rs. 4694722= (Payable)
eight-
lakh thousand lac ninety four thousand.
one
hundred twenty two only.

6/9/20
Continuation
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल
अ. ४२ काठ (पश्चिम)
08/09/20

Attested

02/10/20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARRH

M/s Sanjeev Kumar

Supplier with Contractor

Vill. : Sarkatti, P.O. : Atnava, Dist. : Patna (Barh)

Date : 8/7/2020

Ref.

सेवा में
कायपालक अभिनेता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमोडल - बाढ़

विषय :- G.T.S.N.P योजना द्वारा Khuntar Khanda Kone to
Chonoyla village में अतिरिक्त समग्र प्रया. करने के संबंध में

प्रति
8.7.20

महोदय

असेवा विभाग के संबंध में कहा है कि (प्रचालित) पत्र
मे मेरे द्वारा पूर्व के भी अतिरिक्त समग्र प्रया. में
जाए भी जिसमें आपके द्वारा 30.7.2020 तक मुझे अतिरिक्त
समग्र कार्य पूर्ण करने हेतु विभा. तथा प्र. परनु. इस समग्र में
भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका एवं जमीन विवाद का प्रस्ताव
वह मना है।

आत. श्रीमान से निवेदन है कि
मुझे अतिरिक्त समग्र देने के हवा में मात्र मात्र
कार्य का पूर्ण कर सका।

सहायक
समग्र प्रया.

8/7/20

आपका प्रया.

Sanjeev Kumar

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पटना, दिनांक:-

पत्रांक:- 11/प्र0-04-101/2020

प्रेषक,
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,
अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय-शीर्ष GTSNY योजनान्तर्गत Khutman Khanda Kona Par to Chandania Village तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य के समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग-आपका पत्रांक 1367 अनु0 दिनांक 20.08.2020 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ का पत्रांक 473 अनु0 दिनांक 18.08.2020

महाराज,

प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित GTSNY योजनान्तर्गत Khutman Khanda Kona Par to Chandania Village तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य जिसकी एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 28.12.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.09.2018 निर्धारित थी। लेकिन संवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कार्य को दिनांक-30.07.2020 को पूर्ण कर लिया जायेगा। अधीक्षक अभियंता, कार्य अंचल, पटना के द्वारा अपने पत्रांक-1067 अनु0 दिनांक 28.08.2020 के माध्यम से समयवृद्धि प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। संवेदक द्वारा कार्य को समय पर पूरा नहीं करने के निम्नलिखित कारण क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा बतलाते हुए अतिरिक्त समय देने की अनुशंसा की गई है:-

(i) जमीन विवाद।

आपके एवं कार्यपालक अभियंता, के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समय वृद्धि, कार्य समाप्ति की तिथि 30.07.2020 तक वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, बाढ़ की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी की वे सुनिश्चित करें की कार्य मानक एवं एकरारनामा के अनुसार हुआ है।

1. अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें की मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल द्वारा कोई भी प्रतिकूल जाँच प्रतिवेदन अंकित नहीं की गई है एवं अगर की गई है तो उसका अनुपालन कर लिया गया है इस योजना से संबंधित कोई भी ए0टी0आर0 (ATR) लंबित नहीं है।
2. उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ अपना प्रतिवेदन आपको समर्पित करेंगे एवं आप उनके स्थल निरीक्षण के परचात् पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त अघोहस्ताक्षरी को भेजेगें। अतः इसका अनुश्रवण व्यक्तिगत रूप से करें।
3. समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि भविष्य में किसी भी मद का प्राइस इस्कालेशन (Price Escalation) एवं अन्य कोई भी अतिरिक्त दावा संवेदक का मान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

/पटना, दिनांक-31/7/20

झापांक- 3092

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु पेषित। कृपया वर्णित निर्देशों पर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के परचात् अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाई करेंगे। किसी भी कमी के लिए आप भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।



Shobhi

10/11/2020

022

27000 सि-ए


10.7.20

015 310

02/12/20

EXECUTIVE ENGINEER
RAIL WORKS DIVISION

BARH

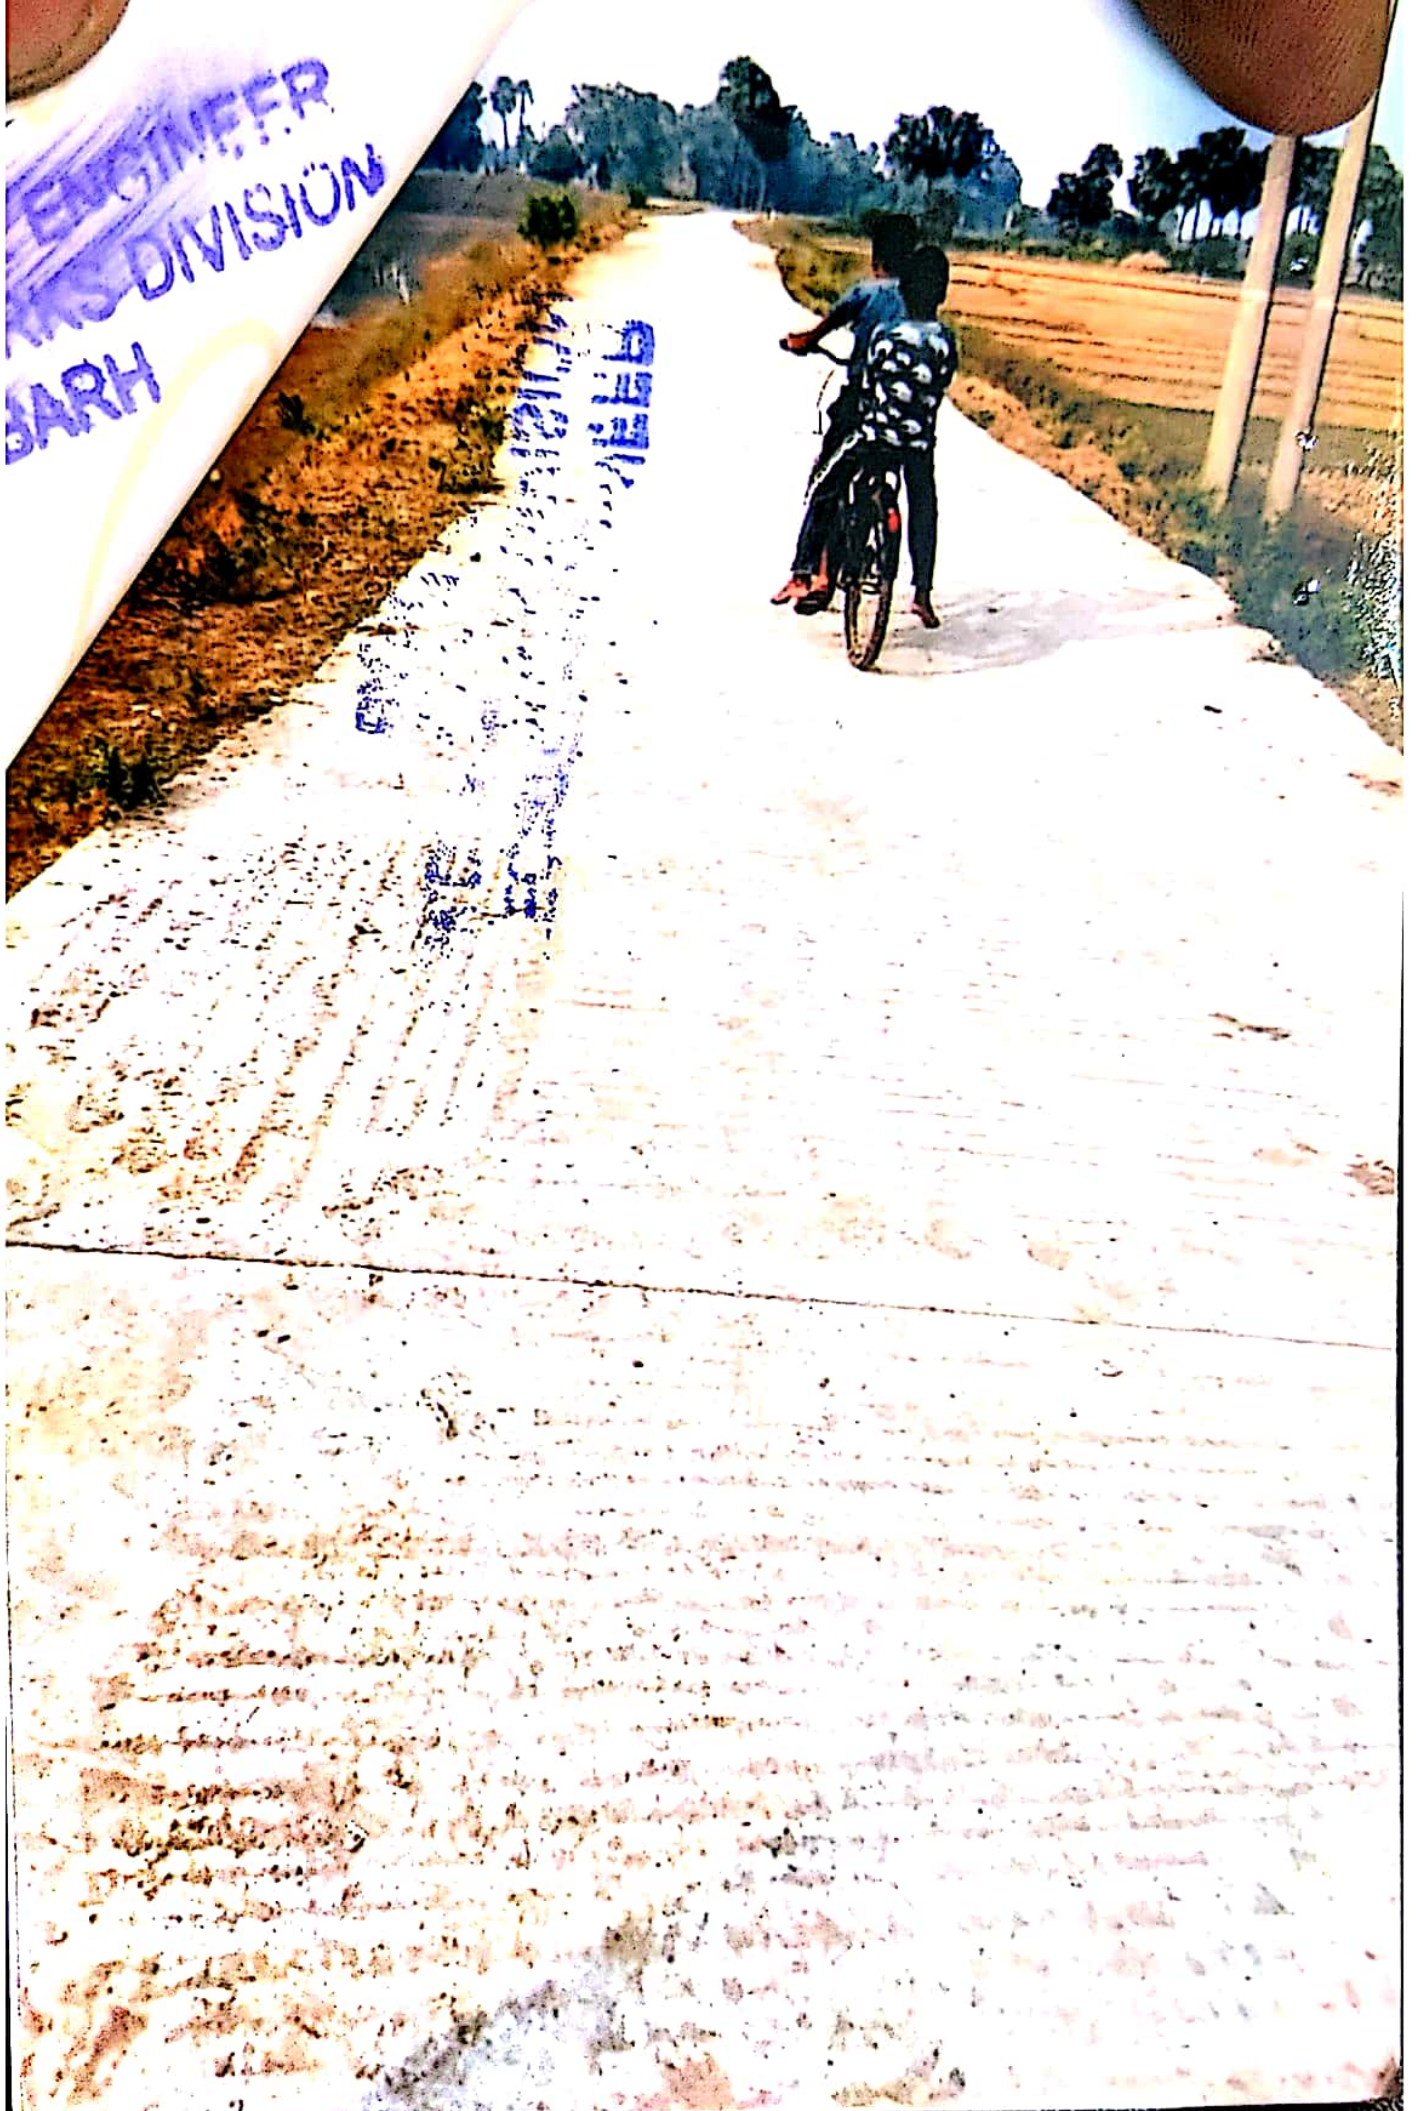


240 370
10.7.20
240 370
10/7/20
240 370

240 370
10/7/20
240 370

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BAPH

NEED
VISION

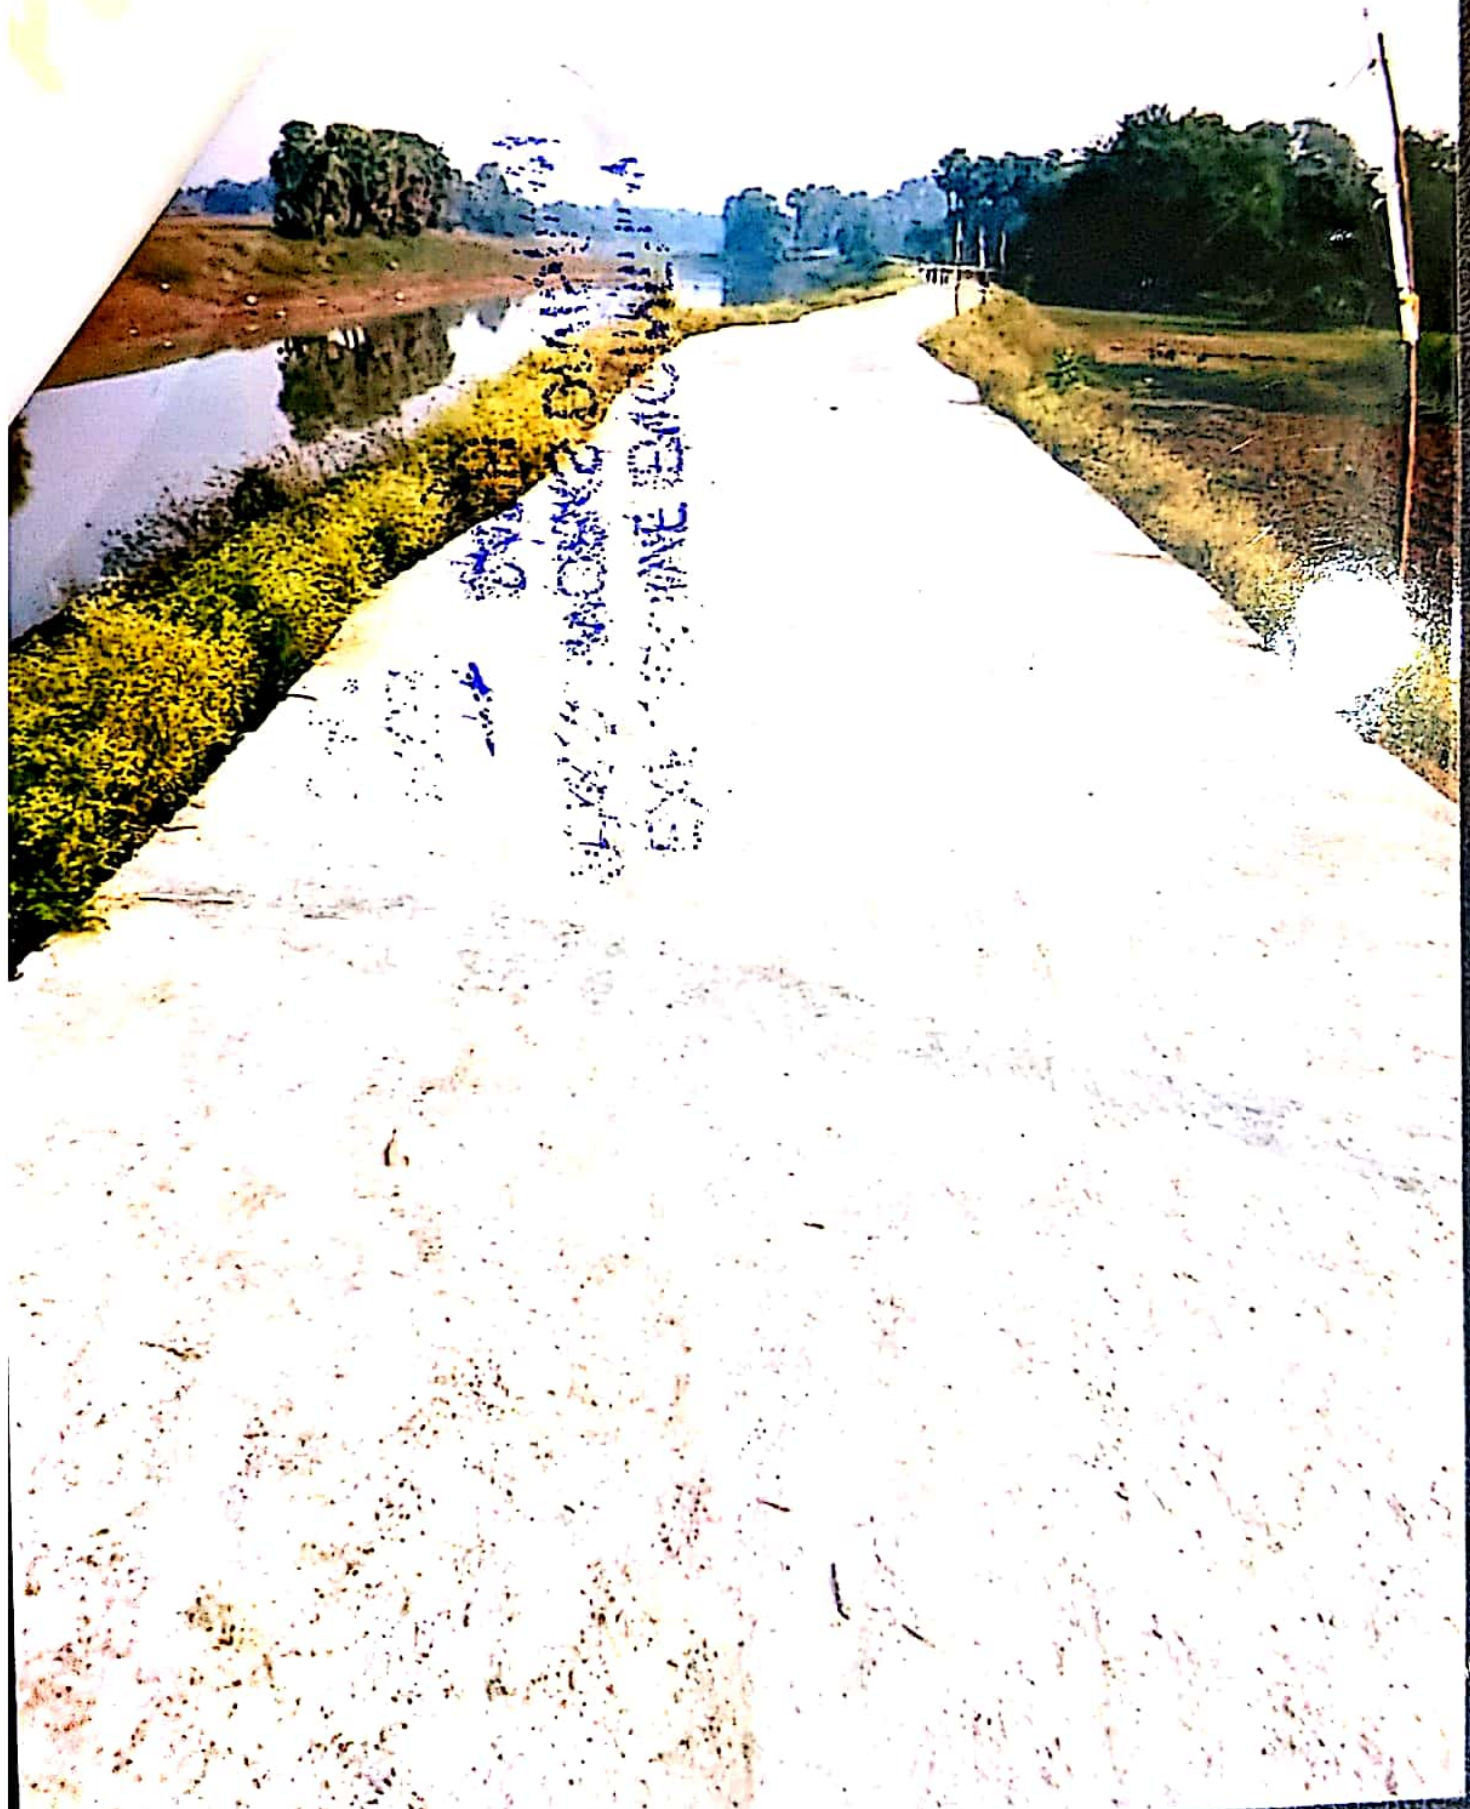

Signature
10/2/2020

JE


अं० कु० सि०-६१

10.7.20

अ० अ०

02/12/20
JE

EXECUTIVE ENGINEER
RWD WORKS DIVISION
BARH



[Signature]
10/12/20

ITC

270 370

270 270 (21-4)

16.7.20

50.7.20

[Signature]
22/12/20
ITC

EXECUTIVE ENGINEER
ROAD WORKS DIVISION

DATE
