

(15) 65

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

09.09.2020 पुत्रांक:- 777 अनु०

पालीगंज/दिनांक:- 20/06/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

T.A.

सेवा में,  
09/09/2020

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, पटना।



विषय:- समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शीर्ष GTSNY अन्तर्गत Milki. Tola Devi Sthan Se to Bhagajoga School, Agr. No. 27/SBD/2018-19 निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है :-

योजना का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।

1. स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है।
2. कार्य प्रारंभ करने की तिथि 24.08.2018 है।
3. एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 23.02.2019 है।
4. मापी पुस्त के अनुसार कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि 06.03.2020 है।
5. इस पथ में ATR लंबित नहीं है।
6. कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव समर्पित किया जाता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज  
20/06/20

## APPLICATION FORM FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- राजीव कुमार
2. Name of work :- Milkhi Tola Devi Siharanto Bhagajia School  
(Head of Expenditure) :- U.T.S.N.Y.
3. Agreement No. :- 27/SBD/2018-19
4. Agreement Value :- 4178204.00
5. Date of Commencement of Work :- 04/08/2018
6. Date of Completion stipulated in the Agreement :- 23/02/2019
7. Period of Which Extension has been give previously :- 30/11/2019
8. Work do<sup>ne</sup> of % 100%.
9. Period for which Extension now Applied for :- 06/03/20
10. Reason for extension of time :- पुलिया के निम्न प्रस्तावित स्थल पर ट्रान्सफर होने के कारण काम में देरी हुआ।
11. Recommendation by J.E. :-  
mch  
16-06-2020  
JE
12. Whether Programme of Work approved :-
13. Whether fund available :-
14. If spill over from previous financial Year whether included in the current Work Programme or not :-
15. Recommendation of A.E. Work has been completed on 6.3.2020. Work delayed due to transfer of Calcutt site. Extension of time may be granted upto 06.03.2020  
16/06/2020
16. Recommendation of E.E.  
16/06/2020  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Paliganj
17. Recommendation of S.E.  
16/06/2020  
अधीक्षक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल  
बटना
18. Recommendation of C.E.  
16/06/2020  
राजीव कुमार  
Signature of Contractor



शत पत्र

=====

NAVEEN KUMAR  
Notary Public, Patna

मैं, राजीव कुमार, पिता - स्व० अर्जुन सिंह, पता - ग्राम - पो० -

नदपुरा, थाना - धनखुआ, जिला - पटना - 804451. मैं बिहार का

निवासी हूँ, शपथ पूर्वक कहान करता हूँ कि:-

1. यह कि ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (जी०टी०एस०एन०वाई०)

के अन्तर्गत मिल्की टोला, देवी स्थान से भगजोगा स्कूल तक पथ निर्माण

कार्य के अन्तर्गत सरकारनामा - 27एसबीडी/2018-19 (जी०टी०एस०एन०वाई०)

ग्रामीण कार्य विभाग, पालीगंज डिविजन का संवेदक हूँ।

2. यह कि उपरोक्त कार्य पईन पर पुन के स्थान पर ट्रांसफर रहने के कारण

समय पर पूर्ण नहीं हो सका। दिनांक - 06 मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण

हो गया है।

3. यह कि सभी कार्य खत्म किया जा चुका है।


4. यह कि समयवृद्धि के उपरान्त भुगतान के अलावे अन्य किसी प्रकार के

बड़े हुए दर का कोई भी दावा मैं पेश नहीं करूँगा।

यह कि उपरोक्त लिखी गई सारी  
बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं।

I, identify the signatory  
who, Signed in my presence

राजीव कुमार  
शपथ कर्ता का हस्ताक्षर



No. 691 Date 06/03/2018

Mr/Smt. Rajeev Kumar  
who is identified by  
advocate, Solemnly affirmed and  
declared before me.

# Rajiv KUMAR

Govt. Contractor And General Order Supplier

Village P.O. Indupara, Thana. Dhanarua, Patna-81



सेवा में ,

Date: 28/8/19

सहायक विद्युत अभियंता

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल - पालीगंज , पटना

विषय:- मिल्की गाँव में पईन के आल पर से ट्रांसफरमर

स्थानांतरित करने के संबंध में :-

महाशय ,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मिल्की गाँव में जाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग पालीगंज जिला - पटना द्वारा सात निश्चय योजना के तहत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें गाँव तक सड़क बनाने के लिए बीच रास्ते में एक पईन पड़ता है जिसमें पुल बनाना अतिआवश्यक है। पईन के बाँध पर ट्रांसफरमर है। अगर पुल बनाने के लिए मिट्टी का कटींग होगा तो ट्रांसफरमर गिर जायेगा और उक्त गाँव का बिजली बाधित हो जायेगी। अगर पुल का निर्माण कार्य नहीं होता है तो ग्रामीण लोगों को सड़क बनने से कोई लाभ नहीं मिल पायेगा।

अतः आप से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ट्रांसफरमर को पईन के उस तरफ लगभग 20 से 30 फीट आगे बढ़ाकर स्थानांतरित कर देने से सड़क का निर्माण कार्य सही ढंग से गाँव तक पहुँच जायेगा ताकि सड़क का लाभ जनहित में ग्रामीण लोगों को मिल सके और लोगों को आने जाने में सुविधा उत्पन्न हो ताकि मुख्यमंत्री सात निश्चय का योजना का सपना साकार हो सके।

राजीव कुमार  
विश्वासभाजन

राजीव कुमार

पता-ग्रा0+पो0-नदपुरा,

थाना- धनरुआ , जिला- पटना

Received  
28/8/19



ॐ

Mob.: 9386068214

**Rajiv KUMAR**

Govt. Contractor And General Order Supplier

Vill+Po. Nadpura, Thana: Dhanarua, Patna-51

Ref:.....

Date:.....

र/०/१ :

कर्मचारी मंडल

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमुख पालीगंज (पटना)

20/6/20

विषय : माध्य कृषी स्वच्छ करने के संबंध में

महोदय : निवेदन पुर्वक कहना है कि ज.त.स.न/र  
 ठांवि मिलवा होना है मगजोगा कुल न  
 साफ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है साफ  
 है पुल का निर्माण कार्य करना ठा. 2 पंचायत  
 पुल बनाने के स्थान पर विजली विभाग का  
 टैंकफिलर रहने के कारण पुल का निर्माण  
 कार्य सही समय पर नहीं हो सका  
 ठा. ठा. 2 ले ~~काम~~ कबुल है कि 06/3/202  
 तक समय कृषी की नीम स्वच्छ करने हेतु  
 कृपा की जाए

ठा. का विश्वासी

राजीव कुमार

15-6-20

MO - 9386068214

9

Head Entry

Name of work - Civil & five year paint of R.W. of Form  
Mithi Tola Devi School to Chagriga  
School

Schedule XLV-Form No.-134

Date - 27/06/2016/2018-2019

Name of Officer - Ravi Kumar

DIVISION

Name of A.E. - Sri Gore Lal Paswan - Paliganj

SUB-DIVISION

# MEASUREMENT BOOK

528

20/6  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Paliganj

20/06/20

| Particulars                                                                                                        | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                                                                    | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| Name of work: - Const. and five year maintenance of road from milk tola deri station to Bhagya School under GTSNY. |                               |    |    |    |                  |
| Block - Baligari                                                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| Name of Agency - Sri Rajiv Kumar                                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| At Madhura.                                                                                                        |                               |    |    |    |                  |
| Dist: - Patna.                                                                                                     |                               |    |    |    |                  |
| Agreement: - 27/500/GTSNY/2018-19                                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| Date of Commencement - 24-8-2018                                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| Date of Completion as per agreement - 23/02/2019                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| ① Const. of GSB Well graded do. do.<br><small>Actual depth of do. do. - 6.32m</small>                              |                               |    |    |    |                  |
| $1 \times 8.40 \times \frac{3.45 + 4.20 + 5.40}{3} \times 0.10 = 3.59 \text{ m}^3$                                 |                               |    |    |    |                  |
| $1 \times 8.40 \times \frac{4.40 + 5.50 + 5.60}{3} \times 0.10 = 4.23 \text{ m}^3$                                 |                               |    |    |    |                  |
| ② Const. of Benchmarks and reference do. do.                                                                       |                               |    |    |    |                  |
| = 0.60 Km.                                                                                                         |                               |    |    |    |                  |
| ② Const. of GSB by providing well graded do. do.                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| $1 \times 8.50 \times \frac{3.60 + 3.75 + 4.50}{3} \times 0.10 = 4.74 \text{ m}^3$                                 |                               |    |    |    |                  |
| $1 \times 6.70 \times \frac{6.20 + 6.30 + 6.35}{3} \times 0.10 = 4.19 \text{ m}^3$                                 |                               |    |    |    |                  |
| ③ Const. of sub grade and center shoulder do. do.                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| (Sides of GSB in CC portion)                                                                                       |                               |    |    |    |                  |
| $2 \times 5 \times 30 \times 0.600 \times 0.10 = 18 \text{ m}^3$                                                   |                               |    |    |    |                  |
| $2 \times 4 \times 30 \times 0.500 \times 0.10 = 12 \text{ m}^3$                                                   |                               |    |    |    |                  |
| $2 \times 5 \times 30 \times 0.550 \times 0.10 = 16.5 \text{ m}^3$                                                 |                               |    |    |    |                  |
| $2 \times 1 \times 0.500 \times 0.10 = 1.6 \text{ m}^3$                                                            |                               |    |    |    |                  |

# Abstract of cost

Sch. XLV-Form No. 134

33

| Particulars                                                                                                                        | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                                                                                    | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| Name of work: - Const. and five year maintenance of road from Milkki toles deristhan to Bhagjaga School under GTSNY Block- Paligaj |                               |    |    |    |                  |
| Name of Agency: - Sri Rajiv Kumar                                                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| At- Noolpura, Distt- Patna                                                                                                         |                               |    |    |    |                  |
| Agreement: 27/SBD/GTSNY/2018-19                                                                                                    |                               |    |    |    |                  |
| Date of Commencement: - 24-08-2018                                                                                                 |                               |    |    |    |                  |
| Date of Completion as per agree 23-02-2019                                                                                         |                               |    |    |    |                  |
| Actual date of completion - 6-3-2020                                                                                               |                               |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                    |                               |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                    |                               |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                    |                               |    |    |    |                  |

VA  
1 Const. of Benchmark and reference do do.

Qty vide TMB item ① Page-25

0.60 km @ Rs 12658.24/km - Rs 7595=rs

2  
2 Clearing and grubbing road

Land do do.

Qty vide TMB item ① 1/2 Page-21

0.070 Hect. @ Rs 48772.70/Ha Rs 3414=rs


3  
3 Const. of embankment do-do.

Qty vide TMB item ① 1/3 Page ② 1224.70m

(1)

| Particulars                                                                                       | Details of actual measurement |    |    |               | Contents of area |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|---------------|------------------|
|                                                                                                   | No.                           | L. | B. | D.            |                  |
| (21/10) provide and fixing typical GTSNY informatory signboard (600mm equilateral triangle) do do |                               |    |    |               |                  |
| Qty with TMS item 8 Page 27                                                                       |                               |    |    |               |                  |
| 01 No @ 1491.62                                                                                   |                               |    |    | Rs            | 1492.00          |
| (22/11) provide and fixing typical GTSNY informatory sign (600 mm x 450 mm rectangular) do do     |                               |    |    |               |                  |
| Qty with TMS item 9 Page 27                                                                       |                               |    |    |               |                  |
| 01 No @ Rs 1531.17/No                                                                             |                               |    |    | Rs            | 1531.00          |
|                                                                                                   |                               |    |    |               | 4029091 =        |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 4024624.30 |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 3969150.00 |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 4029091 =  |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 4024624.30 |                  |
| less 10% below agreement                                                                          |                               |    |    | Rs 3969150.00 |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 3572235.00 |                  |
| less previous payment with                                                                        |                               |    |    | Rs 3622162.00 |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 3626182.00 |                  |
| TMS Page 23                                                                                       |                               |    |    | Rs 2750545.00 |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 821690.00  |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 871617.00  |                  |
|                                                                                                   |                               |    |    | Rs 875637.00  |                  |
| 20/06/2020                                                                                        |                               |    |    | Rs            |                  |
| SE                                                                                                |                               |    |    |               |                  |
| Consumption of materials                                                                          |                               |    |    |               |                  |
| Earthwork - 74.47 m <sup>3</sup>                                                                  |                               |    |    |               |                  |
| A. Sand - 1.40 m <sup>3</sup>                                                                     |                               |    |    |               |                  |
| C. Sand - 18.31 m <sup>3</sup>                                                                    |                               |    |    |               |                  |
| Stone/Aggrate - 38.73 m <sup>3</sup>                                                              |                               |    |    |               |                  |

20/06/20  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Paliganj  
20/06/20

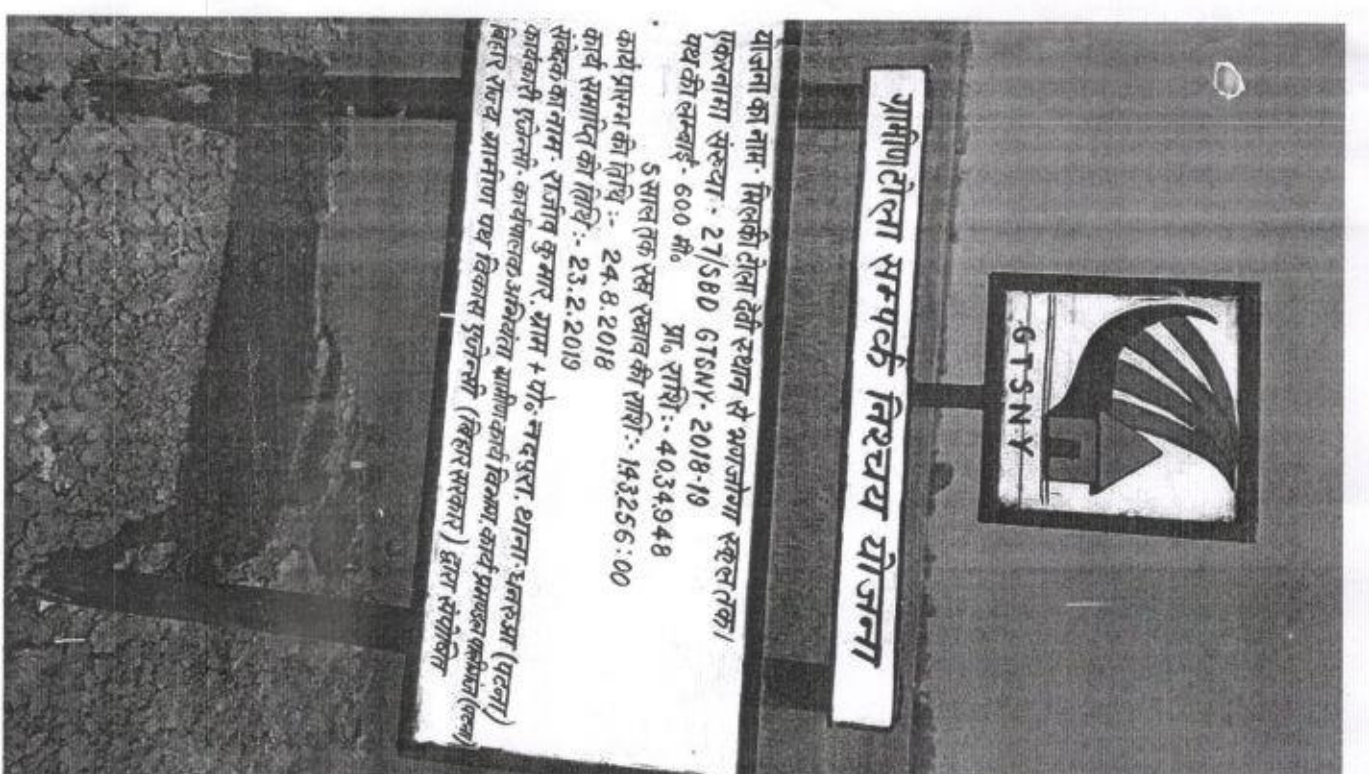

Road Name - Milkitala Devasthan to Bhaggya

School. (under GTSNY)

Milk  
12/16/2020  
JE

Milk  
12/16/2020  
JE

(17)

Road Name - Milkitala Devasthan to Bhaggya

School. (under GTSNY)

Milk  
12/16/2020  
JE

Milk  
12/16/2020  
JE

(17)





Road Name - Milki tola Deristhon to Chaggoje  
School under CTSNY

Mdhs  
16/06/2020  
JE

Ch  
16/6/2020  
AG

70

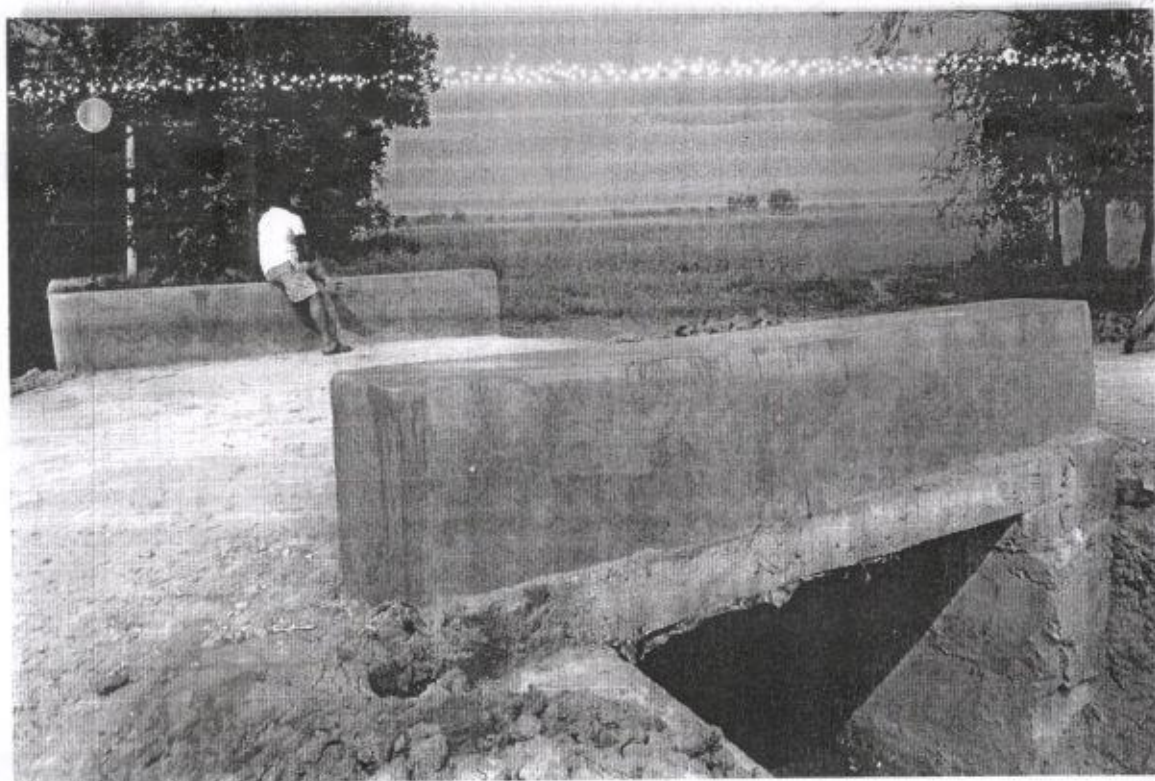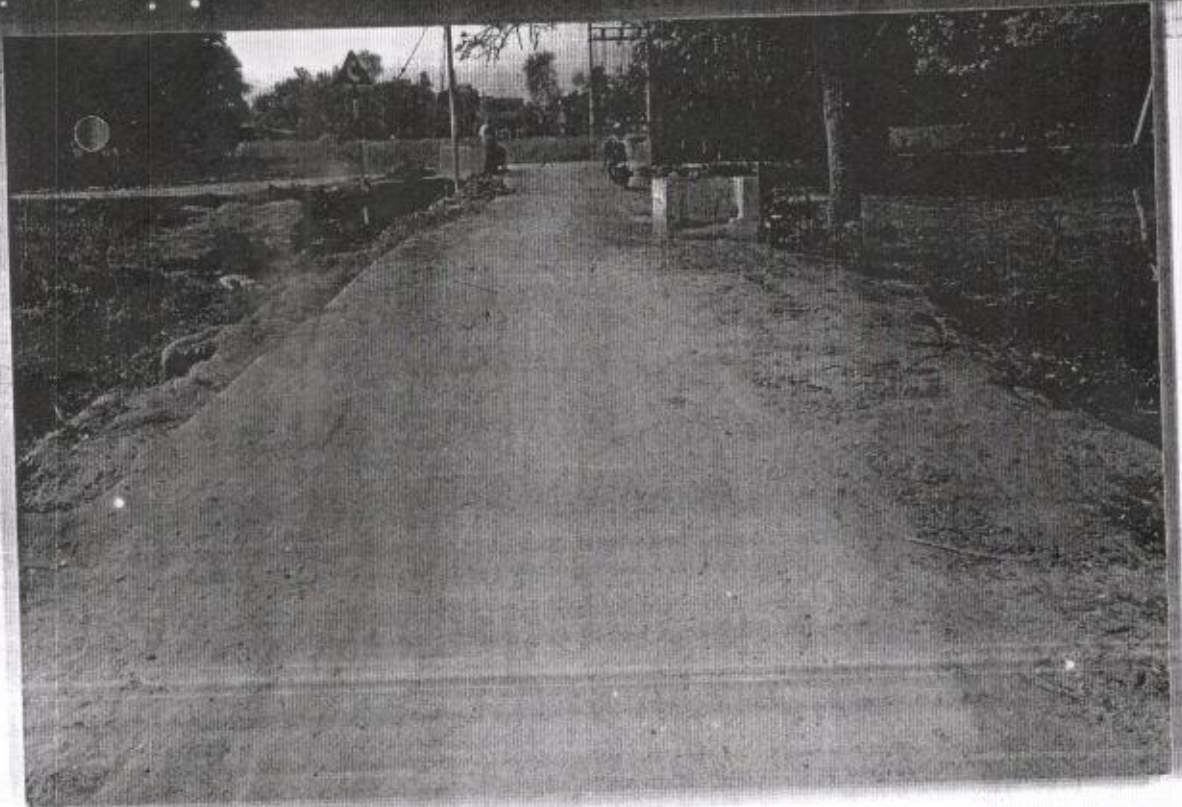

Road Name - Milki tola Denisthan to Bhagga  
School under GTSNY.

Milki  
16/06/2020

16/06/2020  
16/06/2020

(9)

(8)

Milki  
16/06/2020

16/06/2020  
16/06/2020

Road Name - Milki tola Denisthan to Bhagga  
School under GTSNY.





16

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना**

पत्रांक:- 1438 (अनु०)

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना ।

10 SEP 2020  
3206

पटना/दिनांक:- 09/09/2020

विषय:- शीर्ष GTSNY योजना अन्तर्गत मिल्की टोला देवी स्थान से भगजोगा स्कूल तक पथ निर्माण कार्य का समय-वृद्धि के संबंध में ।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज का पत्रांक- 777 (अनु०) दिनांक-20.06.2020

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ शीर्ष GTSNY योजना अन्तर्गत मिल्की टोला देवी स्थान से भगजोगा स्कूल तक पथ निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या- 27-SBD/2018-19 के समय-वृद्धि अभ्यावेदन विहित प्रपत्र में शपथ पत्र, कार्य का फोटोग्राफ, मापी पुस्त की छायाप्रति एवं स्थल निरीक्षण का सी०डी० कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज के अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है, को मूल में संलग्न कर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज के दिनांक-06.03.2020 तक का समय-वृद्धि की स्वीकृति के अनुशंसा के आलोक में अनुशंसा के साथ विषयक कार्य का समय-वृद्धि की स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन्

*[Signature]*  
9/9/2020  
अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना  
09.09.2020

*[Signature]*  
10-9-20
