

~~Spec~~ 57821132 21 212027-2124

Schedule XLV-Form No.-134

MM6154-50

Darbhangah-1

DIVISION

(71)

Hannan Hegge

SUB-DIVISION

33248.

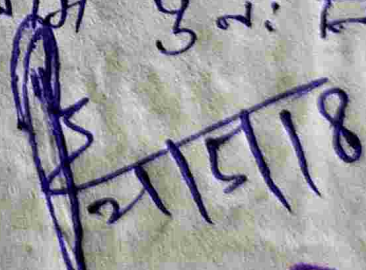
MEASUREMENT BOOK

Dr Anwarul Karim Nishida.

प्रमाणित किया जाता है कि
इस भाषी पुस्त में मशीन द्वारा
से 100 तक पृष्ठ संक्षिप्त है जो
श्री शविन्द्र कुमार शर्मा सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य अवर प्रमण्डल, हनुमाननगर
के नाम निर्गत किया गया।


Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Muz Darbhanga - 1
21/05/18

श्री मनोज कुमार, कमीप अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रशाखा
हनुमाननगर के नाम पुनः निर्गत किया
जाता है।


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल, हनुमाननगर

21.5.18

Sch, XLV-Form No. 134

Darbhanga-I DIVISION

Hanuman Nagar SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 3348

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

3rd and final Bill.

27

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: Construction of Road					
from Dimnampur to Mushahi					
Total under M.M.G.S.Y.					
Agency: - Sri Avinash K. Mishra					
Agreement No: - 15 / S.B.D / 2017-18					
Date of Agreement: - 25.1.18					
Date of Completion: - 24.1.19					
Actual Date of Completion: - 18.6.2020					
Date of Measurement: - 20.5.2020					
(1) Construction of gravelor					
Sub base grading					
Material					
2 x 30.0 x 4.05 x 0.200 = 48.60 m ³					
1 x 15.0 x 4.05 x 0.200 = 12.15 "					

60.75 m³

(2) W.B.M. grade III material.

$$5 \times 30.0 \times 3.75 \times 0.075 = 42.21875$$

$$5 \times 30.0 \times 3.75 \times 0.075 = 42.21875$$

$$5 \times 30.0 \times 3.75 \times 0.075 = 42.21875$$

$$5 \times 30.0 \times 3.75 \times 0.075 = 42.21875$$

$$5 \times 30.0 \times 3.75 \times 0.075 = 42.21875$$

$$1 \times 30.0 \times 3.75 \times 0.075 = 8.4375$$

$$1 \times 13.0 \times 3.75 \times 0.075 = 3.65625$$

$$\underline{223.1875}$$

20/5/2020

J.E

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B.F	Around	R₅	15218559
(27/28) provision c.m (1:4)			15 mm		
Gy T.M.		B.P(25)	152.86 M²		
c R		181 = 78 /M²	- R,	27787 = w	
					/
					R₅ 1,52,46,346 =
Less 10 % Below (-)				R	15 24 634 =
					R₅ 1,37,21,712 =
Less previous paymt(-) R					9866746 =
					R₅ 38,54,966 = 00
18/6/2020 S.E					
					Physical work is completed
					and maintenance work
					started 18/6/2020

Signage

(1) E/W $\rightarrow 4319.0 \text{ m}^3$

@ Rs 24 = 60 / m^3 — Rs 106247 = 00

(2) Stone m-sel $\rightarrow 7617.80 \text{ m}^3$

@ Rs 490 = 58 / m^3 — Rs 3737140

(3) Stone chul $\rightarrow 563.49 \text{ m}^3$

@ Rs 201 = 35 / m^3 — Rs 113459 = 00

(4) Stone Screening $\rightarrow 255.10 \text{ m}^3$

@ Rs 368 = 96 / m^3 — Rs 94121 = 00

(5) Stone chips $\rightarrow 298.46 \text{ m}^3$

@ Rs 566 = 04 / m^3 Rs 168958 = 00

(6) Sand $\rightarrow 149.79 \text{ m}^3$

@ Rs 286 = 55 / m^3 — Rs 42922 = 00


(7) Stone chips $\rightarrow 125.95 \text{ m}^3$

@ Rs 689 = 63 / m^3 Rs 86859 = 00

Rs 43,49,706 = 00

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L. B.	B. P. S.	D.	
					4349706 = 00
(8) Local sand				19.59 m ³	
				@ Rs 286 = 55 / m ³	- Rs 56135 = 00
(9) Bricks				55525 No.	
				@ Rs 7 = 16 / No.	- Rs 397559 =
					<u>Rs 4803400 =</u>
10 % Siggorage					Rs 4,80,340 =
(1) Emulsion				SS, → 9.396 MT	
(2) "				RS, - 3.039 "	
(3) Bitumen				— 21.0 MT	
 18/6/2020 J.E					
