

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

पत्रांक:- 1034

दिनांक:- 18/6/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-एम0जी0एस0वाई0(MMGSY-SC) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल,दरभंगा-1 के अधीन KANSI CHOK NARKATIYA to RHI TOL (MMGSY-SC) पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि एम0जी0एस0वाई0 (MMGSYSC) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल,दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं0-- 70SBD/2018-19 (MMGSY-SC) का KANSI CHOK NARKATIYA to RHI TOL (MMGSY-SC) निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-22.01.2020 को समाप्त करना था। लेकिन माह जुलाई 2019 में बाढ़ का पानी एवं निजी भूमि विवाद के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका अब वर्तमान में कार्य 20.03.2021 तक पूर्ण कर दिया जायगा। किय गया कार्य विधिष्ठि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।
निर्देशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय /निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. मापि पुस्तिका संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेंतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

7
21/4/2020

लेख्य प्रमाणक,

मुजफ्फरपुर दरभंगा



शपथ पत्र

मैं सुनील कुमार, ग्राम - मधुबनी पताही, जिला - मुजफ्फरपुर शपथ पूर्वक बयान करता हूँ:-

1. यह कि मैं पंजीकृत संवेदक हूँ। —
2. यह कि मैं ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दरभंगा - 1 के दरभंगा सदर प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत "कन्सी काली मंदिर से नरकटिया भाया रही टोला" पथ तक का निर्माण कार्य करा रहा हूँ। जिसका कार्य प्रगति पर है।
3. यह कि असामयिक अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण दिनांक - 20/3/2021 तक समय वृद्धि कि मांग कर रहा हूँ। —
4. यह कि शपथ पत्र के सारे तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। —

अतः यह शपथ पत्र है। —

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया।



Sunil Kumar
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

S. Mishra
21/4/2020
अधिकृत

Sri/Smt. Sunil Kumar
Identified by Sri/Smt. Self
Advocate Solemnly Affirm &
Declared before me

21/4/2020
Surendra Mishra
Notary Public, Darbhanga

समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
दरभंगा-1

1. अभिकर्ता का नाम : सुनील कुमार
2. कार्य का नाम : कंठरी नक्काशा काली मंदिर से बाहीरोला
3. एकरारनामा संख्या : 70/580-2018-2019
4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य : ~~1,19,25,013/00~~ 1,07,32,511/2
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : 1,19,25,013/2
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि : 23.1.19
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि : 22.1.20
8. और अधिक समय जो माँग की जा रही है : 20-3-2021
9. तिथि एवं समय जिसमें कार्य संपादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ : वाढ का पानी, एवं स्थल मापी
10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णतः का अनुपात :
11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें : नही
12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गयी थी : नही
13. अभिकर्ता का हस्ताक्षर : Sunil Kumar
14. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति : कृत्रिया निर्माण कार्य हुआ है, 55.18 कर्से चम खाई है
15. कनीय अभियंता की अनुशंसा : वर्ष-2019 में वाद के जाने तथा खेत के विकास वल के कारण
हिसा कार्य है, जिसका हुआ है इनको दिनांक 20-03-2020 तक समाप्त
हिसा दिया जा सकता है
10/6/2020
16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित : समय वृद्धि नियमानुसार दी जा सकती है
10/6/2020
PE
17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित अपने लिखावट में : कार्य में निरन्तर 21 दिनों 21/04/2020 को के
पानी 15 सुक्रीन न(01) है जिले में
हेक्टर- 607 है जो इन 20 हेक्टर है
दिनांक 24/3/2020 तक नई सुक्रीन एमिटर दी
जाती है
10/6/2020
- 18- अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा :

ॐ

Mob No. : 9431404142

SUNIL KUMAR (SHAMBHU)

REGISTERED CONTRACTOR R.C.D./R.W.D.

(A Govt. Contractor and Order Supplier)

Address : Vill - Madhubani, PO - Patahi, Dist. Muzaffarpur

सेवा में

कार्मिकालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल दरभंगा १

विषय : केंद्रीय नस्करिप्रा से रही बोला पत्र जिसका प्रकारण
सं. ३०/SBD २०१८-१९ का समप्रवृद्धि देना/-

महोदय,

निवेदन है कि मैं आपके प्रमंडल अंतर्गत
उपरोक्त पत्र उन्नयन कार्य कर रहा हूँ। उक्त पत्र के पंजाबां
में बाढ़ का पानी असमय आ जाने के कारण कार्य
रुक गया, जिसका सूचना मेरे द्वारा स्वयं जोरों से साथ
१७.७.१९ एवं २४.७.१९ को कार्मिकालय में जमा दिया गया
हुआ है। उक्त पत्र का समप्रवृद्धि देना का कृपा करें
उक्त पत्र का परीक्षण में करवाने के कारण भी कार्य
रुक गया है। मुझे साथ २०२१ तक समप्र वृद्धि देना
देने का कृपा करें


श्रीमान का उक्त कार्य हेतु अनुरोध

रहूँगे /


अनु. कार्मिकालय में जमा आवेदन
होना उचित

विश्वासभाजन

Sunil Kumar





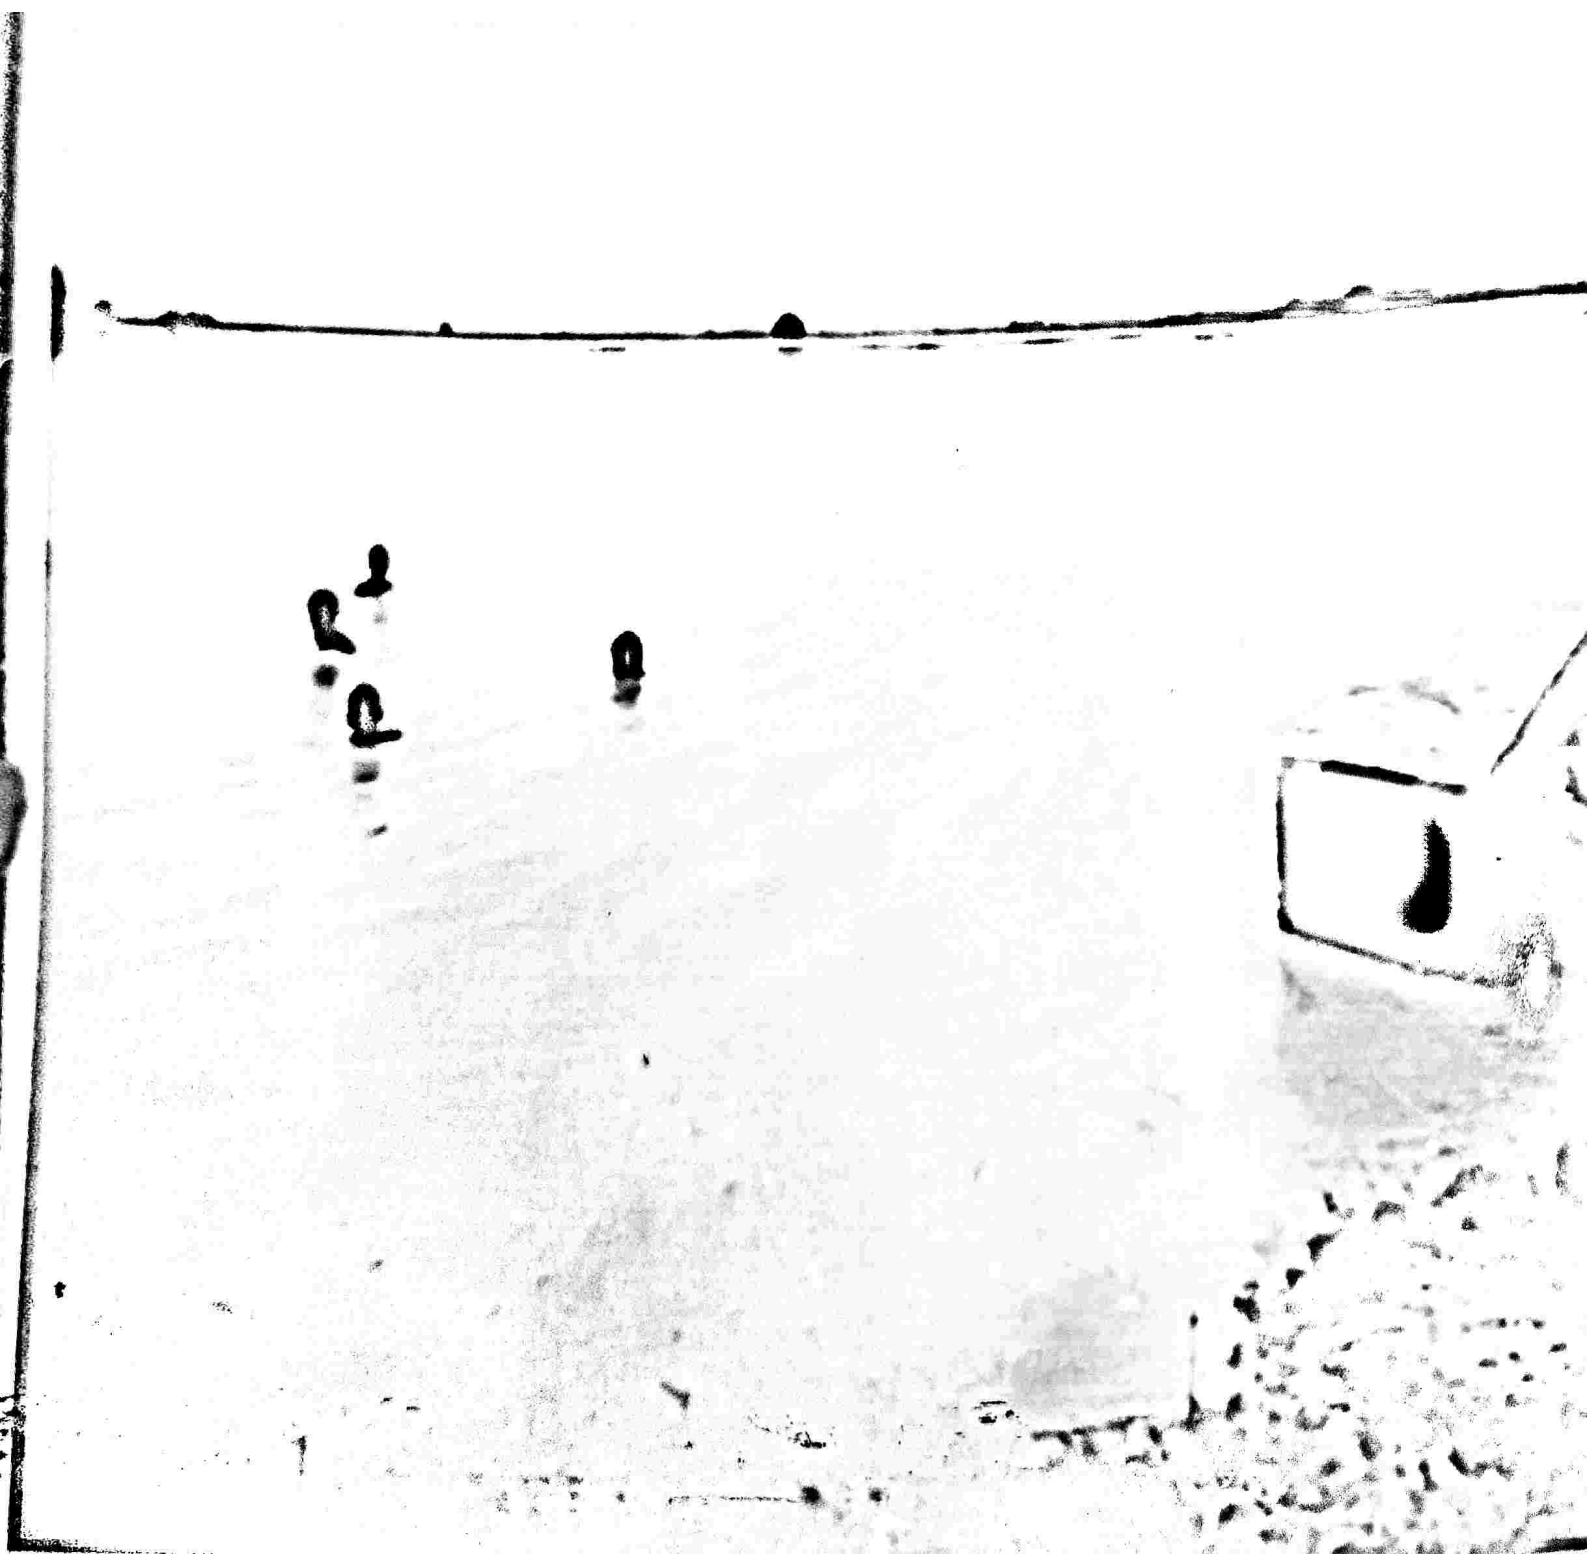

No. and date of agreement - _____
 (These four lines should be repeated at the commencement
 of the measurements relating to each work).

Details of activity

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1st on A/c Bill					
Name of Work - Construction of road from Kanshi Chowk Narkatia to Rahi Tola.					
Name of Agency - Sunil Kumar, Madhubani, Patna, Muzaffarpur.					
Agreement No - 70 (BD)/2018-19					
Agreement Value - Rs. 07,32,511.00					
Date of Work Start - 23-01-2019					

Date of Work Completion - 22-01-2020

Date of Entry - 07.07.2019

① Clearing & Grubbing of Road

Land - - - all complete drb.

$$1 \times 1950 \times 3.50 = 6825.00 \text{ m}^2$$

$$= 0.683 \text{ Haekt.}$$

2. E/w excavation in foundation

trench - ... all complete jobs

2 Nos	1000 mm ϕ
-------	----------------

Qty	2	6.45	1.40	1.5	=	27.09 m ³
-----	---	------	------	-----	---	----------------------

$$Q_4 = 1 \times 5.78 \times 1.53 \times 0.25 = 2.21 \text{ m}^3$$

29.30 m³

$$29.30 = 58.60 \text{ m}^3$$

bedolung

Continuation

Particulars	Units of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Qty. $1 \times 5.78 \times 1.53 \times 0.25 = 2.21 \text{ m}^3$					
Deduction for pipe,					

Qty. $1 \times 5.78 \times 0.22 = 1.27$					
					0.94 m^3

$$2 \text{ Nos} \times 0.94 = 1.88 \text{ m}^3$$

4. Providing PCC M-15 in foundation,

$$\text{Qty } 2 \times 6.45 \times 1.40 \times 0.15 = 2.70 \text{ m}^3$$

$$2 \text{ Nos} \times 2.70 = 5.40 \text{ m}^3$$

5. Providing B/W (1:4) in sub-structure.

$$\text{Head wall, Qty. } 2 \times 6.20 \times \frac{1.25 + 0.4}{2} \times 2.465$$

$$= 25.22 \text{ m}^3$$

$$\text{Parapet, Qty. } 2 \times 6.20 \times 0.4 \times 0.6 = 2.98 \text{ m}^3$$

Deduction for pipe,

$$\text{Qty. } 2 \times 1.188 \times 0.61 = 1.45 \text{ m}^3$$

$$26.75 \text{ m}^3$$

$$2 \text{ Nos} \times 26.75 = 53.50 \text{ m}^3$$

6. Providing & laying 100 mm

ϕ NR3 H.P.

$$\text{Qty } 3 \times 2.50 = 7.50 \text{ m}$$

$$2 \text{ Nos} \times 7.50 = 15 \text{ m}$$

7. Plastering with CM (1:4)

parapet side

$$\text{Qty } 2 \times 6.20 \times 0.60 = 7.44 \text{ m}^2$$

parapet face

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Qty, 4 x 0.4 x 0.6 = 0.96 m ²					
parapet top,					
Qty, 2 x 6.20 x 0.40 = 4.96 m ²					
Head wall side,					
Qty 2 x 6.20 x 1.15 = 13.83 m ²					
Deduction,					
Qty, $\pi/4 \times (1.00)^2 = 0.785$ m ²					
					26.405
2100 x 28.40 = 52.80 m ²					
⑧ E/W excavation in foundation trench --- all complete job					
Qty 3 Nos. 600 mm ϕ					

Head wall,					
Qty 2 x 4.15 x 1.40 x 1.47 = 17.08 m ³					
Bedding,					
Qty, 1 x 5.78 x 1.07 x 0.25 = 1.55 m ³					
					18.63 m ³
3 Nos x 18.63 = 55.89 m ³					
9. providing 1st class Bedding with local sand,					
Qty 1 x 5.78 x 1.07 x 0.25 = 1.55 m ³					
Deduction for pipe,					
Qty 1 x 5.78 x 0.22 = 1.27 m ³					
					0.28 m ³
3 Nos x 0.28 = 0.84 m ³					
10. providing PCC MIS in					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(10/25) Providing RCC M15 in Foundation			216		485,596.00 497,970.00
Qty 4.26 m ³ Page - (3-4)					
@ Rs. 5432.80/m ³					Rs. 26403.00
(11/26) Providing B/W (1:4) in sub-structure.					
Qty 42.06 m ³ Page - 4					2,56,979.00
@ Rs. 6109.81/m ³					Rs. 85,659.00
(12/27) Providing & Laying 600 mmφ HP 4.P.					
Qty 22.50 m Page - 4					
@ Rs. 1397.10/m					Rs. 31435.00

(13/29) Plastering with CM (1:4)
 Qty 97.76 m² Page (4-5)
 @ Rs. 177.54/m² - Rs. 8479.00

(14/7) Providing GSB with well graded Material - - - all complete job.

Qty 75.00 m³ Page 5
 @ Rs 2342.93/m³ - Rs. 1,75,720.00

9,93,986 - 99,34,88.00
 10% below as per Agreement. 99,399 - 99,398.20

As per
 C.P.
 19/12/19

8/10/19

03.07.19

S.E.

Continuation

ॐ

SUNIL KUMAR (SHAMBHU)

REGISTERED CONTRACTOR R.C.D/R.W.D

Mob:- 9431404142

(A Govt contractor and Order Supplier)
Address: Vill- Madhubani, PO- Patahi, Dist- Muzaffarpur, Bihar.

सेवा से

17/7/2019

जामिनालक अभियंता
ग्रामीण काम विभाग प्रमंडल दरभंगा- 2

विषय :- एकरानामा सं. 70/SB 2018/19 का किया हुआ काम काढ़ के पानी का अत्यधिक तेज धारा से बहने के संबंध में-

महोदय,

निवेदन है कि मैं आपके प्रमंडल लिखित, कृपया चोंक से नरकतिमा बाही बोला का काम एकरानामा के काढ़ किया है, उक्त पथ से अचानक काढ़ का पानी आ गया जिससे उक्त पथ का किया हुआ काम, पानी के तेज धारा से बह रहा है, एवं जगह-जगह पथ भी बुरा गया है।

श्रीमान के निवेदन है कि पथ को अपने स्तर से जांच करवाकर मांगी दर्शन देवका हुआ को, आवेदन के साथ स्थल फोटो संलग्न है।

विश्वासमान

Sy. Mr. 14/7/19

सिद्धेश

ॐ

SUNIL KUMAR (SHAMBHU)

Mob No. : 9431404142

REGISTERED CONTRACTOR R.C.D./R.W.D.
(A Govt. Contractor and Order Supplier)

Address : Vill - Madhubani, PO - Patahi, Dist. Muzaffarpur

16/1/2022

सेवा से

15/1/2020

आमिपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य, विभाग, आर्य प्रमंडल दरभंगा

विषय :- कंछी नरकटिमा से राही टोला पथ निर्माण परामर्श
सं. 70/DBD 2018-19 का समग्र वृद्धि हेतु,

सहाय्य

निवेदन है कि मैं आपके प्रमंडल अन्तर्गत
उपरोक्त पथ उन्नत कार्य कर रहा हूँ। उक्त पथ के
चौड़ाई 10 से 300 के बड़े एक पोखर है जिसके किनारे के कारण
पथ से कार्य नही के कारण ग्रामीण कुछ कोला द्वारा रोका
दिमा गया, उनके बाद उक्त पोखर का मापी हुआ, लेकिन
तब तक कार्य कलही रहे थे कि उक्त पथ से बंद का
छाते के कारण, किया हुआ कार्य भी बंद गया, जिसका
सुचना ससमय सेरे द्वारा विभाग को दिमा गया है
उक्त पथ का समग्र पूर्ण होने को है, मुझे
उक्त पथ का जुताई तक समय वृद्धि देना
कृपा प्रदान करें एवं उक्त पोखर का निरक्षण करके
उचित मागी दर्शन दे जिससे कार्य पूर्ण हो सके
श्रीमान का उक्त कार्य हेतु

कमाली देहूरा

विश्वामाया

Sunil kumar
