

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

पत्रांक:- 1172

दिनांक:- 15.07.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- एम0आर0 (3054) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन **NH 57 to Kadirabad (MR)** पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि एम0आर0 (3054) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं0- 23MBD/2018-19 का **NH 57 to Kadirabad (MR)** निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-17.06.2019 को समाप्त करना था। लेकिन कार्य स्थल पर भूमि विवाद, वास्तविक एकरारनामा की तिथी पर संवेदक के द्वारा दी गई पत्र में संवेदक की बच्ची का ईलाज दिल्ली ए0आई0आई0एम0स0 बिमार रहने के कारण कार्यपालक अभियंता के द्वारा 15.08.2019 को संवेदक के द्वारा किया गया था एवं कोरोना महामारी आ जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। अब वर्तमान में कार्य 15.07.2021 तक पूर्ण कर दिया जायगा। किया गया कार्य विषिष्टि के अनुरूप है। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है। निदेशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

- 1.समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
- 2.समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
- 3.किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
- 4.समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
- 5.इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय /निगरानी जांच लंबित नहीं है।
- 6.मापि पुस्तिका संलग्न है।
- 7.इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय /निगरानी जांच लंबित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वसिभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

15. कनीय अभियंता की अनुशंसा:- अतिरिक्त एवं साँकडाउन के कारण
- समय पर प्रारम्भ नहीं हुआ। देर से अतिरिक्त एवं साँकडाउन का समय बढ़ा दिया गया। 15-03-21 तक का समय बढ़ा दिया गया।

16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :- अतिक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण
17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:-
18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा:-

15.7.2020

Revised Work Programme

Name of Work- NH57 to Kadirabad (MR-3054)

Name of Division-RWD WORK'S DIVISION DARBHANGA1

S.No	ITEM	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	July-2020	Aug-20	SEP-20	OCT-20	NOV-20	DEC-20
1	E/W										
2	Nala										
3	GSB										
4	CD										
5	PCC										
6	ROAD FURNITURES										

Contractor Sign

हजरी व कुमारी

Executive Engineer

R.W.D. Work Division, Darbhanga 1

Rural Works Department, Govt. of Bihar



PIUDarbhanga-1
Wing:-CE-3, Patna
Circle:-Darbhanga
Division:-Darbhanga-1
No Of Visit:-32

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports QMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request
Contractors Debar Class 1 Road Format Time Extension Contractors Black List Maintenance Contractor Revoke Flood/Rain Damage Roads Poorak Core Network
Crash Inspection Emergent Repair

MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme MR Fin Year: All
Name of Road(English) NH 57 to Kadirabad(On-going)
Selection of Schemes
Amount: 252.48000 Length(In KM:) 1.950 DPR Submitted Amount: 252.48000 Length(In KM:) 1.950
Technical Approval Amount: 251.82100 Length(In KM:) 1.950 Technical Sanction Amount: 248.01251 Length(In KM:) 1.950
Administrative Sanction / Administrative Approva Amount: 252.48000 Length(In KM:) 1.950 Tender Amount: 248.012510
Updated Expenditure (Maintenance Amt)

Agreement

Main Work Amt: 223.211450 Maintenance Amt: 3.427650 Length(In KM:) 1.950
Expenditure(In Lakhs)
Upto 31/03/19: 0.000000 Upto Last Month: 0.000000 During This Month: 0
Sub Base(In KM)
Upto 31/03/19: 0.000 Upto Last Month: 1.000 During This Month: 0
Base(In KM)
Upto 31/03/19: 0.000 Upto Last Month: 0.000 During This Month: 0
Surface(In KM)
Upto 31/03/19: 0.000 Upto Last Month: 0.000 During This Month: 0
Project Status: On-going No of Habitations: 1 Connected Habitations: 0

Environmental Social Management & FrameWork

Road Insurance ESMF(IF any) Yes ESMF Remarks Y


Upload Files:

Images: No file chosen

Documents: No file chosen



Handwritten signature and date
29.02.2020



25 FEB 2020
Sl. No. 2369 Date.....

प्रभारी शपथ पत्र दरभंगा ।

शपथ पत्र

मैं M/s Sanjeev Kumar Jha, AT-Harouli, P.O- Sati Ghat P.S- K.Asthan , Dist-
Darbhanga उम्र-46 वर्ष, शपथ पूर्वक वयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं MR योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य किया हूँ।
3. NH 57 to Kadirabad (MR) तक पथ निर्माण कार्य।
4. उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 15.08.2020 को कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
5. उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की मांग नहीं करूँगा।
6. यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।


Sri/Smt. S. K. Jha
who is identified by Sri/Smt. S. K. Jha
Advocate Solemnly Affirmed
Rajiv Ranjan
Notary Public Darbhanga

Rajiv Ranjan

25/2/2020

रजिव कुमार झा
शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

Identified by
Sushil Prasad
25.2.2020

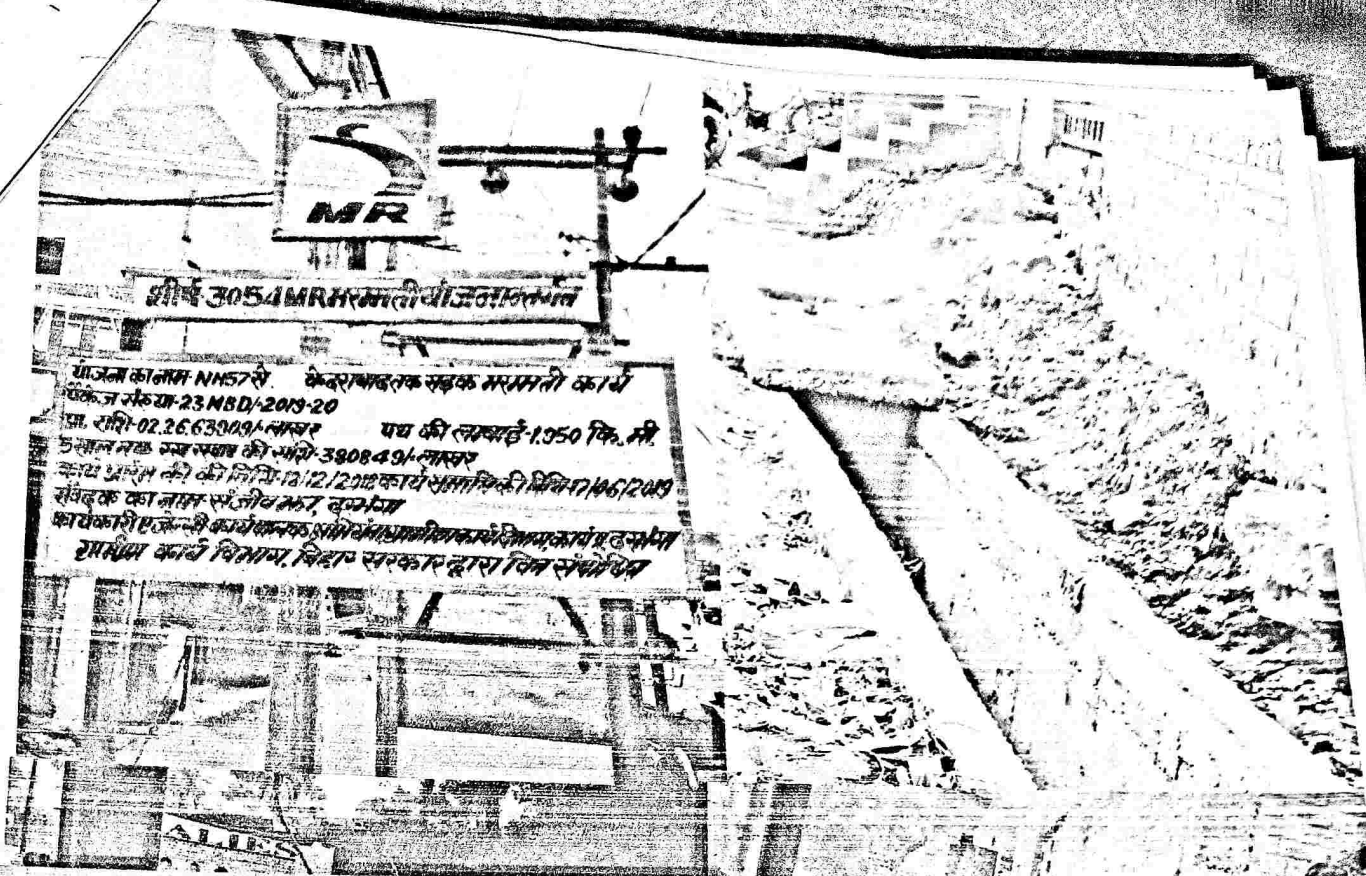

शीर्ष 3054MRMRमतीपीडितमिलन
याज्ञना का नाम NMS7 से केन्द्रावहतक सबक मरामती कार्य
पकज संख्या 23MSD/2019-20
प्र. संशि-02.26.630091/नास्तर पथ की लम्बाई-1.050 कि.मी.
5 साल तक मरामती की मशीन 3908491/नास्तर
कार्य प्रारंभ की की तिथि 18/12/2018 कार्य समाप्ति की तिथि 14/6/2019
संबंधक का नाम सजीव मरुत वरुणा
कार्यकारी एजेन्सी कार्य समन्वय समिति का कार्य दिनांक कार्य प्रारंभ
ग्रामीण कार्य विभाग, विद्या सरकार द्वारा विम संशोधन




NOKIA

JE

15

EE



3/20/20
2/2/20

3/20/20



संयुक्त
J.E

A.E

संयुक्त
E.E
Darbhanga-1

NH-57 से कैदरावाद

Schedule XLV-Form No. 134

Executive Engineer
R.W.D. Works Division

DIVISION

Harbhanga

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

3464

प्रमाणित किया जाता है कि
इस मापी पुस्त में प्रमाणित दाखला
से 100 गैलन सूखे मसिरे की जो न
शुद्धाई कुमोद प्रवीण, सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कर्नाट (पुनर्वास
दल) के नाम निम्नलिखित किया जा रहा है

21.11.19
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Garbhanga-1
अमीर

कृषि अभियंता, श्री म. सरिता कुमारी
कार्य प्रशासन, को निम्नलिखित किया जाता
है।

21.11.19
अमीर

Sch. XLV-Form No. 134

Executive Engineer
R.W.D. Works Division DIVISION
Garbhanga-1
Garbhanga SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Station No. MC 1304					
Name of work - Construction of road with maintenance from NH57 to Kadirabad under Darbhanga Block.					
Agency - Sri Sanjeev Kumar Sahu, Ward no-2, Harohli, Sati Ghat, Darbhanga.					
Agreement No - 23 MB D/2013-20 (3054)					
Date of work start - 18/12/2018					
Date of completion - 17/06/2019					
Date of Entry - 05/12/2019					
1) Record Measurement of M.S. reinforcement in drain					
Main bar - 10mm ϕ					
for 281m @ 175mm c/c					
65mm 30mm $1605 \times \frac{2.15 + 2.35}{2} = 3611 \text{ M}$					
@ 0.62 kg/M = 2238.82 kg					
Distribution bar					
8mm ϕ					
$14 \times 281 = 3934 \text{ M}$					
@ 0.33 kg/M = 1534.26 kg					
Total Qty of M.S. reinforcement					3773.08 kg

Continuation

Sch. XLP Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Mod. of Drain Cover - 304					
Main bar - 10mm ϕ					
$304.00 \times 7.00 \times 0.7 =$					1489.00m
Distribution bar					
10mm ϕ					
$304.00 \times 1.50 \times 1.50 =$					1520 m
					1520 m
					3513.00m
					3509.1m
					1865.58kg
					2054.06kg
					1.865 MT
					2.054 MT

Date of Entry - 20/01/2020

① E/W trenches as per specification			
CH 1000 to 1000M			
$L = 24 + 11 + 12 + 8 + 3 + 4 + 10 + 21$			
$+ 25 + 15 + 102 + 15 + 110 + 15 + 13$			
$+ 29 + 14 + 15 + 18 + 9 + 19 + 7 + 12$			
$+ 32 + 18 = 607.00 M$			
$Q = 1 \times 607.00 \times 0.70 \times 0.925 (av) = 414.27 m^3$			
CH 1000 to 1264M			
$L = 10 + 32 + 26 + 14 + 16 + 28 = 126M$			
$Q = 1 \times 126.00 \times 0.70 \times 0.975 (av) = 85.995 m^3$			
Total 500.26 m ³			

Continuation

[illegible]

Continuation

[illegible]
