

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम

पत्रांक :- 65/33-

दिनांक :- 19-6,

प्रेषक : अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

सेवा में ,

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषय : कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज से प्राप्त शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत T03
(Sarana Distributory) to Dalitpur निर्माण कार्य का समयवृद्धि के
संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बिक्रमगंज के
पत्रांक-666 अनु० दिनांक- 02.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण
कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष शीर्ष शीर्ष PMGSY
योजनान्तर्गत T03 (Sarana Distributory) to Dalitpur पथ निर्माण कार्य का
समय विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेखित है कि Gr-II एवं
जी०एस०बी० की मात्रा में कुछ सुधार की आवश्यकता पाई गई गई कार्य स्थल पर प्राप्त
आवश्यकता के अनुसार डी०पी०आर० को पुनः पुनरीक्षित कर स्वीकृति हेतु विभाग को
समर्पित किया गया था। जिसके प्रत्याशा में रहने के कारण निर्माण कार्य समय सीमा के
अंदर समाप्त नहीं हो सका। उक्त पथ का कार्य दिनांक 15.11.2020 तक पूर्ण करा लिया
जायेगा। जिसका Work Programme विहित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न किया गया
है।

अतएव कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बिक्रमगंज के
द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में 15.11.2020 तक अवधि विस्तार हेतु
अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है।

अनु:- यथोक्त।

विस्तार
P. Meah
19/6/20
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक 668 अन्तः / बिक्रमगंज / दिनांक 2/6/20/

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:— PMGSY योजनान्तर्गत T03 (Sarana Distributory) to Dalitpur के समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन के साथ कहना है कि PMGSY योजनान्तर्गत T03 (Sarana Distributory) to Dalitpur, Package No.-BR-28R-004 (Agreement No.-22/PMGSY/2018-19) का कार्य संवेदक श्री अभिषेक कुमार, न्यू पुलिस लाइन, आरा को दिनांक-28.12.2018 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का समय दिनांक-27.12.2019 था परन्तु उपरोक्त पथ में धरातल पर Gr-II एवं G.S.B की मात्रा में कुछ सुधार की आवश्यकता पाई गई कार्य स्थल पर प्राप्त आवश्यकता के अनुसार D.P.R को पुनः पुनरीक्षित कर स्वीकृति हेतु विभाग को समर्पित किया गया था, जिसके प्रत्याशा में रहने के कारण संवेदक द्वारा कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। संवेदक द्वारा उक्त पथ में कार्य का अवशेष भाग पूर्ण करने के लिए दिनांक-15.11.2020 तक समय वृद्धि की माँग की गयी है।

अतः उक्त कार्य का दिनांक-15.11.2020 तक समय वृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/6/20
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

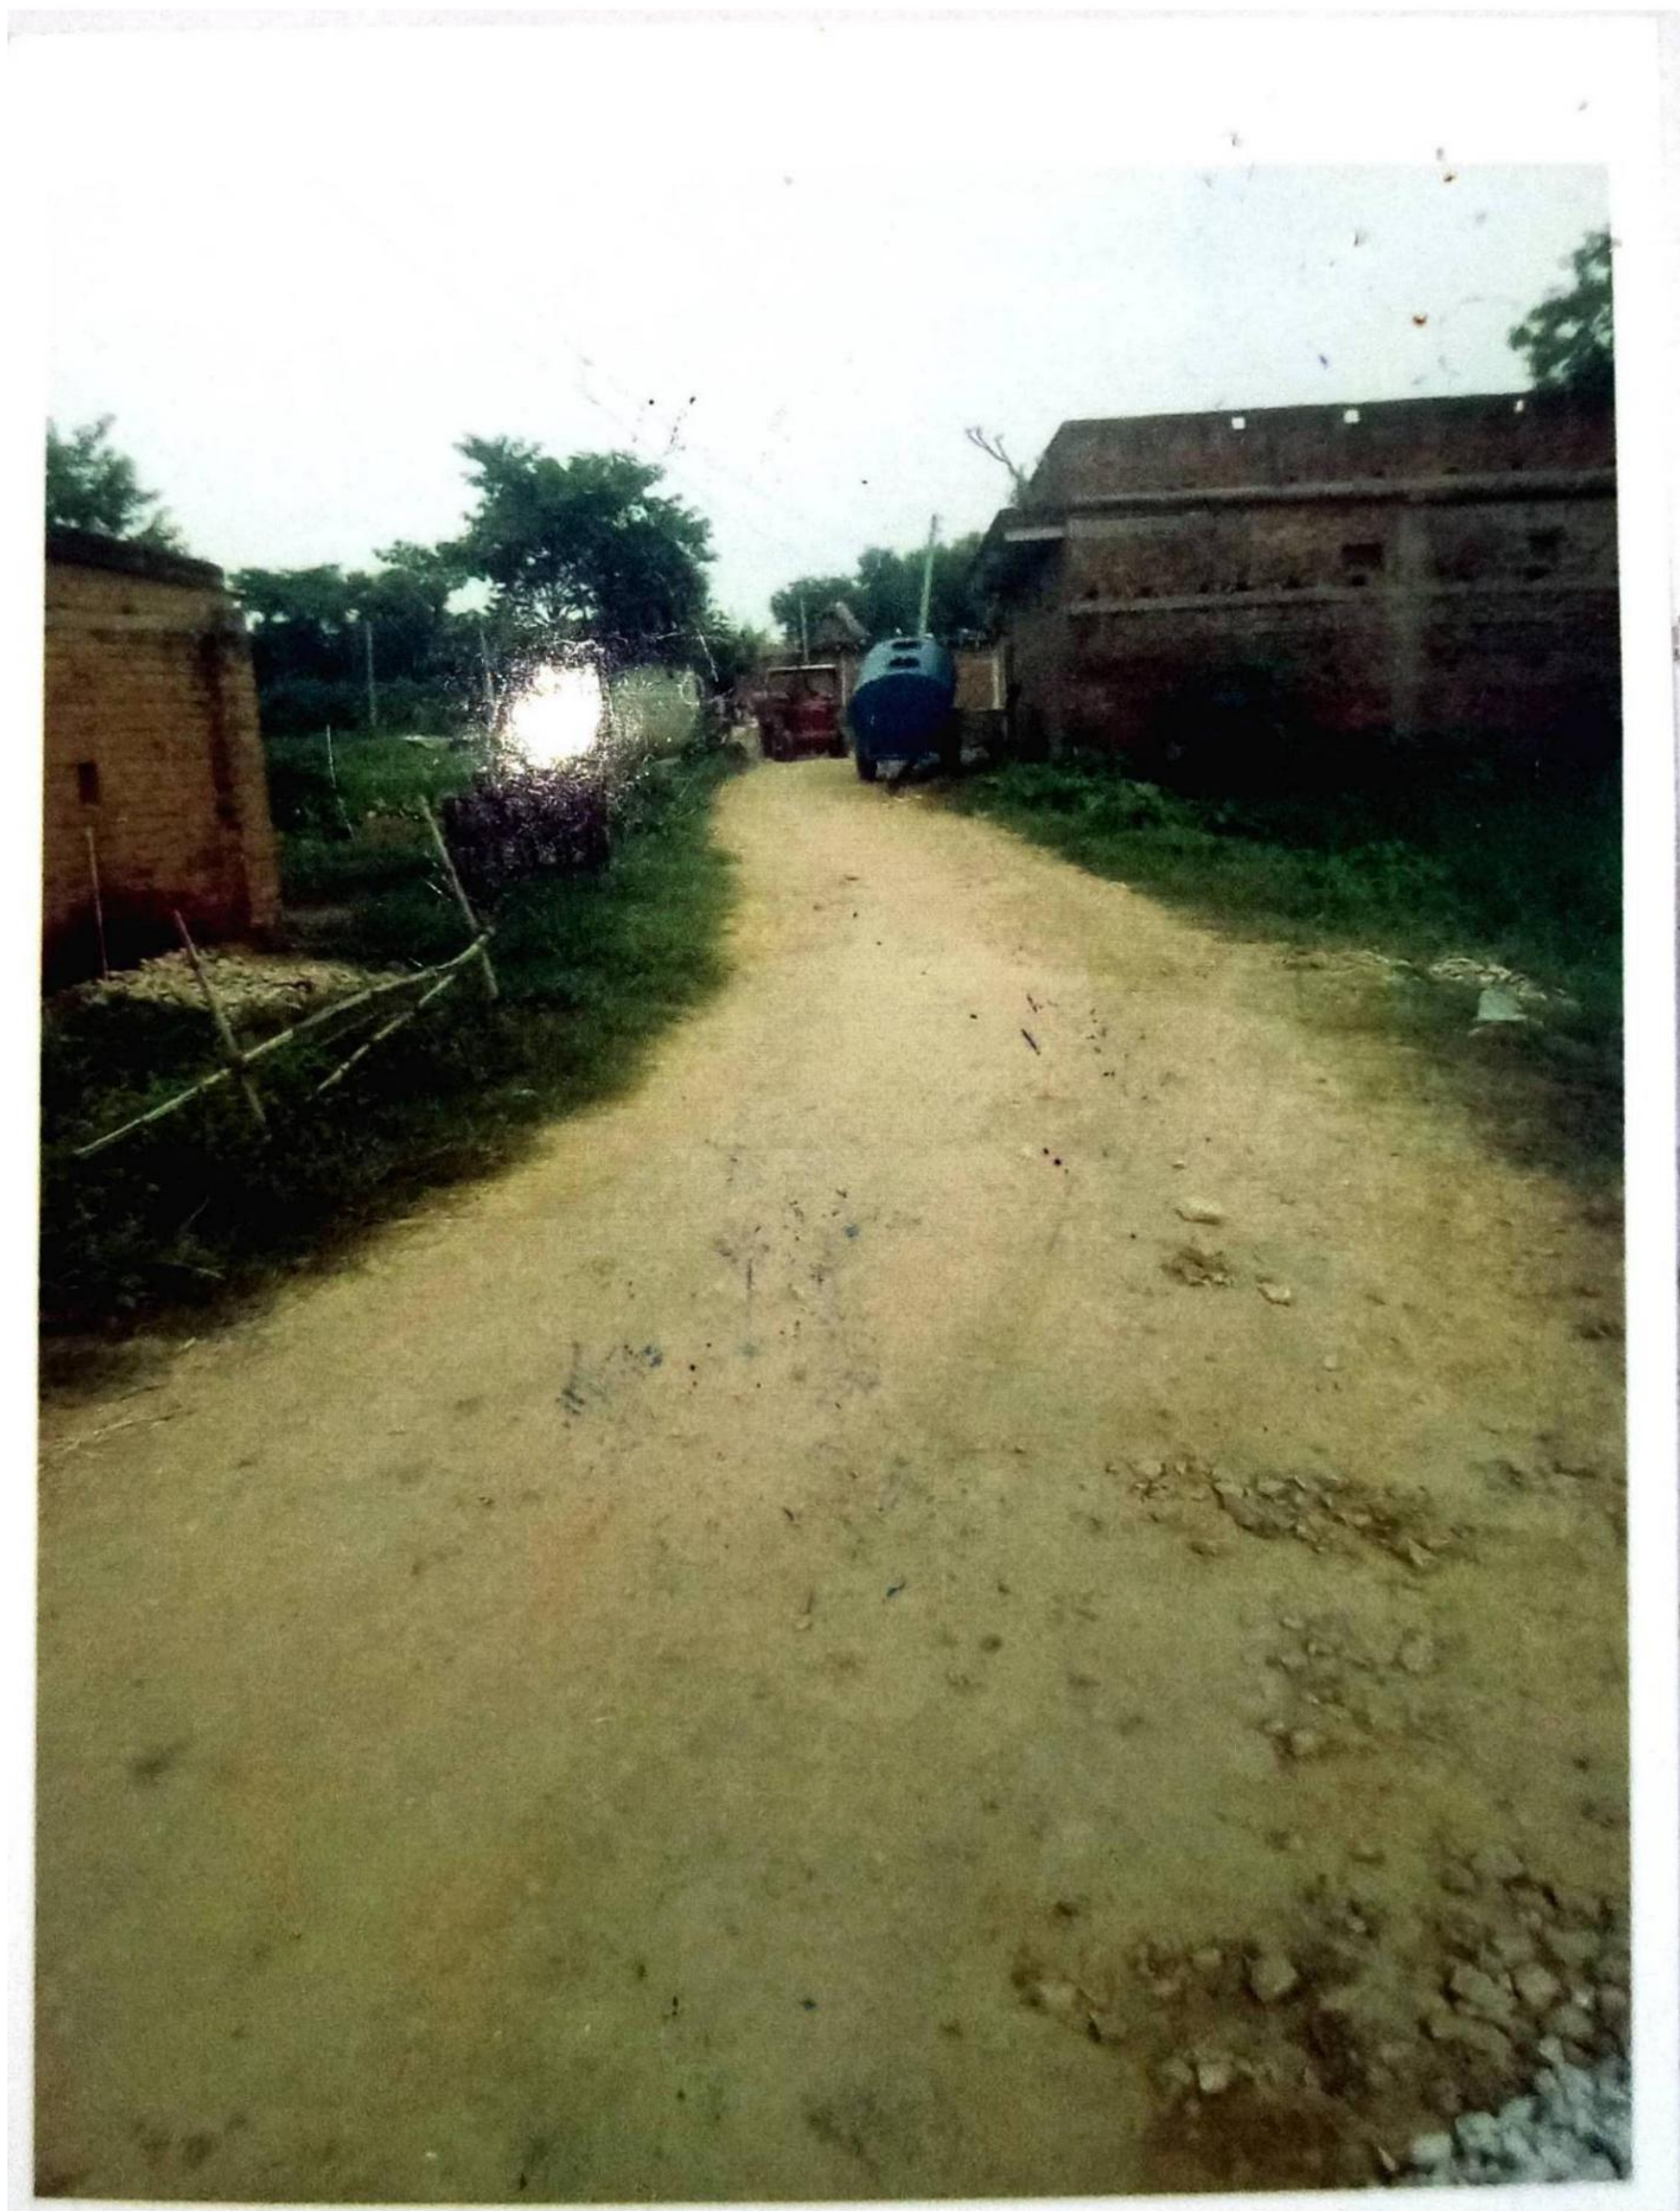


Dr. RWD Birkraungay
Road:- TD3 (Sarna Distributor) to
Datiapur
Head - PCLAS (Rescind Road)

Ravi
02/06/2020
S.E.

Prasad
02.06.2020
J.B.

P.elli
21/6/20
E.E.



Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

Division:- RWD Birkamganj

Road:- T03 (Sarda Distributory) to Salitpur

Head:- PMHSY (Reseined Road)

Prash
22/06/2020
J.E

Prash
2.06.2020
AE

PMHSY
21/6/20
EE



Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Division:- RWD Bikramganj

Road:- T03 (Sarna Distributory) to Dabithpur

Head:- PMHSY (Reseined Road)

Ranish
02/06/2020
D.E

Pratap
02.06.2020
AK

P.N.M
21/6/20
K



Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner



Dim:- RWD Birkomgarh

Road:- Toz (Sorrow Distributor) to Dalitpur

Head:- PMHSY (Reseined Road)

Ranvir
02/06/2020
T.E

Prasanna
2.06.2020
A

Pr
26/6/20
E



Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Division:- RWD Biskampang

Road:- To 3 (Sorena District) to Solitpur





Head:- Primary (Retained Road)

Passer
02/06/2020
J.V.

Passer
02.06.2020
J.V.

Passer
2/6/20
E.C.

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- T03 (Sarna distributory) To Salitpur
2. Name of Agency :- ABHISHEK KUMAR
3. Date of written order to commence the work :- 28/12/2018
4. Contract date of the Completion :- 27/12/2019
5. Extension date of the Completion :-
6. Agreement No. :- 22 PMHSY (2018-2019)
7. Upto date Payment :- 4,87,559.00
8. Agreement Value :- 11714154.00 (one crore seventeen lakh four thousand one hundred fifty four)
9. Time applied for :- 25/11/2020
10. Cause of extension of time :- (i) Due to Public Hindrance.
(ii) Due to Revise of Estimate
(In under process)
11. Signature of contractor with date :- Abhishek Kumar 02/06/2020
12. Recommendation of Junior Engineer :-  02/06/2020
13. Recommendation of Assistant Engineer :-  02.06.2020
14. Recommendation of Executive Engineer :-  2/6/20
 19/6/20
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंकल, सासाराम



बिहार BIHAR

19 AUG 2020

SHOUPUR, ARRAH

फाइल 4292 दिनांक 2-9-2020 100/- अभियंता कुमार
श्री. वशिष्ठपुरी न्यू उपविधि पार्क आरा
who is identified by Shree
Advocate
solemnly affirmed and declared
as fore and
No 8760
Public Govt of Bihar

समक्ष

लेख्य प्रमाणक,

आरा, भोजपुर ।

शपथ-पत्र


मैं, अभियंता कुमार, पिता- उदय शंकर ओझा, पता- मुहल्ला- वाशिष्ठपुरी,
न्युपुलित लार्डन आरा, पोम्थाना- नवादा, आरा, जिला- भोजपुर बिहार,
शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ ।
2. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ ।
3. यह कि पथ का नाम दो, 03 सरणा डिस्ट्रो ब्यूटरी से दलितपुर,
(TO 3)
पैकेज सं-बो. आर. -2 आर. 004 है। कार्य किया जा रहा है।
(B.R.-28R-004)

यह कि मेरे द्वारा जमा किया गया सभी कागजात सही वो सत्य है ।

यह कि कार्य समयपूर्व नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है
सत्यापन

शेष पृष्ठ..... 2पर



-2-

सत्यापन



मैं: अपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस अपथ-पत्र की कंडिका 1 से 5 तक
लिखी गई सारी बातें मेरे व्यक्तिगत जानकारी में सही वी सत्य है।

उत्प्रेक्षित पुमान

अपथकर्ता

I identify the Dependant
who has/have signed above L.T.
as my dependant
H. S. K. K. K.
29/10/2020

ABHISHEK KUMAR
(Govt. Contractor & Supplier)

Mob: 8114544363

E-mail: abhishek010692@gmail.com

Address:

Vashishthpuri, New Police Line
Chandwa, Ara - 802312

Ref.....

Date: 16/07/2019

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
बिक्रमगंज /

विषय:- कार्य T03 (Samma Vintambur) से दलितपुर के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त कार्य PMDSY योजना के कार्य T03 (Samma Vintambur) से दलितपुर ' जिसकी एकराया 22 PMDSY/2018-2019 है।

संगीत
16/7/2019

जिसका कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था परन्तु कार्य करने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य अवरुद्ध यह कह कर किया जा रहा है कि उपर्युक्त सड़क निर्माण

SDO JH Binayak हेतु कुछ एक्ल निजि है चूंकि कार्य हेतु निर्माण सामग्री उसी पथ से लेकर ले जाना होता जिसमें सामग्री ले जाने पर अवरोध किया जा रहा है। अतः निर्माण कार्य रोक जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपर्युक्त निर्माण के संबंध में दिशानिर्देश देने कि कृपा कि जाए।

आपका विश्वासी

अभिषेक कुमार

Reg. No:- 2170388

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक 1524 / बिक्रमगंज / दिनांक 31/12/2019

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

संवेदक,
अभिषेक कुमार,
भोजपुर, आरा।

विषय:- आपके पथ T03 (Sarna Distributory) से बलितपुर
कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा सूचना दी गई थी उक्त पथ में कुछ स्थल पर अवरोध किया जा रहा था, जिसका निवारण हो चुका है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पथ में कार्य पुनः प्रारम्भ कराकर अधोहस्ताक्षरी को यथा शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन

P. Neelam
31/12/19

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

ABHISHEK KUMAR
(Govt. Contractor & Supplier)

Mob: 8114544363
E-mail: abhishek010692@gmail.com

Address:
Vashishthpuri, New Police Line
Chandwa, Ara - 802312

Ref.....

Date.. 03.01.2020

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
बिक्रमगंज /

विषय: - कार्य TO3 (Samma Distribution) से दलितपुर के संबंध में।

महोदय,

संगीता
3/1/20
SDO / JE Minn
P. N. N.
3/1/20

उपरोक्त कार्य PMDSY योजनागत कार्य TO3 (Samma Distribution) से दलितपुर जिले की एकलपनाम 22 PMDSY/2018-2019 Date 02.01.2019 है। उपरोक्त निर्माण में अवरोध के कारण कार्य बंद किया गया था। जिले की सूचना विभाग को दि जा चुकी थी। परन्तु सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के अवकाश प्रयास से ग्रामीणों को समझाने के बाद कार्य पुनः प्रारम्भ कि जा रही है।

अतः श्रीमान को सूचना दी।

आपका विश्वासी

अभिषेक कुमार

Reg. No.: - 2470388

Name of work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement -
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
Name of work	To 3	(Sarna distribution)		
	To	Dulit Pro		
		KBR-28R-004		

Agency - A. Bishek Kumar
 Agr. No. - 22 PMGSY/2018-19

Date of start -
 Date of comp -

Date of measurement -
 1. Providing and fixing

typical PMGSY information

Sign board & Citizen

Sign board Qty = 2 Nos

2. Providing G.S.B. well

Graded Material Patch

$5 \times 3.5 \text{ m} \times 0.75 \times 0.125 = 1.6 \text{ m}^3$

$8 \times 7.5 \text{ m} \times 1.50 \times 0.100 = 9.0 \text{ m}^3$

$2 \times 4.50 \text{ m} \times 2.50 \times 0.110 = 2.48$

$8 \times 5.00 \text{ m} \times 3.05 \times 0.120 = 14.64$

$1 \times 4.25 \text{ m} \times 2.30 \times 0.122 = 1.19$

$1 \times 2.20 \text{ m} \times 1.50 \times 0.100 = 0.33$

$1 \times 3.00 \text{ m} \times 2.00 \times 0.100 = 0.60$

Continuation

Qty = 29.87 m³
 02/11/2019
 S.K.

19/6/20

अधीक्षण अभियन्ता
 राष्ट्रीय कार्य विभाग
 कार्य अंश, रासना

अधीक्षण अभियन्ता
 राष्ट्रीय कार्य विभाग
 कार्य अंश, रासना

Record Measurement

Sch. XLV-Form No. 134 2

Particulars

Name of Work

Agency - Abhishek Kumar

Aggr. No. - 92 PMSY/2018-19

Date of Start

Date of Completion

Date of Measurement

W.B.M. LT-2 Pitch

Details of actual measurement

No.	L.	B.	D.	Contents of area
1	4.25	2.30	0.75	0.98 m ³
2	3.75	2.00	0.75	6.75 m ³
3	3.25	2.00	0.75	1.68 m ³
4	2.75	2.00	0.75	0.73 m ³
5	2.25	2.00	0.75	0.45 m ³
6	1.75	2.00	0.75	0.27 m ³
7	1.25	2.00	0.75	0.19 m ³
8	0.75	2.00	0.75	0.11 m ³
9	0.25	2.00	0.75	0.04 m ³
10	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
11	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
12	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
13	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
14	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
15	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
16	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
17	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
18	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
19	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
20	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
21	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
22	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
23	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
24	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³
25	0.00	2.00	0.75	0.00 m ³

Signature of Surveyor

Signature of Engineer

Signature of Inspector

Signature of Peon

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Abstract of bill

Name of work - T/O 3 (Soma district)
To Dalitpur

Agency - Abir K Kumar
Ag No - 22 PM 155 2018-19

Date of start -
Date of completion -

1) Providing and fixing
12) Physical survey information

and citizen board
Qty = 2 nos item no-6 PS No-17
@ RS 115/035 - RS = 22438.00

2) Loading, leveling and
compaction soil
Qty = 247.50 m³ vide item no-2 PS No-16
@ RS 215/- RS = 53212.50

3) Construction of Embankment
with obtaining from borrow pit
Qty = 1290.68 m³ vide item no-2 PS No-17
@ RS 165/- RS = 214992.50

4) Construction of Subgrade
in earthen portion
Qty = 253.26 m² vide item no-1 PS No-25
@ RS 168/- RS = 42545.72

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134 30

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area	Its area
	No.	L.	B.		
5) Reinforcement					
14) km stone			concrete		
i) Provision and fixing km					
Qty = 4 nos item no - 60 PS No - 28					
@ RS 2352.56					
RS = 9410.00					
ii) Provision and fixing m					
Qty = 12 Nos vide item no - 60 PS No - 28					
@ RS 635.52					
RS = 7674.00					
6) construction of W.B.M					
5) W.B.M material + do -					
Qty = 254.87 vide item no - 5 PS No - 17					
Qty = 221.58 vide item no 9 PS No - 28					
Qty = 236.15					
Qty = 253.125					
@ RS 2945.54 - RS = 745589.00					
7) Provision and laying					
6) W.B.M (4-11)					
Qty = 116.68 vide item no - 4 PS No - 17					
Qty = 134.55 vide item no - 3 PS No - 28					
Qty = 251.231					
@ RS 5081.72					
RS = 1276686.00					
8) Provision and laying					
7) W.B.M (4-11)					
Qty = 281.262 vide item no - 5 PS No - 17					
Qty = 353.37 vide item no - 4 PS No - 28					
Qty = 639.632 vide item no - 3 PS No - 28					
Qty = 639.632 m ³					
@ RS 4642.84					
RS = 2990000.00					
9) Provision Subgrade in earth					
Shoulder					
Qty = 711.64 m ³ item no - 5 PS No - 28					
@ RS 168.10					

Continuation
