

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़**

पत्रांक ३५४३/मु.प. / बाढ़ / दिनांक 1.01.21/2021.....
प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय :- शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 वल्ड बैंक योजनान्तर्गत Bihari Bigha Chowk to Kondi तक पथ निर्माण का समय-वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 वल्ड बैंक योजनान्तर्गत Bihari Bigha Chowk to Kondi तक पथ निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है।

1. स्थाल विडियो ग्राफी का सी0डी0
2. (1) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 29.06.2019 है।
(2) एकरारनामा के अनुसारकार्य पूर्ण करने की तिथि 25.06.2020 है।
3. कार्य विशेषियों के अनुरूप किया जा रहा है। अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।
4. संलग्न सी0डी0।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि का एम0आई0एस0 में ऑनलाईन प्रविष्ट करार कर समय वृद्धि के प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।
अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/07/21
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1 Name of Contractor :- M/S Sundar Nirman

2 Name of Work :- Bihari Bigha Chowk to Kondi

3 Agreement No. & Date :- 01/MBD/2019-20 26/06/2019

4 Agreement Value :- 1,9737,250 /-

5 Date of Commencement :- 26/06/2019

6 Original Date of Completion :- 25/06/2020

7 Extension Previously Granted or not :- NOT

8 Extension applied for :- 30/04/2021

9 Head :- M.M.W.S.Y (W.B)

10 Percentage of Work Done :- 60%.

11 Reason of Hindrence :- Flood and covid 19

12 Recommendation by J.E. :- B/E
8/03/21

13 Recommendation by S.D.O. :- R/O J-E
8/3/21

14 Recommendation by the
Executive Engineer :- A.E

15 Recommendation by S.E. :-

16 Final Order of the C.E. :-

10/03/21
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Rajesh Kumar

Signature
of the Contractor

ॐ

TIN VAT : 10021031007

M/S SUNDER NIRMAN

CIVIL, ELECTRICAL, MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS
SAHJANAND NAGAR, BARH, PATNA-803213

Ref No

DATE 22/05/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़।

विषय :- एम0एम0जी0एस0वाई0 वल्ड बैंक, योजनान्तर्गत बिहारी विगहा चौक से कोन्दी पथ निर्माण के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पुर्यक कहना है कि एम0एम0जी0एस0वाई0 वल्ड बैंक, योजनान्तर्गत बिहारी विगहा चौक से कोन्दी पथ निर्माण का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है जिसका कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 25.06.2020 है परन्तु जैसे ही मेरे द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया वैसे ही अतिवृष्टी/बाढ़ आ जाने के कारण पथ का कार्य अवरुद्ध हो गया तत्पश्चात् मेरे द्वारा पुनः कार्य प्रारंभ किया गया तो कोवीड-19 (करोना)के कारण पुनः लोकडाउन हो जाने के कारण पुनः कार्य बाधित हो गया है जिसके कारण कार्य करने में विलम्ब का समना करना पर रहा है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे अतिरिक्त समय देने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी


Rajesh Kumar

बाढ़ की आहट • ताल की नदियां उफान पर, फतुहा में पुनपुन और धोवा का पानी कई गांवों में घुसा, दहशत में लोग पंडारक टाल में धनार्जन ने बांध तोड़ा, तीन गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों ने स्कूल में ली शरण

प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने शुरू की बांध की मरम्मत

मिथी रिपोर्टर | बाढ़

पंडारक के ताल क्षेत्र से गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। नदी के पानी में हुई बेतहाशा वृद्धि के कारण ताल क्षेत्र के कई गांवों में नदियों का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे सैकड़ों परिवार गांव से बाहर निकल कर उत्कर्मित मध्य विद्यालय-लालपुरा में शरण लिए हुए हैं। इधर, गांव में पानी घुसने के बाद पंडारक के वीडोओ, सीओ, इंजीनियर समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। इस संबंध में चक जगमल निवासी ग्रामीण गणेश यादव ने बताया कि मंगलवार की सुबह धनार्जन नदी अचानक बांध को तोड़ते हुए तथा बांध के ऊपर से बहने लगी, जिससे गांव में पानी प्रवेश करने लगा, जिसके बाद स्थानीय जानकारी प्रशासन को दे गई। इधर, ग्रामीण खुद राहत कार्य में जुट गए और बोरी में मिट्टी भरकर बांध को मजबूत करने लगे। लेकिन, पानी का फ्लो ज्यादा होने के कारण देखते ही देखते गांव में पानी फैलना शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले तो आसमानी कहर उनपर रही है लेकिन अब नदियों का कहर रूढ़ि ले रहा है। प्रभावित गांवों में मुख्य रूप से लालपुरा, चक जगमल तथा निरपुर टोला हैं। इस बीच में एसडीएम ने बताया कि पानी फ्लो लेकर ताल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित



बेलछी में गोईटवा उपग्रन पर

दूसरी ओर, बेलछी प्रखंड से गुजरने वाली गोईटवा नदी भी लवालब भरी हुई है। इससे गंदी किनारे स्थित गैंगवरपुर, जगजानपुर तथा घेरा गांव के लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि पिछले तीन दिनों से नगी किनारे में बोरी में बालू और मिट्टी भरकर किसी तरह से रोकथाम की जा चुकी है। लेकिन, गिरीसी भी सम्प बांध टूटकर इन गांवों में पानी प्रवेश कर सकता है। प्रशासन इसपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। पंचाने नदी का भी पानी तेजी से बढ़ रहा है।


गंगा का बढ़ा पानी डरा रहा

पिछले 36 घंटों में गंगा के पानी में भी धीरे-धीरे वृद्धि होने से राम नगर दियारा के लोगों को भी एक बार फिर डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि पहले गंगा उसके बाद आसमानी कहर से उनकी कमर पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन, एकबार फिर गंगा के पानी में धीरे-धीरे हो रही वृद्धि से उनकी समस्या बढ़ती

फतुहा के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके बाढ़ की चपेट में, फसलें डूबीं, सड़क पर बह रहा है पानी

मिथी रिपोर्टर | फतुहा

पुनपुन व धोवा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रखंड के दक्षिणी इलाके के साथ-साथ पश्चिमी इलाका भी पूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में आ गया है। जहां धोवा नदी ने बरुणा गांव के पूर्व खांड बनकर पूरे धान के खेत को डूबो दिया है। वहीं दोस्त मोहम्मदपुर के मध्य विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नियाजीपुर गांव में सड़क को काटकर धोवा नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी भाग को देखा जाए तो पुनपुन नदी का पानी नैना, डुमरी, रानीपुर को एरा डूबो चुका है। सड़क पर भी पानी बहने लगा है। धान के खेत पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।



कई जगहों पर सड़क कट जाने से आवागमन बिल्कुल बंद है। जिला पापंद सुधीर यादव ने प्रखंड को डूबी कई पंचायतों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की सरकार से मांग की है।

दरधा का कहर : धनरुआ की 20 पंचायतों में से 19 जलमग्न

मिथी रिपोर्टर | मलौधी

धनरुआ प्रखंड के चारों दिशा न अंगारु में कई जगहों पर सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक दरधा नदी का तटबंध टूटने से धनरुआ प्रखंड की स्थिति और भयंकर हो गई है। इस प्रखंड की कुल 20 पंचायतों में से 19 पंचायतों के गांवों या खंडों में पानी घुस आया है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की रात संध्या 3:30 बजे के बाद पानी

जगहों पर दरधा नदी का तटबंध टूट गया। इससे दर्जनों गांव और खंडों में पानी घुस आया। साथ ही कई किंक पथ का संपर्क मुख्य सड़क से भंग हो गया। एसएच 01-मंडा पथ, एसच 01-केशुव-पथरह पथ, नरुआ-सोमई पथ भाया चौरपुरा, एसच 01-वीर, एसएच 01-भरारी पथ, धनरुआ-नरुआ पथ एसच-01-रमनीशपुरा पथ



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़

पत्रांक 349 / बाढ़ / दिनांक 10/3/21

अधस्तग कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स सुन्दर निर्माण, सहजानन्द नगर, बाढ़, पटना द्वारा एम0एम0जी0एस0वाई0 वल्ड बैंक योजना के तहत पटना जिला अन्तर्गत बिहारी विगहा चौक से कोन्दी तक पथ का निर्माण कार्य कराया गया है जिसका एकरारनामा संख्या 01/एम0बी0डी0/2019-20 एकरारनामा की राशि रुपये 1,97,37,250.00 मात्र है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 26.06.2019 एवं समाप्ति की तिथि 25.06.2020 है। आज की तिथि में संवेदक द्वारा 1700 मीटर का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं शेष स्थल विवादीत है। 1700 मीटर का कार्य पूर्ण कराने की वास्तविक तिथि 23.02.2021 है एवं कराये गये कार्यों के विरुद्ध रु0 83,90,836.00 रुपये मात्र का विपत्र प्रमंडल कार्यालय को प्राप्त है। संवेदक द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद है।


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
बाढ़

Name of Work -
Situation of work - work is executed
Agency by which
Measurement -
Measurement -
Contents

Binari Bagra chawki to Kandi

Schedule XLV-Form No.-134

Agency - M/s Sunder & Nirmal DIVISION
SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

Date of Agency - 26.06.19
Date of Completion - 25.06.20

375

Attested
10/03/21
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Name of Work -
Situation of work -
Agency by which work is executed -
Date of measurement -
No. and date of agreement -
(These four lines should be repeated at the commencement
of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ISA on A/C Bill					
M/W:- contract & five year maintenance of the road Bihari Bigha chowk to Kandi.					
Agency:- M/S Sunder Hiemen.					
Ag. value -					
Ag. No -					
Date of start:- 26.06.19					
Date of completion - 25.06.2020					

Re-measurement

① clearing & grubbing road land
including uprooting wild
vegetation - do - do -
 $30 \times 40 \times 6.50 = 7800.00 m^2$
 $= 0.78 \text{ hectare}$

② contract of embankment with
material obtained from borrow
pits with a lift upto do - do -

CH	C/B	mean	Length	Volume
1500	0.571	-	-	-
1550	0.531	0.551	50.0	27.55 ✓
1600	0.460	0.50	50.0	23.00 ✓
1650	0.621	0.575	50.0	28.75 ✓
1700	0.565	0.623	50.0	31.15 ✓
1750	0.585	0.575	50.0	28.75 ✓
1800	0.630	0.607	50.0	30.35 ✓
				171.55 m ³

Continuation

Particulars		Details of actual measurement		Contents
No.	L.	B.	D.	

Sch. XLV-Form No. 134 7

Attested

10/07/21
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>2nd on A/C Bill</u>					
N/Wi - Conson & live year maintenance					
at the road from Bihari Bigha					
chowk to Kondi.					
Agency: - M/S Sunil Kumar Nigam.					
Ag value - AS.					
Ag No: -					
Date of start: - 26.06.19					
Date of completion: - 25.06.2020.					

① cleaning & grubbing road
land including - do - do -
 $17 \times 30 \times 6.50 = 3315.00 \text{ m}^2$

② Conson of embankment with
approved material obtained
from borrow - do - do -

CH	CS	Mean	Length	Volume
0	0.86	-	-	-
50	0.70	0.78	50.00	39.00
100	0.65	0.675	50.00	33.75
150	0.60	0.575	50.00	28.75
200	0.56	0.530	50.00	26.50
250	0.485	0.522	50.00	26.10
300	0.46	0.472	50.00	23.60
350	0.40	0.43	50.00	21.50

Continuation

Particulars

Details of actual measurement

Sch. XLV-Form No. 134

14

Attested

10/03/24
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(13) p.v. & string or typical inter-masonry masonry in masonry sign board - etc - etc -					04 Nos.
(14) p.v. & string or settable crossed sign board - etc - etc -					
(i) 600 mm triangle -					04 Nos.
(ii) 600 mm circulars -					02 Nos.
(iii) 600 mm x 450 mm rectangular sign board -					01 Nos.
(15) p.v. R.C.C. masonry grade work sloped stone or stone masonry design - etc - etc -					
(i) 5th 1cm stone -					01 Nos.
(ii) ordinary 1cm stone -					02 Nos.
(iii) 200 m stone -					07 Nos.
Bd 23/02/21 J.E.					
Rd 23/2/21 A.E.					
Ch 06/02/21					

Sch. XI V.E.

18

Continuation

Attested

8/10/21/4
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF BS.
(iii/24) 600mm x 450mm Rectn.					
gular - 01 Nos vide TMB					
page no (14)					
@ Rs. 5250/each - Rs. 5250/-					
(13/1) Riv R.C.C. M ₁₅ grade K ₁₀ total					
stone - 01 - 01 -					
(14/1) 5th 1m stone - 01 Nos vide					
TMB page (14)					
@ Rs. 4500.00/each - Rs. 4500.00					
(11/5) ordinary 1m stone - 02 Nos					
vide TMB page (14)					
@ Rs. 2500.00/each - Rs. 5000.00					
(iii/16) 200m stone - 07 Nos vide					
TMB page no (14)					
@ Rs. 700.00/each - Rs. 4900.00					
Total Rs. 8390836.00					
Less previous payment (-) Rs. 2097361.00					
Net payable Rs. 6293475.00					
6362764.00					
6293475.00					
23/02/2021					
R/E					
23/2/21					
A.E					

Continuation

Attested

21/2/21
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARH

Authorised Notaries
Act 1952 (53 of 1952)



Book 33 Serial 87 Dated 15 MAR 2021

Deponent A.K. Verma
who is identified by Sr. Advocate Solemnly Affirmed
and declared before me

Arvind Kumar Verma
NOTARY PUBLIC, PATNA
GOVT. OF INDIA

शपथ पत्र

मै, मेसर्स सुन्दर निर्माण पार्टनर राकेश कुमार, सहजानन्द नगर, बाढ़ पटना, पिता श्री अनन्दी सिंह शपथ पूर्वक निम्नलिखित उद्घोषणा करता हूँ :-

1. मेरे द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बाढ़ अंतर्गत एम0एम0जी0एस0वाई0 वल्लू बैंक अंतर्गत ..बिहारी विगहा चौक से जगेन्दी तक पथ निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
2. विभिन्न कारणों से यह कार्य निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं हो पाया
3. आज के तिथि में यह कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण है।
4. समय वृद्धि स्वीकृति के अलावा इससे संबंधित कोई आर्थिक दावा नहीं किया जायेगा।
5. यह कि उपरोक्त तमाम बातें सही एवं सत्य है। अगर उद्घोषणा का कोई अंश गलत पाया गया तो मेरे विरुद्ध जो भी कानूनी कारवाई होगी, वह मुझे मान्य होगा।



Arvind Kumar

शपथकर्ता

Identify Sri/Smt. Deponent
who has Signed in my presence

A.K. Verma
Advocate, En. No. 464/88
15/03/2021

कार्य अंचल अधिकारी, पंडारक

पत्रांक1132.....

दिनांक26.11.20.....

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
पंडारक (पटना)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, बाढ़।

विषय :- बिहारी विगहा चौक से कोन्दी तक पथ निर्माण में कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में।

प्रसंग :- संवेदक सुन्दर निर्माण, का पत्रांक शून्य दिनांक 24.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संवेदक सुन्दर निर्माण के आवेदन के आलोक में सूचित करना है कि बिहारी विगहा चौके से कोन्दी तक पथ निर्माण कार्य में लगभग आधि से अधिक लम्बाई में पथ का कार्य किया जा रहा है परन्तु लगभग 1100 मीटर में ग्रामीणों के द्वारा बाधा उत्पन्न कि जा रही है की उनको पैन से होकर पथ का निर्माण करना है उही पुर्व में अलगा था एवं उसके बगल की जमीन कुल रैयती है। यह सत्य है। लगभग 1100 मीटर जो की पुर्व में रास्ता था उसे काटकर आज की तिथि में पैन बना दिया गया है।


सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन



अंचल पदसधिकारी, पंडारक (पटना)

26.11.20

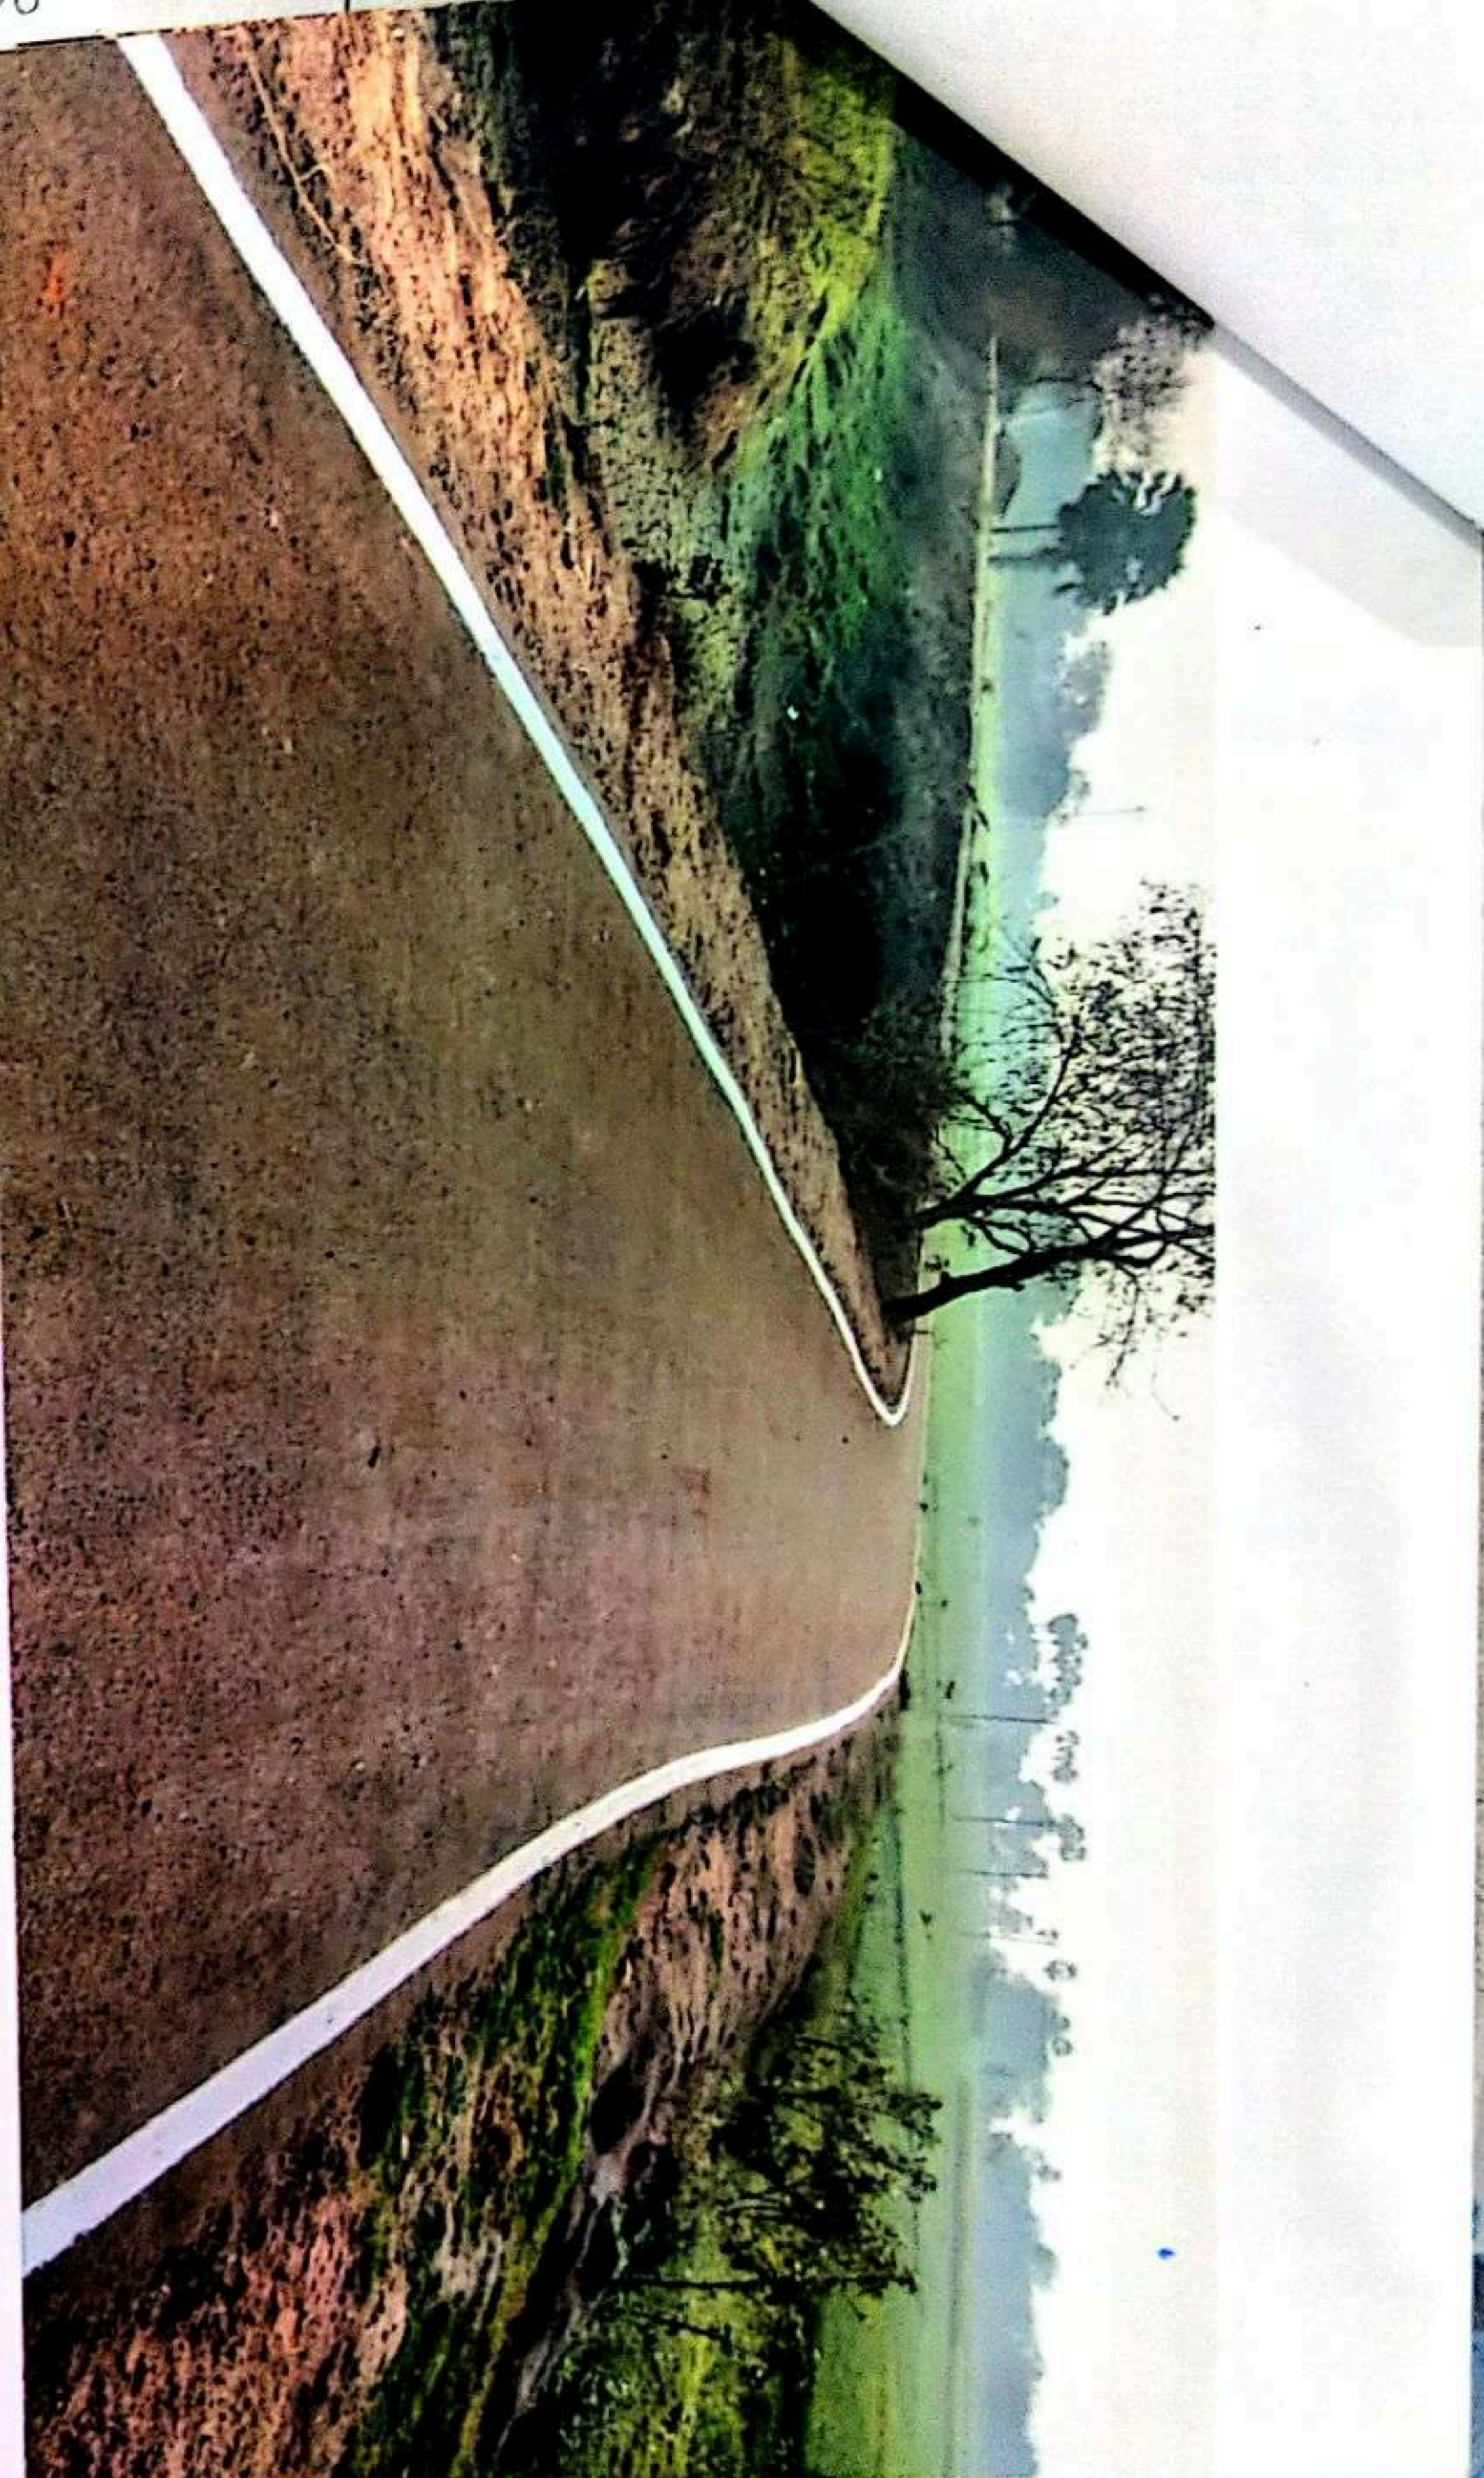

1/11/11 - Bilhavi Bagra Chowka to Kani

~~8/12/21~~
5.15

~~8/12/21~~
A.E


8/12/21

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BAHAI




Scanned with CamScanner



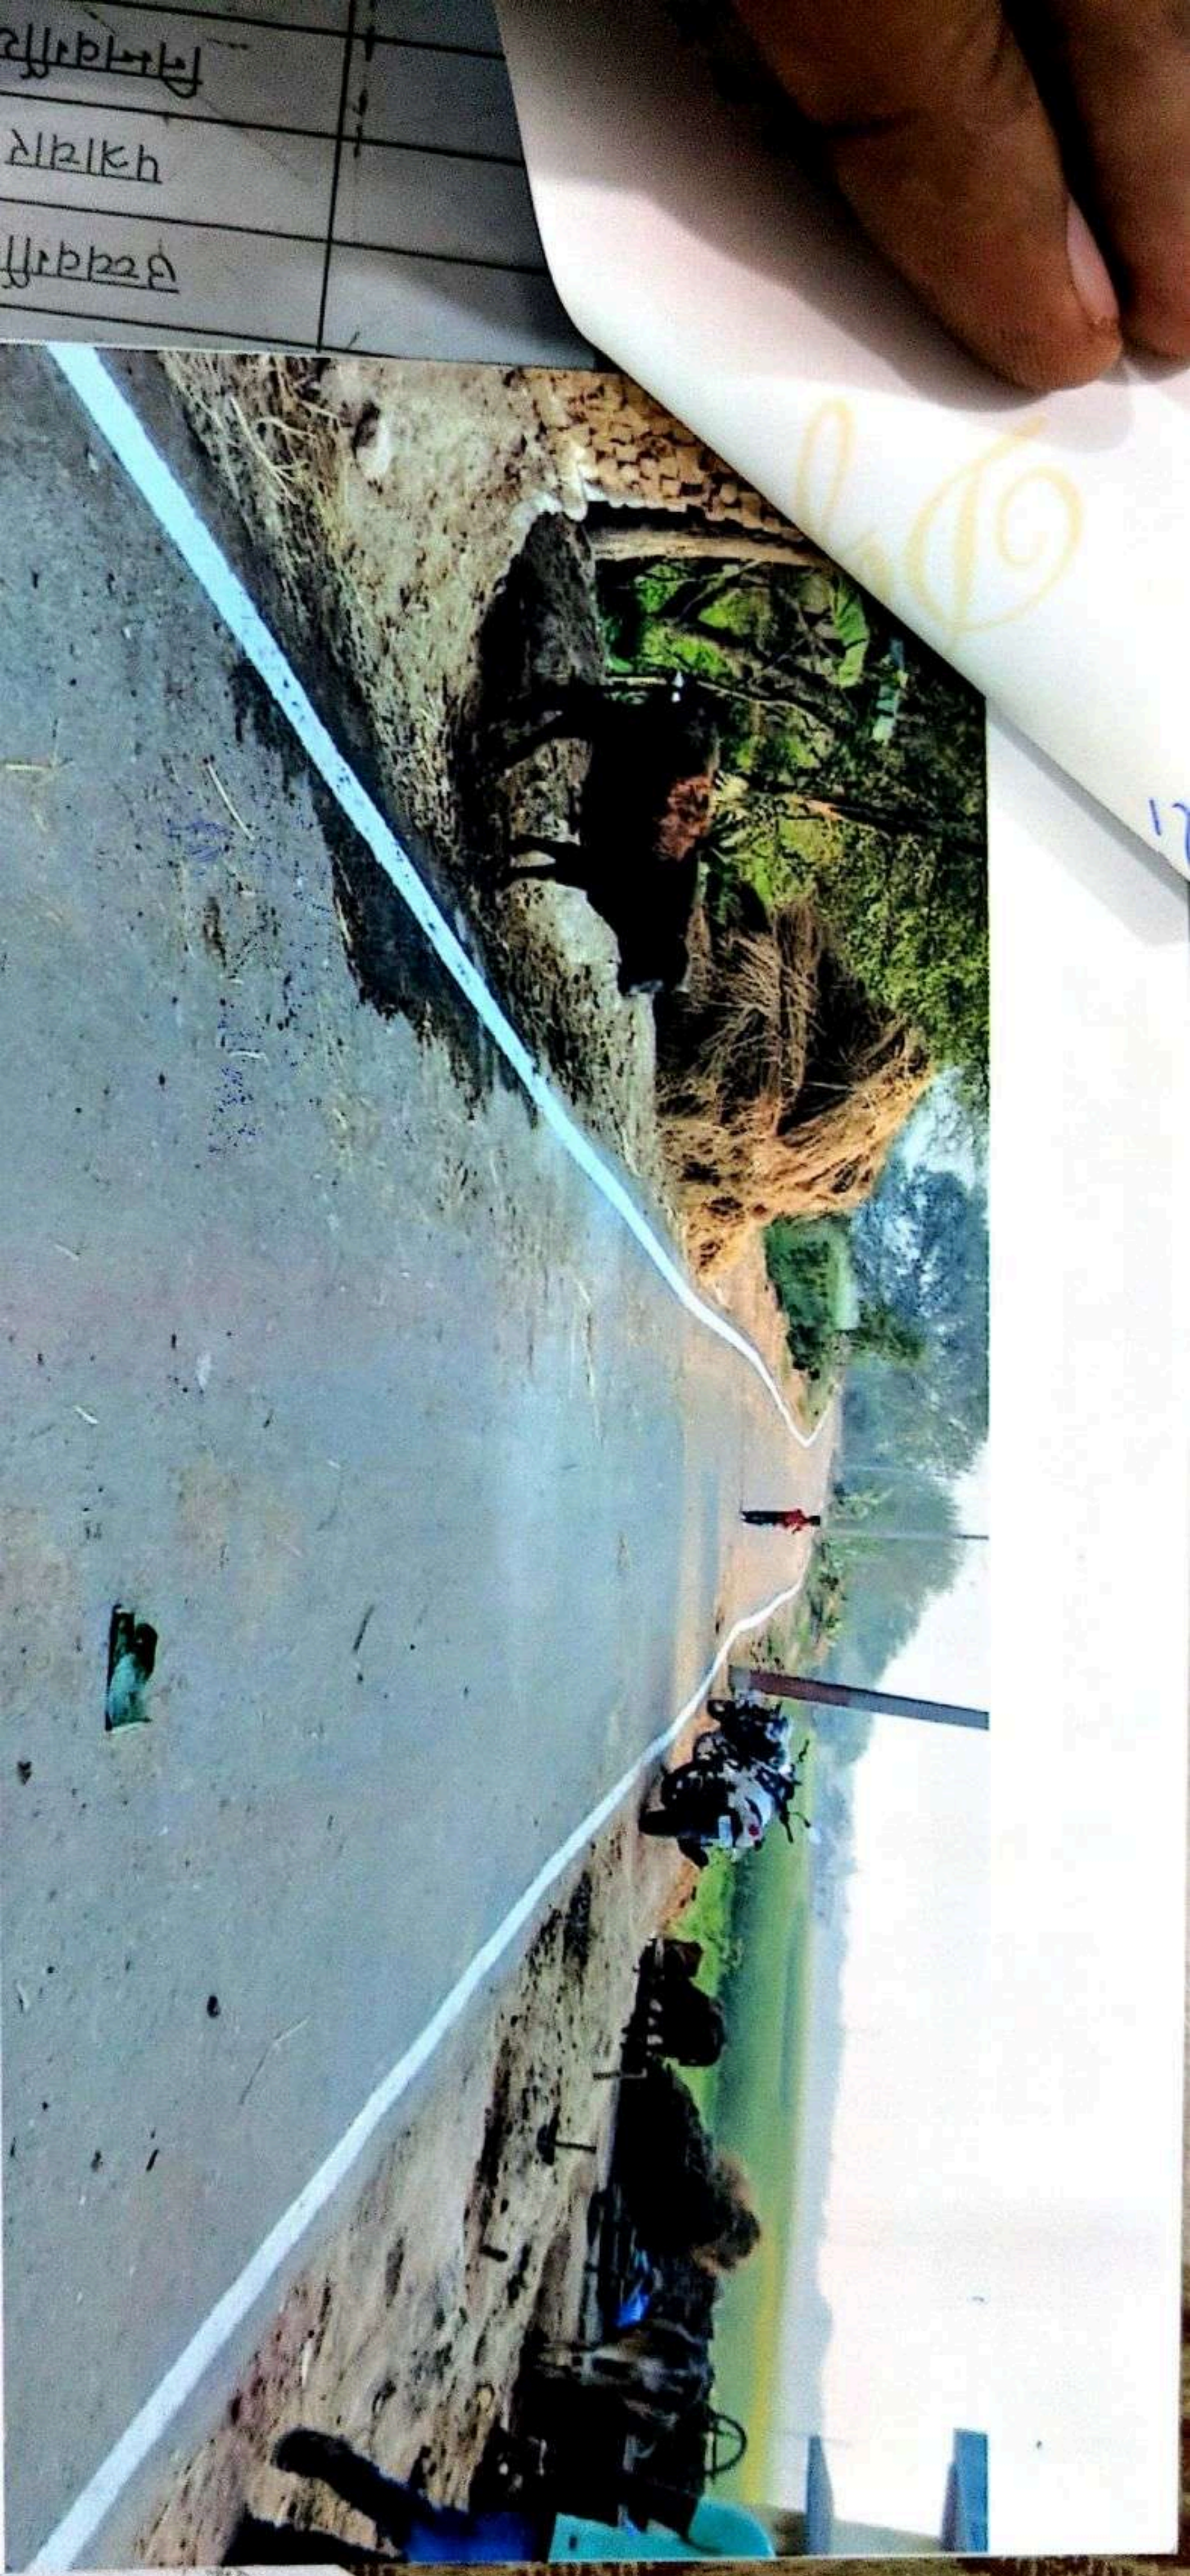

सङ्क का नाम - विद्यार्थी विद्यापीठ का संकाय

भारतीयों का साम सामर्थ्य योजना (विश्व बैंक)

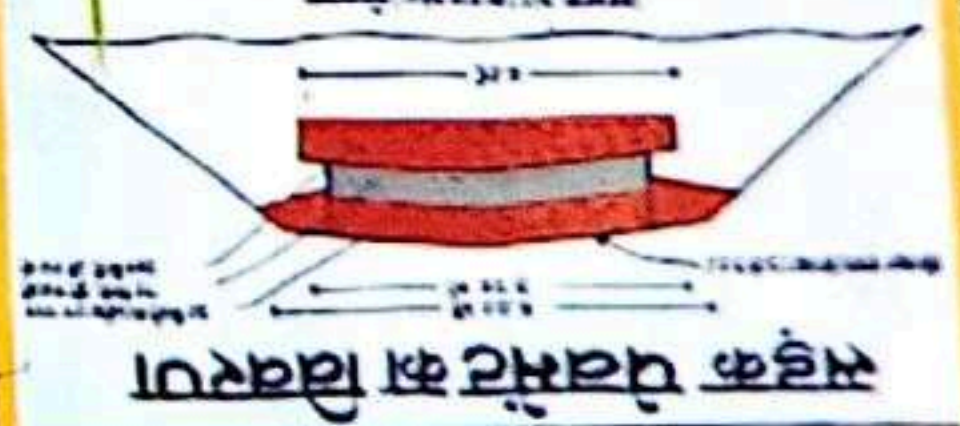


भारतवासी श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् (विश्व बैंक)
विश्व - पटना

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Handwritten text in Tamil script, likely a religious or philosophical manuscript. The text is written on aged, yellowed paper. The script is in a traditional style, and the page shows signs of wear and discoloration. The text is arranged in several lines, with some words written in red ink. The handwriting is in a traditional style, and the page appears to be a single leaf from a bound volume.




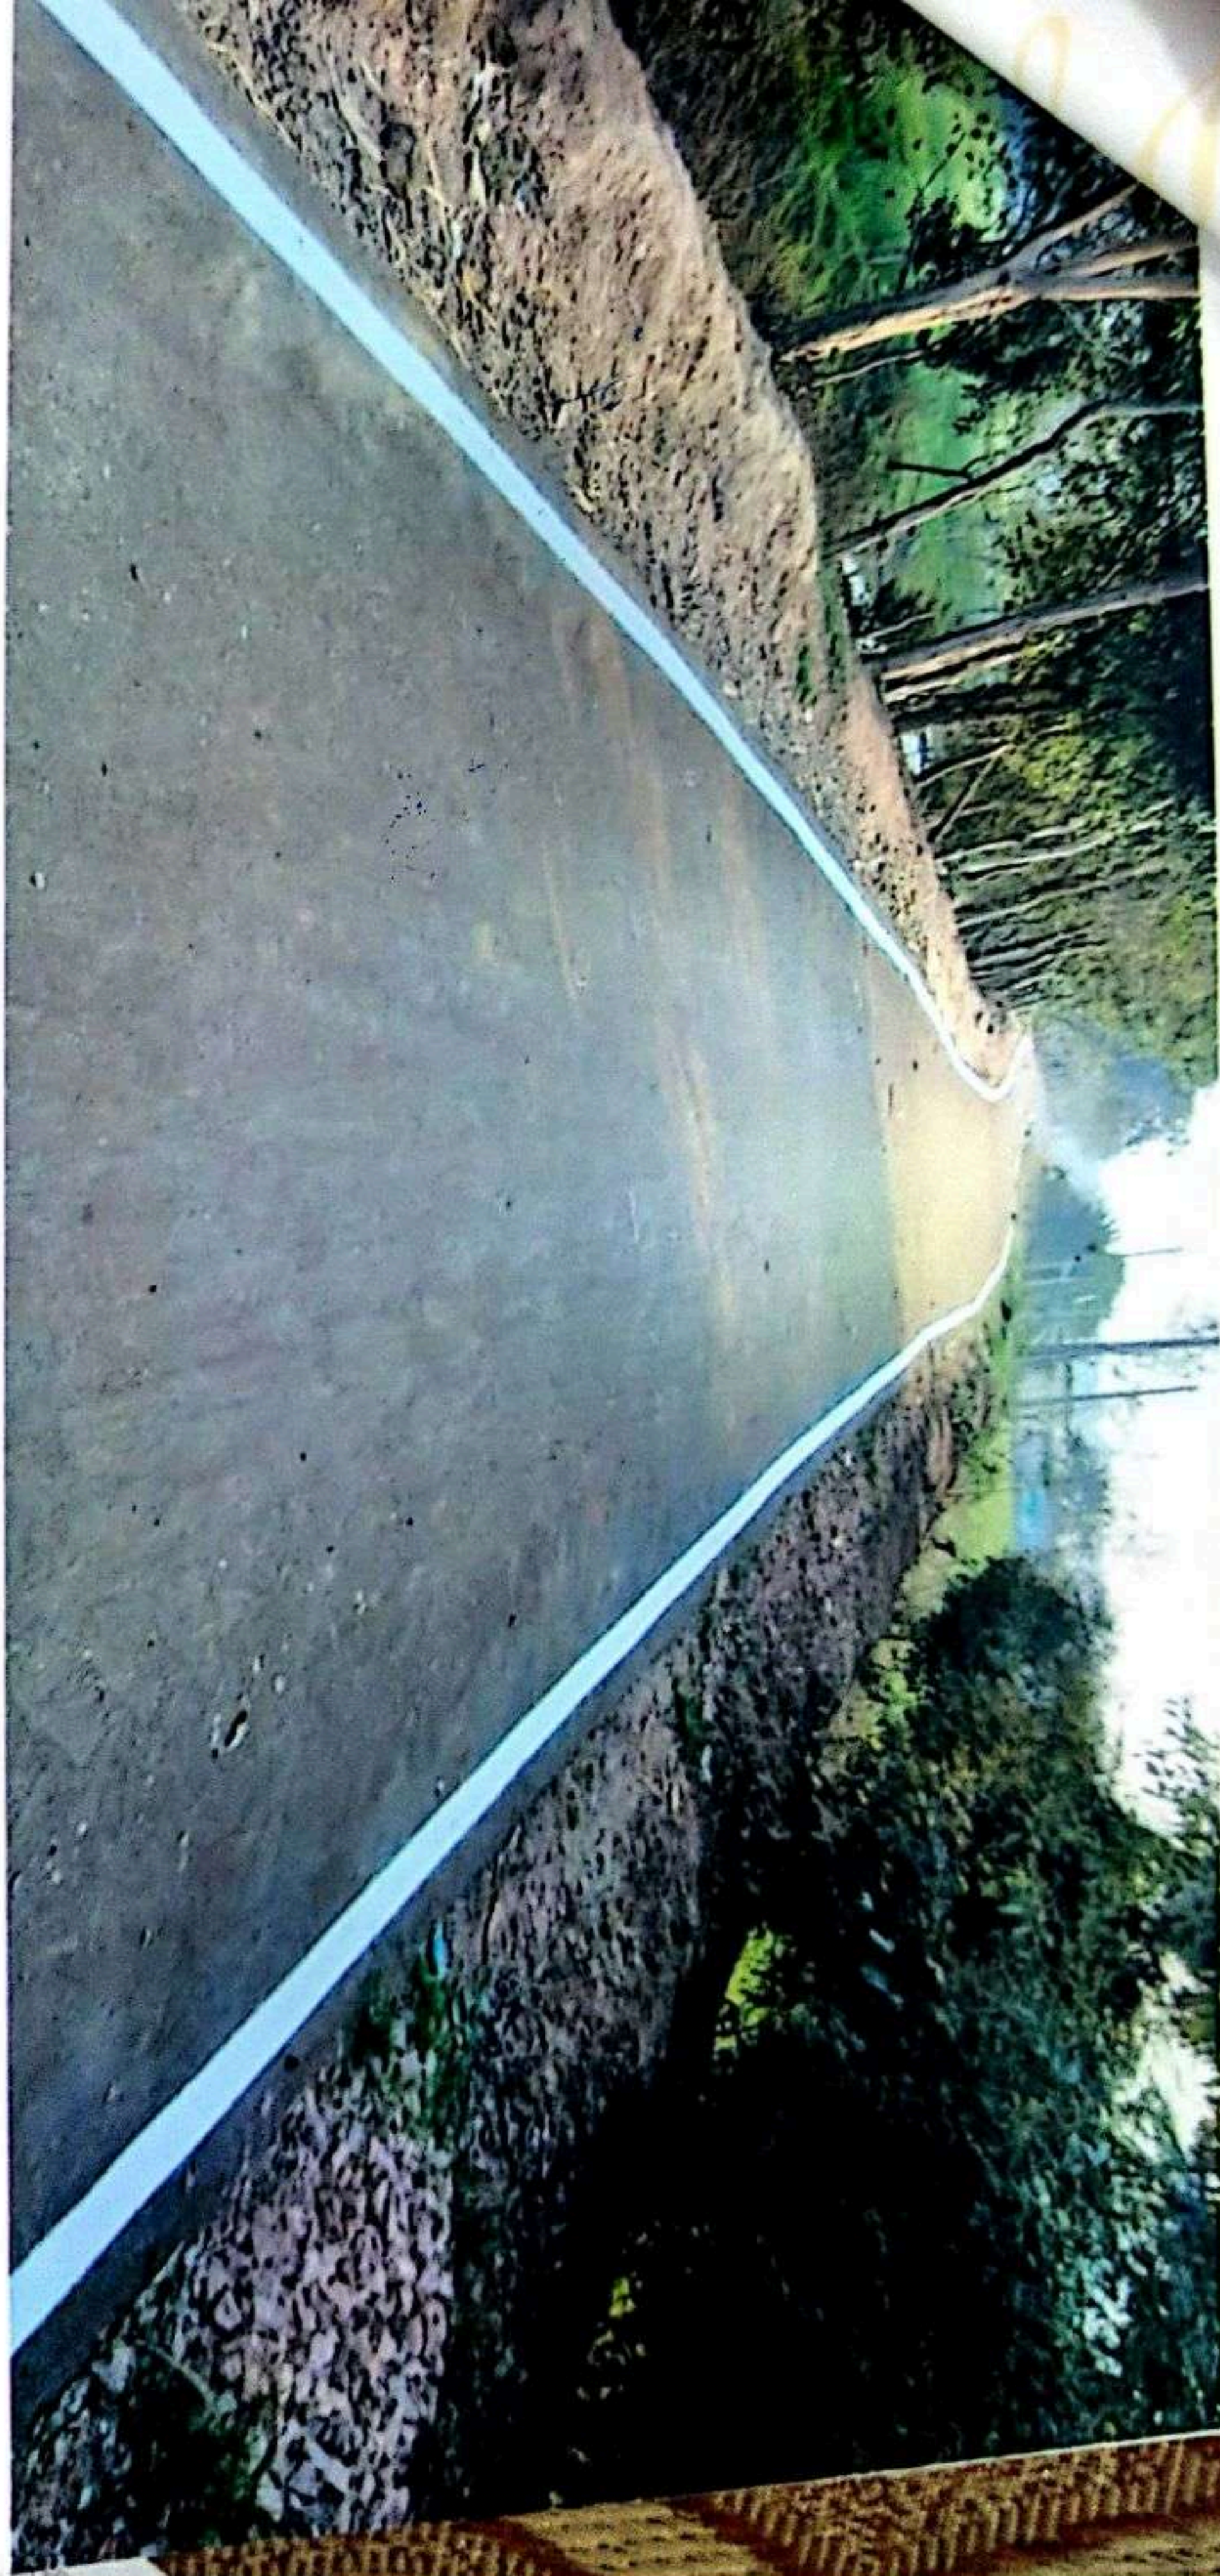





Scanned with CamScanner

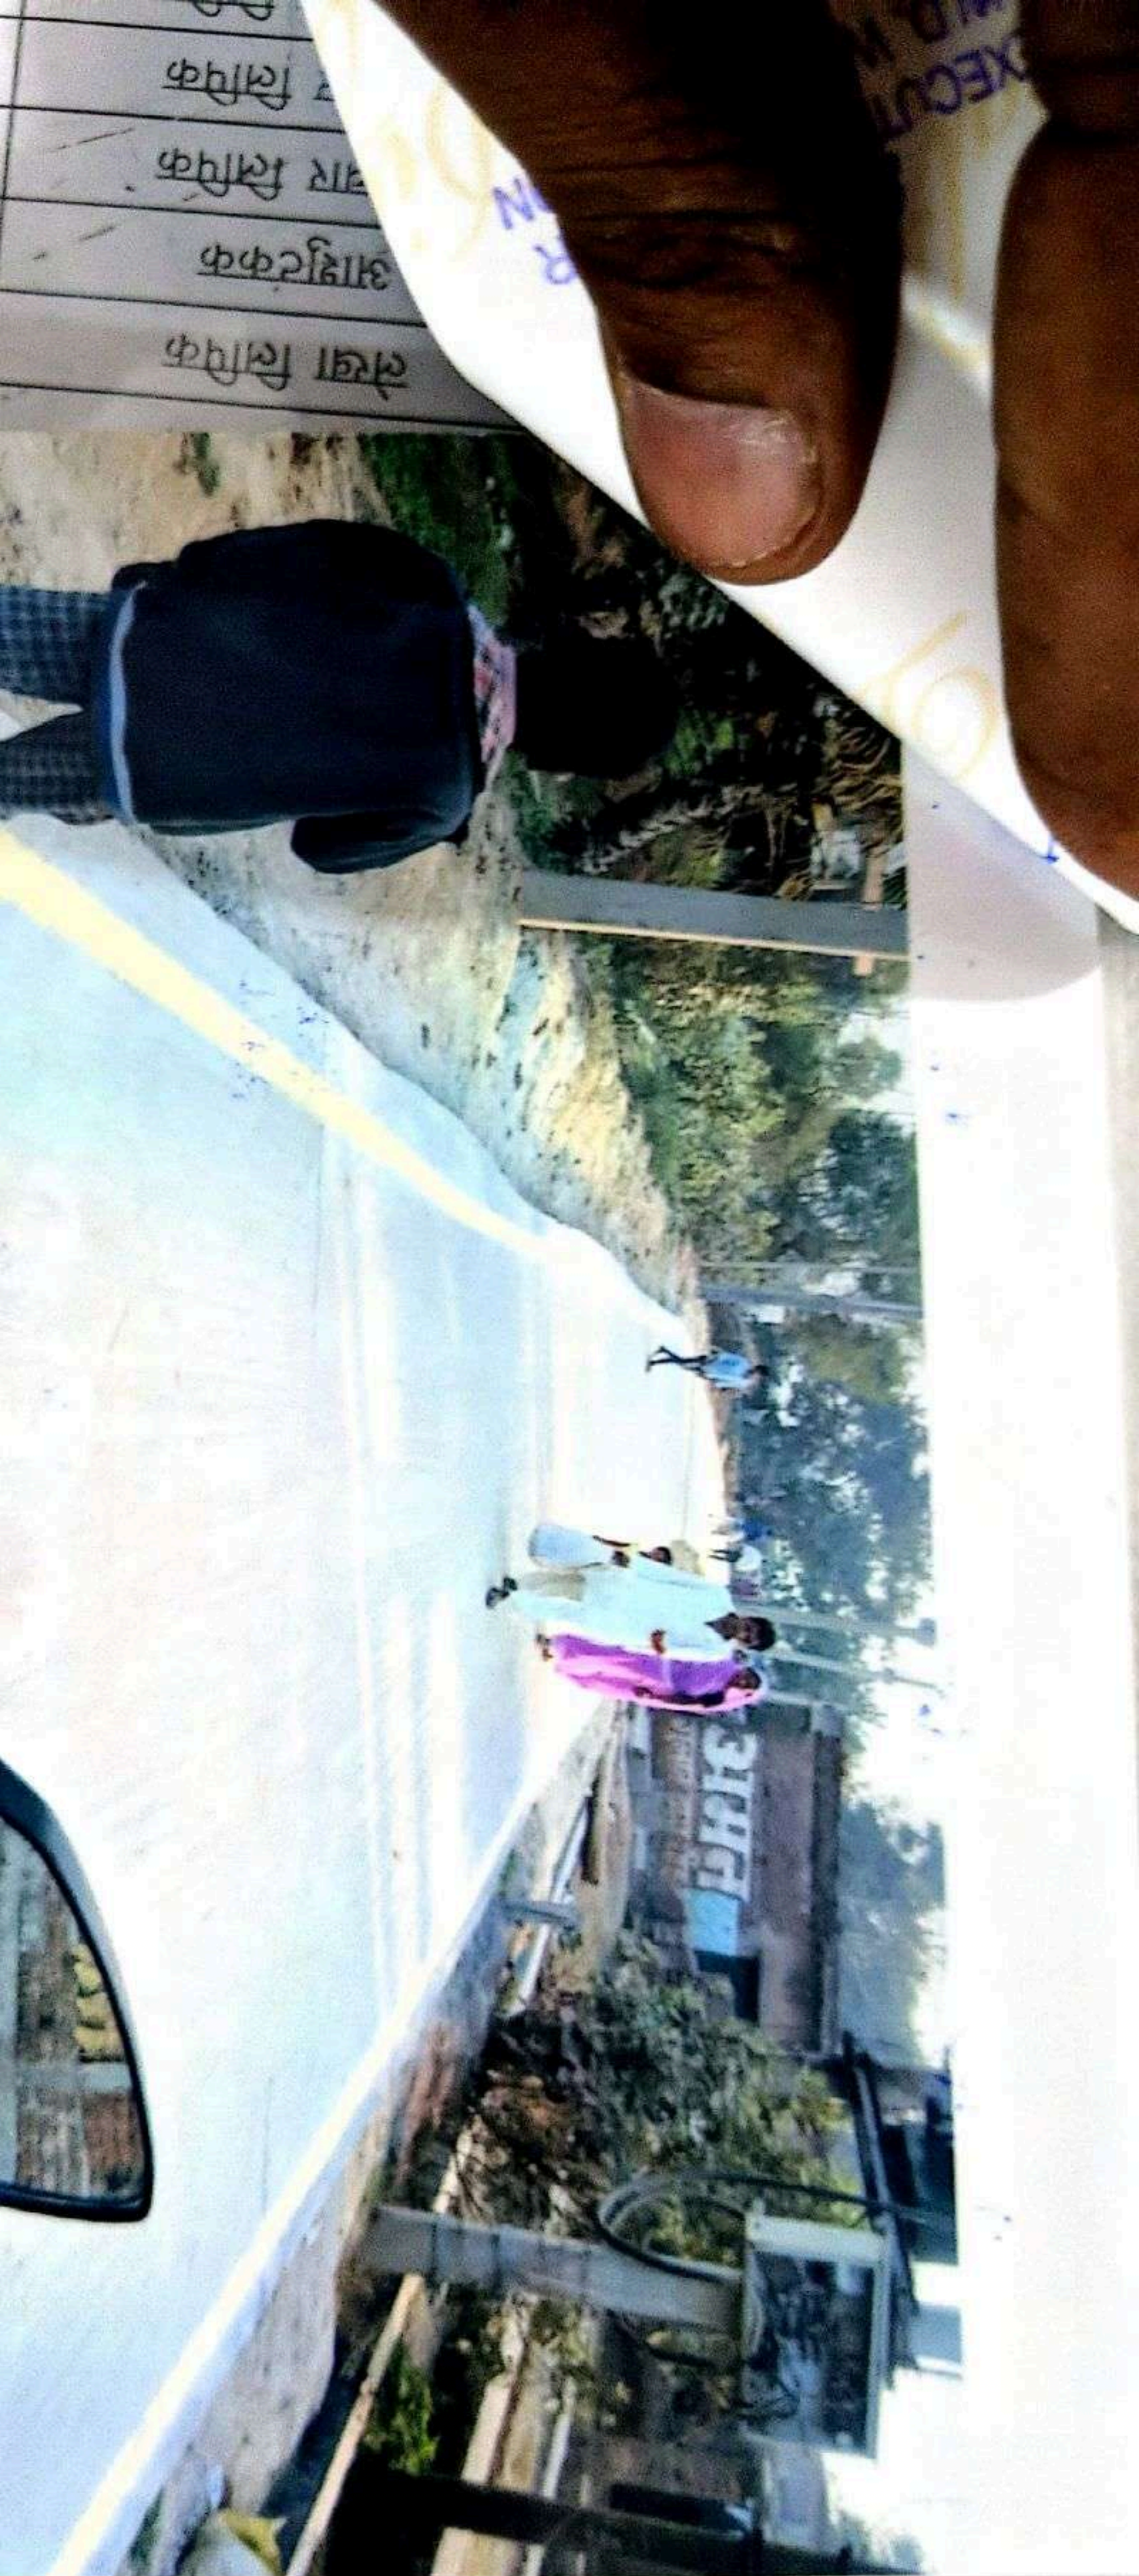

ಕರ್ನಾಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ

Muz- Bihari Bigna Chowk to Kandi

BB
8/03/21
7.6

RLR
8/03/21
A.E

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
BARRH

8/03/21
