

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, किशनगंज-1

पत्रांक:- 18452/30

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, किशनगंज-1

सेवा में,

Addl. CEO-Cum-Secretary-Cum empowered officer
Bihar Rural Road Development Agency 3rd floor, Land Development
Bank Bhawan Budh Marg Patna.

किशनगंज/दिनांक 14/12/2021

विषय:- MR (3054) New Maintenance Policy-2018 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के पथों में अधियाचना के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MR (3054) New Maintenance Policy-2018 अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के निम्नलिखित पथों में कराये गये कार्य के भुगतान हेतु कुल 96,84,595.00 (छियानवे लाख चैरासी हजार पाँच सौ पचानवे) रुपये मात्र के अधियाचना मरम्मत मद में की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

14/12/21
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, किशनगंज-1

**Utilization Certificate-up to December-2021 For MR (3054) New
Maintenance Policy-2018 office of the Executive Engineer RWD Work
Division, Kishanganj-1**

From

Name of PIU/Executive Engineer RWD, Work Division, Kishanganj-1

To

Secretary cum Empowered Officer,
BRRDA (MR-3054), Patna (Bihar).

Sl. N o.	Name Scheme	Sanction No. & Date with Amount	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particular
1	2	3	4	5
1	Constructi on of Rural roads under MR (3054) New Maintenanc e Policy-2018	Secretary cum Empowered Officer, BRRDA (MR-3054), Patna (Bihar). Total Amounting Rs.89,14,52,324 (Eighty Nine Crore Fourteen Lakh Fifty Two Thousand Three Hundred Twenty Four) only.	Total Amounting Rs.89,14,52,324 (Eighty Nine Crore Fourteen Lakh Fifty Two Thousand Three Hundred Twenty Four) only.	Certified that out Rs.89,14,52,324 (Eighty Nine Crore Fourteen Lakh Fifty Two Thousand Three Hundred Twenty Four) only. year 2020-21 in favor of officer-in-charge/PIU/E.E, RWD work Division, Kishanganj-1. A sum of Rs. 88,75,52,753 (Eighty Eight Crore Seventy Five Lakh Fifty Two Thousand Seven Hundred Fifty Three) only. has been utilize for the purpose of MR-3054 State Share as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 38,99,571 (Thirty Eight Lakh Ninty Nine Thousand Five Hundred Seventy One) Only. remaining unutilized as the end of the period under report.

Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants in-aid was sanction have been only fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which in was sanctioned.

Kind of Check Exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintend Engineer.
- Periodic Inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction Material have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer.
- All other codas formalities have been observed.

Physical Progress achieved.

- Construction of road works.
- Construction of CD works.

Divisional Accounts Officer
RWD works division, Kishanganj-1

Signature of PIU/Executive Engineer
RWD works division, Kishanganj-1

Sl. No	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Adminisr Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in %	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requestio n against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount of (in Lakh)	Initial Rectification with Surface renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	RM/NU/RS/19/0010	Abhaykumar POCV in Abhaykumar Road	2.12048+10	2050/3-7-19	1.80	47.843	31.108	13.437	18/05/2020/2020-21	27-09-2020	28.05.2021	3374.63	25mm	5.09	0.00000	0.10000	18.1050	Completed
2	RM/NU/RS/19/0006	South B. B. 30 in South P.W. Road	2.12048+10	2050/3-7-19	2.669	46.937	32.372	10.729	06/05/2020/2020-21	08-06-2021	08-06-2021	3381.50	25mm	5.05	0.00000	0.00000	23.1051	Length 0.870 km Completed
3	RM/NU/RS/19/0006	Kandhari in South B. B.	2.12048+10	2050/3-7-19	2.000	86.997	58.837	21.166	06/05/2020/2020-21	08-06-2021	08-06-2021	3419.82	25mm	5.04	0.00000	0.00000	31.445	Length 1.075 km Completed
			TOTAL:-												0.00000	0.00000	56.64555	

14.12.21

27/11/21
 confirmed amount
 verified and signed
 14.12.21
 14.12.21

Name of work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Name of work</u> - Smitial section					
<u>bicellion including</u>					
<u>surface Renewal of road</u>					
<u>from south DB 50 to</u>					
<u>South PW Road under</u>					
<u>MR/3054</u>					
<u>Assessment</u> - 06/3054/MSD/2020-21					
<u>Agency</u> - Tithubedwal					
<u>Date of start</u> - 09.09.020					
<u>Date of completion</u> - 08.06.021					

1st on A/c billDate of measurement - 02.05.021Date of entry - 02.05.021① Clearing & scrubbing road land
including uprooting - - - -

$$2 \times 13 \times 30.00 \times 1.00 = 780.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 14 \times 30.00 \times 1.00 = 840.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 20.00 \times 1.00 = 40.00 \text{ m}^2$$

$$\text{Total} = 1660.00 \text{ m}^2$$

$$\approx 0.166 \text{ Hae.}$$

② Scrubbing the existing
bituminous surface - - - -

$$4 \times 30.00 \times 2.50 = 300.00 \text{ m}^2$$

$$3 \times 25.00 \times 2.00 = 150.00 \text{ m}^2$$

Continuation

[illegible]

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Sontha D.B - 50 to Sontha P.W.D road

योजना का नाम:- New Maintenance Policy MR/3054

स्वीकृत लम्बाई:- 1.00 K.M.

प्रतिवेदन:

शीर्ष MR-3054 योजना अन्तर्गत Sontha D.B - 50 to Sontha P.W.D road पथ का संयुक्त निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, कोचाधामन की उपस्थिति में दिनांक 24.11.2021 को किया गया। इस पथ की कुल स्वीकृत लम्बाई 1.00 K.M. है, परन्तु इस पथ का निर्माण कुल 0.830 K.M. में किया गया है। इस प्रकार शेष बचे 170 मीटर में से 76 मीटर में जमीन विवाद एवं इस कारण अतिक्रमण की समस्या आ गई है। यह इस पथ के आरेखन के चैनेज 386 मीटर से 462 मीटर के बीच में है। अंचलाधिकारी कोचाधामन से जमीन मापी प्रतिवेदन माँगा गया है जो अब तक अप्राप्त है। मापी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार पथ के इस भाग में अग्रतर कार्रवाई करना संभव हो पाएगा। शेष 94 मीटर पथ अन्य मद से निर्मित हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में अतिक्रमण / जमीन विवाद वाले भाग को छोड़ कर शेष भाग में पथ निर्माण पूर्ण है एवं वर्तमान में पथ की स्थिती संतोषजनक है। पथों के निरीक्षण के दौरान के फोटोग्राफ को सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिती में संवेदक द्वारा किए गए कार्य के भुगतान पर विचार किया जा सकता है।


24.11.21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, कोचाधामन-2


24/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, कोचाधामन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1


24/11/21

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, किशनगंज

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Sontha D.B - 50 to Sontha P.W.D road

योजना का नाम:- New Maintenance Polocy MR/3054

स्वीकृत लम्बाई:- 1.00 K.M.

प्रतिवेदन:


शीर्ष MR-3054 योजना अन्तर्गत Sontha D.B - 50 to Sontha P.W.D road पथ का संयुक्त निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, कोचाधामन की उपस्थिति में दिनांक 24.11.2021 को किया गया। इस पथ की कुल स्वीकृत लम्बाई 1.00 K.M. है, परन्तु इस पथ का निर्माण कुल 0.830 K.M. में किया गया है। इस प्रकार शेष बचे 170 मीटर में से 76 मीटर में जमीन विवाद एवं इस कारण अतिक्रमण की समस्या आ गई है। यह इस पथ के आरेखन के चैनेज 386 मीटर से 462 मीटर के बीच में है। अंचलाधिकारी कोचाधामन से जमीन मापी प्रतिवेदन माँगा गया है जो अब तक अप्राप्त है। मापी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार पथ के इस भाग में अग्रतर कार्रवाई करना संभव हो पाएगा। शेष 94 मीटर पथ अन्य मद से निर्मित हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में अतिक्रमण / जमीन विवाद वाले भाग को छोड़ कर शेष भाग में पथ निर्माण पूर्ण है एवं वर्तमान में पथ की स्थिती संतोषजनक है। पथों के निरीक्षण के दौरान के फोटोग्राफ को सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिती में संवेदक द्वारा किए गए कार्य के भुगतान पर विचार किया जा सकता है।


24.11.21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, कोचाधामन-2


24/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, कोचाधामन


24/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1


24/11/21

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, किशनगंज

SONTHA DB-50 TO SONTHA PWD ROAD.-(NEW M.R)



24-11-21
JE

24/11/21
AE

Sontha DB-50 Jo Sontha P.W.D. Road.
(New MR)



अतिरिक्त गाँव का दृश्य



24-11-21
JE

अतिरिक्त
A/E

Road Name: Senthia D B 30 to Senthia P W D road
Contractor Name: Tatu Radwan

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No	m km	m/mm	km/h	m/m/km	m/m/km	ROAD			
19/10/21	14:47:26	30	0.1	330	0	3300	3290	G	26.181892	87.777718	Culvert
19/10/21	14:47:26	30	0.1	340	20.2	3400	3382	G	26.181866	87.778298	Normal
19/10/21	14:48:11	30	0.1	280	10.1	2800	2813	G	26.181057	87.779009	Culvert
19/10/21	14:48:11	30	0.1	400	10.1	4000	3910	G	26.182945	87.779114	Culvert
19/10/21	15:16:00	31	0.1	280	0	2800	2813	G	26.185763	87.778011	Culvert
19/10/21	15:16:25	31	0.1	360	10.1	3600	3564	G	26.185025	87.77815	Normal
19/10/21	15:20:32	31	0.1	350	0	3500	3473	G	26.18476	87.7784	Normal
19/10/21	15:20:32	31	0.1	380	10.1	3800	3747	G	26.184597	87.778366	Normal
Average							3381.50				

$$V = 0.5 \cdot X^2 + 0.914 \cdot X + 2.7450$$

$$X = 3800$$

$$V = 3747$$


(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

19-10-031
SE

19/10/21
AC

File : C:\Users\DELL\Desktop\Titi.xlsx Section No. : 30, Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.914 \cdot X + 274.50$
Name of Customer : Titi Badwal, Name of Work/ Road : Sontha D.B - 50 to Sontha P.W.D road, Lab Job number :

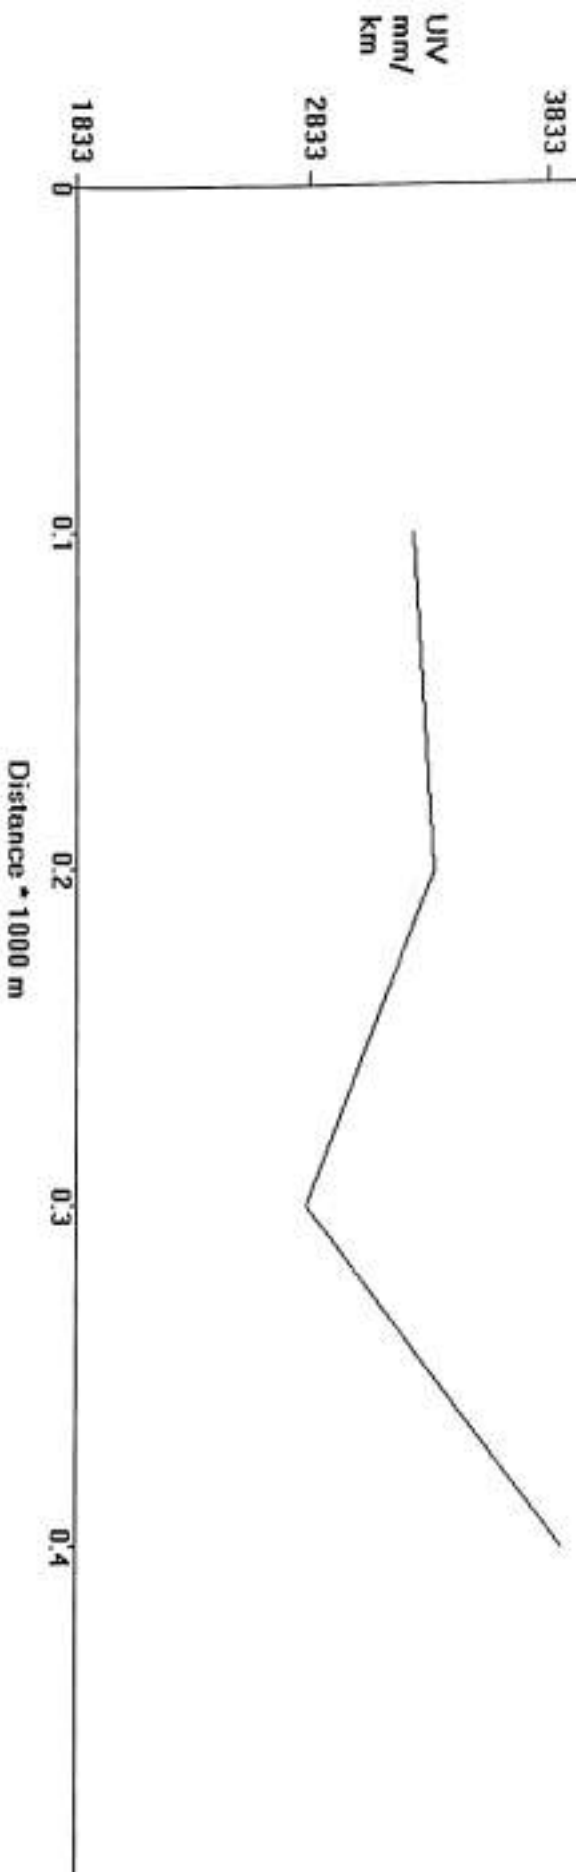


Titi
19.10.21
SE

Arjun
19/10/21
AE

File : C:\Users\DELL\Desktop\Tiw.xlsx Section No. : 31. Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.914 \cdot X + 274.50$

Name of Customer : Tiw Badwal. Name of Work/ Road : Sontha D.B - 50 to Sontha P.W.D road. Lab Job number :

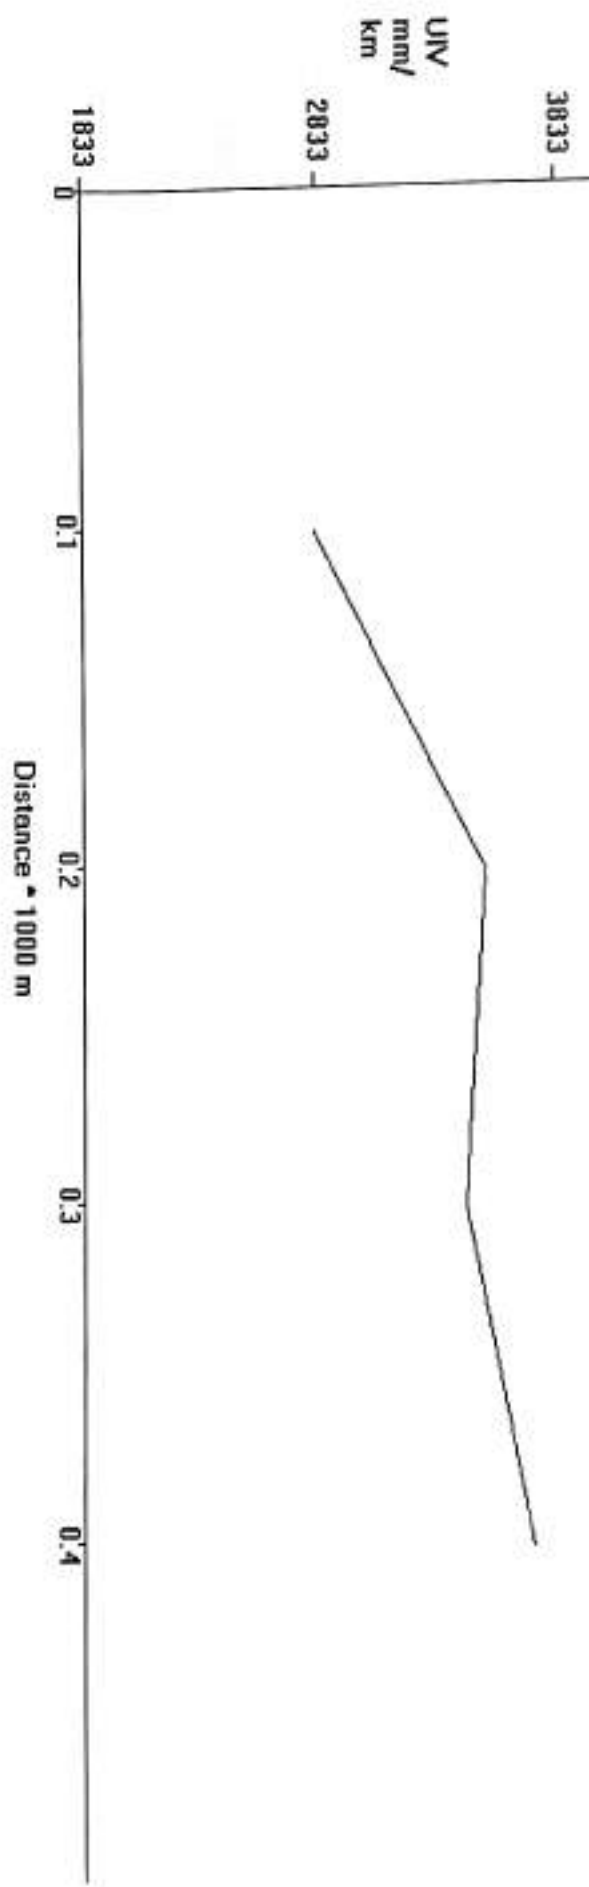

By
19/10/21
AE
