

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक...1834 अ.मु. / बिक्रमगंज / दिनांक 15/12/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:- शीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत पैकेज संख्या—MR-N/19-20 Bikramganj/16, एकरारनामा संख्या—05MBD/2020-21 पथ का नाम:—(1) आरा—सासाराम रोड से अमेठी (2) “बक्सर कैनाल से सुरहुरिया भाया अगरेर कला” पथ के समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत पैकेज संख्या—MR-N/19-20 Bikramganj/16, एकरारनामा संख्या—05MBD/2020-21 पथ का नाम:— (1) आरा—सासाराम रोड से अमेठी (2) “बक्सर कैनाल से सुरहुरिया भाया अगरेर कला” पथ का निर्माण कार्य संवेदक अनामिका कुमारी, ग्राम+पो0—बिक्रमगंज, जिला—रोहतास, को दिनांक—04.06.2020 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का एकरारित समय दिनांक—04.03.2021 था। संवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन में Unavailable of Bitumen and Covid-19 का उल्लेख किया गया है। Unavailable of Bitumen and Covid-19 के कारण उक्त पथ में कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक—30.07.2021 तक पूर्ण करा लिया गया है।

अतएव कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, संझौली एवं सूर्यपुरा द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य का दिनांक—30.07.2021 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0— यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/12/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।
15/12/2021

ANAMIKA KUMARI

WARD NO.- 16, ARA ROAD, NEAR TAMANNA GAS GODOWN, BIKRAMGANJ

DIST.- ROHTAS (BIHAR) 802212

E-mail ID : kaushalkishore2604@gmail.com

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS

Date. 30/07/21

Ref.

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

ग्रा० का० वि० कार्य

प्रमण्डल बिक्रमगंज

विषय:- समग्र वृद्धि स्वीकृत कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि MR-N/19+20 Bikramganj/16, स्कारवाग संख्या - 05 MBD/2020-21 पत्र का नाम :- (1) आरा सासाराम रोड से अमेठी (2) बक्सर के नाम से बुरुहिया भाग अजरे है भोजना अंतर्गत में समग्र वृद्धि की स्वीकृत कराने हेतु अनुदान की जाय।

विदित्य
08/08/21
६६

विश्वारथदास

Anamika Kumari

ANAMIKA KUMARI

WARD NO.- 16, ARA ROAD, NEAR TAMANNA GAS GODOWN, BIKRAMGANJ

DIST.- ROHTAS (BIHAR) 802212

E-mail ID : kaushalkishore2604@gmail.com

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERSDate 02/02/2021

Ref.

The Executive Engg.

RWD, work division Bikanaganj, Rohtas

Subj:- Regarding unavailability of Bitumen.

Agg. No - 05 MBD/2020-21 dated :- 11-06-2020

Name of work - MR-N/19-20 Bikanaganj/16

Block - Sanshauli and Sagarpur

REC

संजीता

2/2/2021 Dear Sir,

I beg to say that my work name is MR-N/19-20 Bikanaganj/16 has been stop due to unavailability of Bitumen. Due to this reason I am not able to complete the work on time.

So, Please provide bitume for that work to complete on time as per tender agreement. For this kindness I will always thankful to you.

विवेक
2/2/2021
SIR

Yours faithfully

Anamika Kumari
ANAMIKA KUMARI

MJ = 100 + WF = 25, Total = 125



9/89 22/9 100x1=100 अनामिका कुमारी
बिहार BIHAR 2021
Who is identified as
Advocate solemnly
declare before me
समक्ष,
नोटरी पब्लिक,
बिक्रमगंज, रोहतास।
पिता- रमेश कुमार मौआर
सा- निरमलमन्ना गौड़
गोदाम बिक्रमगंज
थाना- बिक्रमगंज
रोहतास
संजय कुमार सिन्हा
मुद्रांक विक्रेता
ला० नं०-52/95
अवर निबंधक कार्यालय
बिक्रमगंज (रोहतास)
शपथपत्र
AC 048217

मैं अनामिका कुमारी पिता श्री रमेश कुमार मौआर, वार्ड नं०- 16, आरा रोड, नियर तमन्ना गैस गोदाम, बिक्रमगंज, थाना- बिक्रमगंज, जिला- रोहतास (बिहार) 802212 का निवासी हूँ और शपथपूर्वक ब्यान करती हूँ :-

1. यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि एप्रीमेन्ट नं०- 05MBD/2020-21, दिनांक- 11.06.2020 कार्य का नाम- MR-N/19-20 Bikramganj/16 पथ का नाम- आरा-सासाराम रोड से अमैठी, ब्लॉक- संझौली का कार्य सम्पन्न किया गया है।


यह कि मेरे द्वारा जमा किया गया सारा कागजात सही है।
यह कि कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है।
यह कि बड़े हुए दर का दावा नहीं करूँगी।

सत्यापन

मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है।

Anamika Kumari
शपथकर्ता

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाये।
Deny The Signature
Deponents / Excutants / Witness
Who Has/Have Put Her LTV/RTI
Signature In My Presence
श्री कृष्ण दीक्षित
Advocate
22/09/21





विहार सरकार
शिक्षा 3054 मराठी शिक्षा यात्रा

अनुसंधान आस्था की तिथि-01/2020 अनुसंधान समिति की तिथि-01/2020
संयोजक-अमरिका कुमारी
पथ का नाम-आरा सासाराम रोड से अमरी
कुल लंबाई-2.730 K.M.

क्र.सं.	अनुसंधान मार्ग का विवरण	अनुसंधान का नाम
1	आरा की छटाई से आरंभ की जाएगी	अनुसंधान का नाम
2	नदियों की पुनर्स्थापना	अनुसंधान का नाम
3	मोटर का अनुसंधान	अनुसंधान का नाम
4	पथ के दो हिस्से दो हिस्से में विभाजित	अनुसंधान का नाम
5	पथ के निचले हिस्से का अनुसंधान	अनुसंधान का नाम
6	क्रासिंग का अनुसंधान	अनुसंधान का नाम
7	रोड फर्निचर का अनुसंधान	अनुसंधान का नाम
8	सू.टी. काटने के पैसे की रकम का अनुसंधान	अनुसंधान का नाम

क्र.सं.	अनुसंधान के लिए लंबाई (कि.मी.)	अनुसंधान का नाम
1	2021-2022	2.611
2	2022-2023	2.850
3	2023-2024	8.034
4	2024-2025	3.542
5	2025-2026	8.508




मुद्रा-यसोवती पथ अनुसंधान कार्यक्रम

योजना का नाम-आरा सासाराम रोड से अमरी
पथ की लंबाई-2.730 K.M. विद्युत नजदारी-2.270 पी.सी.सी. पथ-0.460 K.M.
प्रारंभिक तिथि-08.4.56 लंबाई
5 साल तक रख-रखाव की राशि-20.540 लाख
पुनर्निर्माण-कर्मचारी-कुल-
कार्य प्रारंभ की तिथि-04.06.2020 कार्य समाप्ति की तिथि-04.06.2021
संयोजक का नाम-अमरिका कुमारी
कार्यकारी सचिव-कार्यकारी अभियंता, गरीब कार्य विभाग, सं. प्रमोडन
बिजु सगंज

Latitude: 25.10511
Longitude: 84.12866
Elevation: 146.07
Accuracy: 192.7
Time: 07-04-2024
Note: MR Road

Powered by NoteCam

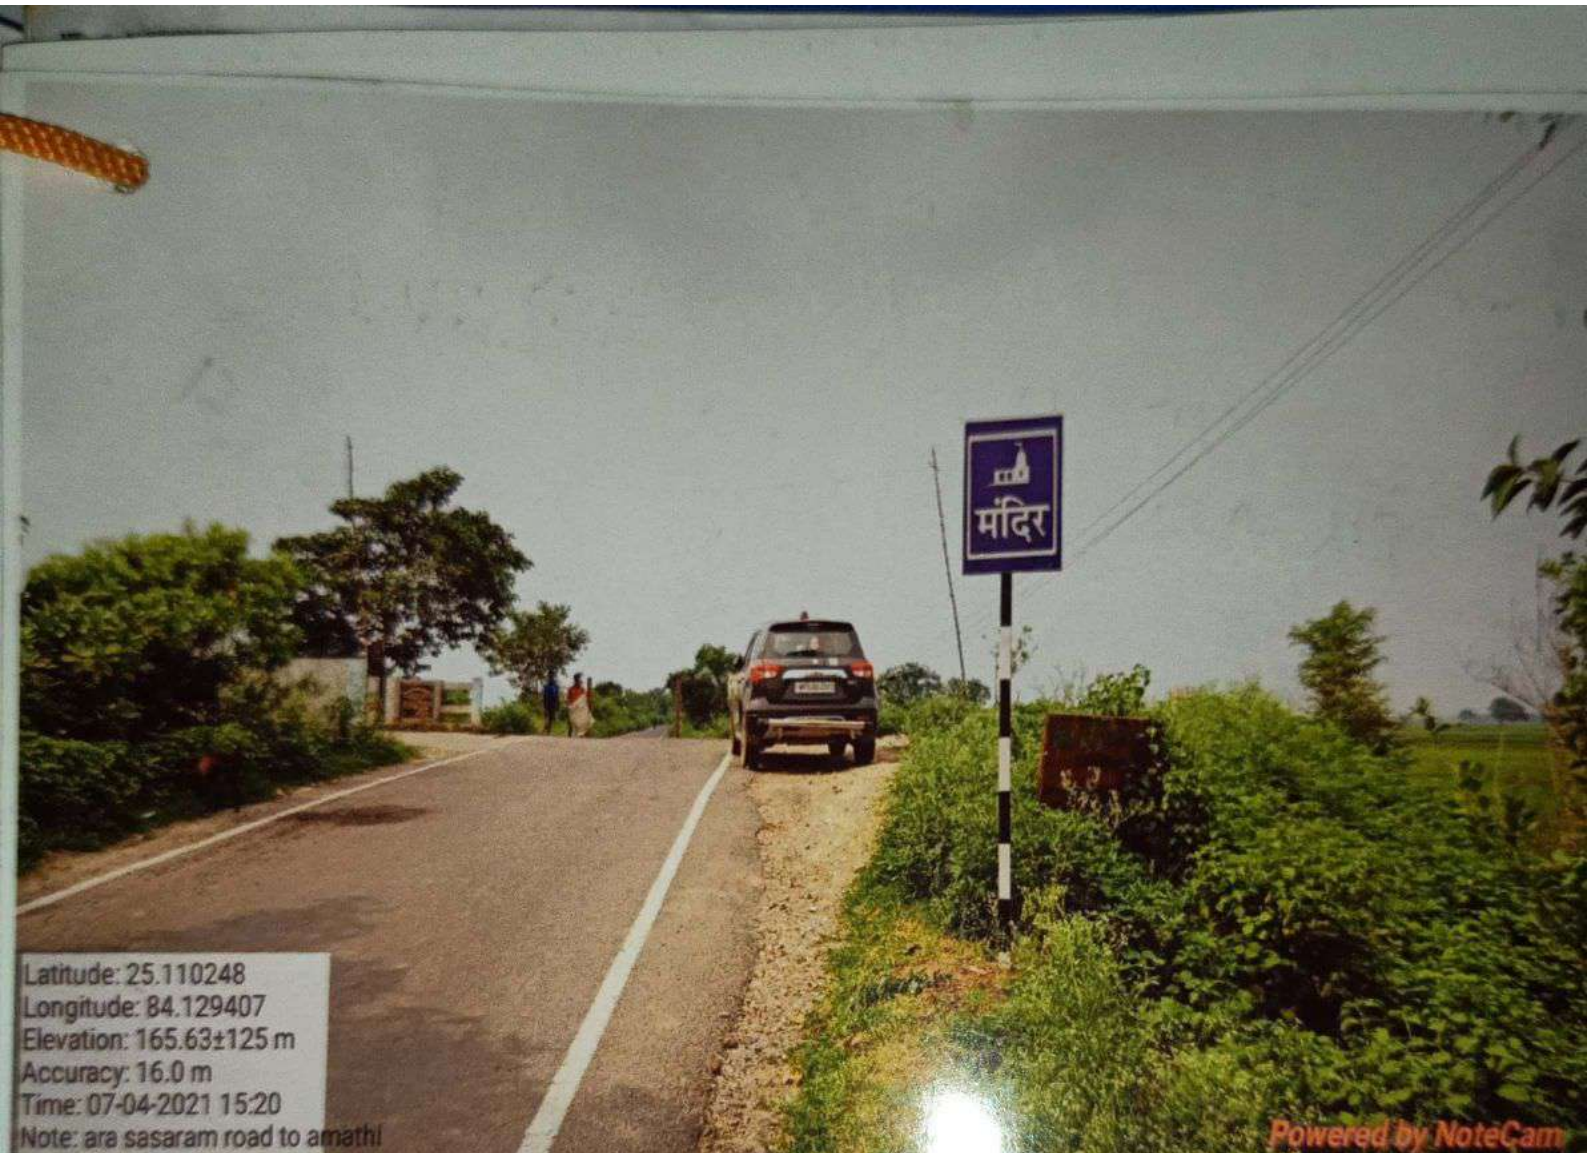

Latitude: 25.110248
Longitude: 84.129407
Elevation: 165.63±125 m
Accuracy: 16.0 m
Time: 07-04-2021 15:20
Note: ara sasaram road to amathi

Powered by NoteCam





Abstract of cost-

29

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road - Ar 9 8989894					
Road to Amethli					
MRN - 19-20 Bilkamganj/16					
Agency - Anamika Kumari					
Agreement - No - 05/MISD/20-21					
Agreement - Date - 11/06/2020					
Start Date - 04/06/2020					
Completion Date - 04/08/2020					
Measurement Date - 25/5/21					
Item (1) providing and					
20					
fixing typical M.R. information					
sign board					
vide T.M.B Page - (20)					
Qty = 2.00 Nos.					
@ RS = 9515.48 / Nos - RS = 19030 =					
Item (2) providing and					
cleaning with grubbing					
Road land					
vide T.M.B Page - (20)					
Qty = 0.50 Hcf					25550 =
@ RS = 51101.12 / Hcf - RS =					
Item (3) providing and					
2					
concrete patch repair					
vide T.M.B Page - (20)					
Qty = 242.05 / m ³					
@ RS = 2223.33 / m ³ - RS = 538166					
RS = 5,82,746 =					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		BF	PS 2	60,7597320.	
vide T.M.B page - (53)				60,75,920.	
Qty = 40.32 m ²					
@ Rs = 142.98/m ²				Rs = 5765.24	
Item (13) Providing and					
Painting two coat					
vide T.M.B page - (27)					
Qty = 117.12/m ²					
@ Rs = 97.18/m ²				Rs = 11382.44	
Item (14) Providing and					
Subgrade with earth					
shoulder					
vide T.M.B page - (28)					
Qty = 4384.95 m ³					
@ Rs = 189.41/m ³				Rs = 830553.20	
			Rs 2	692367320	
				692362020	
Less below 0.39%				Rs = 27002.20	
			Rs 2	689667120	
				689661820	
Add 6.57.12% (+) =				82760120	
				82759420	
L.C. 1% (+) =				68966720	
				68966200	
			Rs 2	779323720	
				779317820	
S.F 10% (+) Rs =				5345320	
			Rs 2	784669220	
				784665320	
Abate			Rs 2	2675720	
25/5/2021				A.C.	
JE					
29/05/2021					
SE					

Continuation

2nd on A/c Bill.

Abstract of cost

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road - Ara Sasaram Road to Amethi					
MR-N/19-20 Bikanaganj/16					
Agency - Anamika Kumari					
Agreement Nos - 5/MBD/20-21					
Agreement Date - 11/06/2020					
Start Date - 04/06/2020					
Completion Date - 4/03/2021					
Measurement Date -					
Item (1) Providing and					
Grading of typical MR					
informatary sign board					
vide T.M.B page - (29)					
Qty = 2.0 Nos.					
@ Rs 29515.48/Nos -					190302
Item (2) Providing and					
cleaning in grubbing					
Road land - - - -					
vide T.M.B page - (29)					
Qty = 0.50 Hct					
@ Rs = 51101.12/1144 Rs =					255502
Item (3) Providing and					
C.S.B up-II for patch					
Repair - - - -					
vide T.M.B page - (29)					
Qty = 242.05/m ³					
@ Rs = 2223.37/m ³ - Rs =					5381662
					Pt = 58274620

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		BF	7150	73820	

Scanned with CamScanner

3rd & Signal Bill			
Name of Road:-	Axax	Sasaram.	
Road to Amethi.			
Agency-	MR-N/19-20	Bikramganj/16	
Agency-	Anamika Kumar		
Agreement No-	05/MBD/20-21		
Agreement date-	11/06/2020		
start date-	04/06/2020.		
completion date-	4/03/2020.		
measurement date-	31/07/21		
Item ① providing and 20			
fixing of typical			
MR informatory sign.			
board - - - - -			

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- MR-N/19-20 Bikkamganj/16
ARA SASARAM ROAD TO AMETHI, Block- SANJHAULI
2. Name of Agency :- ANAMIKA KUMARI
3. Date of written order to commence the work :- 04.06.2020
4. Contract date of the Completion :- 04.03.2021
5. Extension date of the Completion :- 30.07.2021
6. Agreement No. :- 05MBD/2020-21 dt. 11.06.2020
7. Upto date Payment :- 96,39,028/-
8. Agreement Value :- 98,06,709/-
9. Time applied for :- 30.07.2021
10. Cause of extension of time :- Unavailability of Bitumine and Covid-19
11. Signature of contractor with date :- Anamika Kumari
22/09/21
12. Recommendation of Junior Engineer :- Unavailable Bitumine and Covid-19
P. Patel
22/9/21
JC
13. Recommendation of Assistant Engineer :- Unavailable of Bitumine and Covid-19
R. Singh
22/9/21
AE
14. Recommendation of Executive Engineer :-
11/10/21
AE
