

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक.....1830 अ/७७ / बिक्रमगंज / दिनांक.....15.12./ 2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:— शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत राजाडीह महादलित टोला से तिलई महादलित टोला तक पथ के समयवृद्धि के संबंध में।



महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत राजाडीह महादलित टोला से तिलई महादलित टोला तक पथ का निर्माण कार्य संवेदक मे० दुर्गा शक्ति कन्स्ट्रक्शन, प्रो०— प्रविन्द्र कुमार सिंह ग्राम—महुली, पो०— धारुपुर, थाना—बिक्रमगंज, जिला—रोहतास को दिनांक—08.03.2019 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का एकरारित समय दिनांक—07.12.2019 था। संवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन में Public Hindrance का उल्लेख किया गया है। Public Hindrance के कारण उक्त पथ में कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक—26.10.2020 तक पूर्ण करा लिया गया है।

अतएव कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, संझौली द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य का दिनांक—26.10.2020 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

15/12/2021



M/S Durga Shakti Constructions

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS

Vill.- Mahuli, P.O.- Dharupur, P.S.- Bikramganj, Dist.- Rohtas (Bihar) 802212

E-mail ID : pksingh2151@rediffmail.com

Ref.

Date.....

सेवा में,
कार्यपालक सुनिश्चिता
ग्राहक कार्ड वि० कार्य
प्रमोडन - बिक्रमगंज

विषय :- सम्य वृद्धि स्वीकृत कराने के संबंध में।

महोदय :- उपरोक्त विषय के संबंध में
कहना है कि M.M.U.S.Y योजनामार्फत
35/S.B.D/18-19 में सम्य वृद्धि की स्वीकृत
कराने हेतु अनुशंसा की जाये।

संगीत
9/12/21

vidhya bhushan
Lyn
09/12/21
EF

786
09/12/21

विष्णु समान्त

Durga Shakti Constructions

Proprietor

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- *Rajadih mahadalit Talq to lilai mahadalit Talq.*
2. Name of Agency :- *m/s Durga shakti construction*
3. Date of written order to commence the work :- *08/03/2019*
4. Contract date of the Completion:- *07/12/2019*
5. Extension date of the Completion:- *26/10/2020*
6. Agreement No. :- *35SBD/2019-20*
7. Upto date Payment :- *100%.*
8. Agreement Value :-
9. Time applied for :- *26/10/2020*
10. Cause of extension of time :- *Public hindrance*
11. Signature of contractor with date:- *[Signature]*
12. Recommendation of Junior Engineer :- *Public hindrance*
P. Patel
9/12/21
JE
13. Recommendation of Assistant Engineer :- *[Signature]*
10/12/21
A.E
14. Recommendation of Executive Engineer :- *[Signature]*
15/12/21
EE



बिहार BIHAR
 श्री/समक्ष प्राधुनिक 2020 900X9=900 दुर्गा शक्ति कन्स्ट्रक्शन
 Who is Identification
 Advocate Sonamoy office
 Location of the office
 धारा 13(1) के तहत
 समक्ष,
 9/12/20 नौटरी पब्लिक,
 बिक्रमगंज, रोहतास।

मुहली
 बिक्रमगंज
 कुबेर कुमार भट्ट
 पुनः विक्रय
 ला० नं०-18/1981
 सब रजिस्ट्री ऑफिस
 बिक्रमगंज (रोहतास)
 976

Y 796053
 N.J.S-100/2 w
 W.P-25/2 w
 125/2 w


शपथ-पत्र

मैं, मे0 दुर्गा शक्ति कन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर-प्रविन्द्र कुमार सिंह, पिता श्री बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम- मुहली, पो0- धारुपुर, थाना- बिक्रमगंज, जिला- रोहतास (बिहार) 802212 का निवासी हूँ और शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ :-

1. यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि एग्रीमेन्ट नं०- 35SBD/2018-19 कार्य का नाम- Rajadih Mahadalit Tola to Tilai Mahadalit Tola.
3. यह कि मेरे द्वारा जमा किया गया सारा कागजात सही है।
4. यह कि कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है।
5. यह कि बड़े हुए दर का दावा नहीं करूँगा।

सत्यापन

मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है।



मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाये।
Bikram Singh
 अधिवक्ता
 09/12/21

शपथकर्ता

[Signature]

अंचल अधिकारी का कार्यालय, संझौली, रोहतास।

पत्रांक:- 958

दिनांक 12/11/2020

प्रेषक

अंचल अधिकारी,
संझौली रोहतास।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

विषय:- MMGSY योजनान्तर्गत राजाडीह महादलित टोला से तिलई महादलित टोला तक पथ निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा जमीनी विवाद के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 568 दिनांक-28.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY योजनान्तर्गत राजाडीह महादलित टोला से तिलई महादलित टोला तक पथ निर्माण कार्य में विवादित जमीन में ग्रामीण जनता को समझा बुझा कर विवाद सुलझाते हुए कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

[Signature]
12/11/20

अंचल अधिकारी
संझौली, रोहतास।

P.K.M.
12/11/2020





मुख्यमंत्री ग्रामसम्पर्क योजना


योजना का नाम:- राजाडीह महादलित टोला से तिलई महादलित टोला
पथ की लम्बाई:- 0.93 कि.मी० एकरोपणमा की राशि:- 68.77 लाख
5 साल तक रख-रखाव की राशि:- 6.08 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि:- 08.03.2019
कार्य समाप्ति की तिथि:- 07.12.2020
संवेदक का नाम:- मे. दुर्गा शक्ति कन्सल्टेशन, बिक्रमगंज
कार्यकारी एजेन्सी:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिक्रमगंज
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (बिहार सरकार) द्वारा संपोषित

बिहार सरकार



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला रोहतास

सड़क कानास- राजाडीह महादलित टोला से तिलई महादलित टोला
कुल लम्बाई-0930 कि० मी० वी०टी सड़क-0630 कि० मी० पी०सी०सी०-0300 कि० मी०
पुलिया-03 रपेटे नग

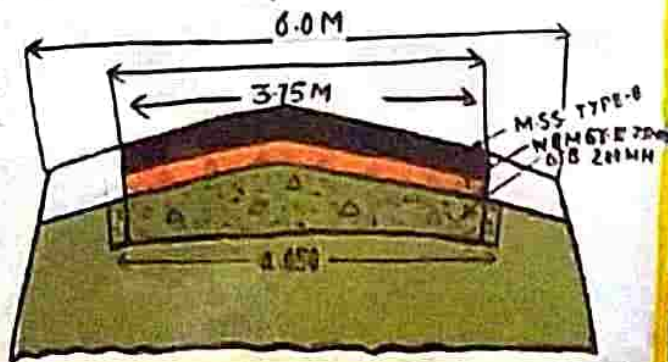

(1) बांधाव का बिंदी की कार्य-3583.56 घन मी० पानी बहाकर रोला से दबाया हुआ

(2) बांधाव कर आया-564.41 घन मी० पानी बहाकर रोला से दबाया हुआ।
बिंदी-1174.27 घन मी० रेत-263.26 घन मी०

(3) बिंदी कृत परत डब्लूटी एम ग्रेड 75 मि० मोटी परत में-266-79 घन मी०


बिंदी-322.82 घन मी० पत्थर का चुरा-मुरम-64.83 घन मी०

बिंदी बिछाकर सुखी बिंदी को रोला से दबाई जावगी पत्थर का चुरा मुरम उसी जायगी पूरा
रोला से दबाई जायगी पानी बहाकर रोला से दबाई जायगी।

(4) सिमेंट का पथ-160 मि० मोटी-183.80 घन मी०
बिंदी-165.42 घन मी० रेत-82.27 घन मी०

कुल-1433 घन मी०



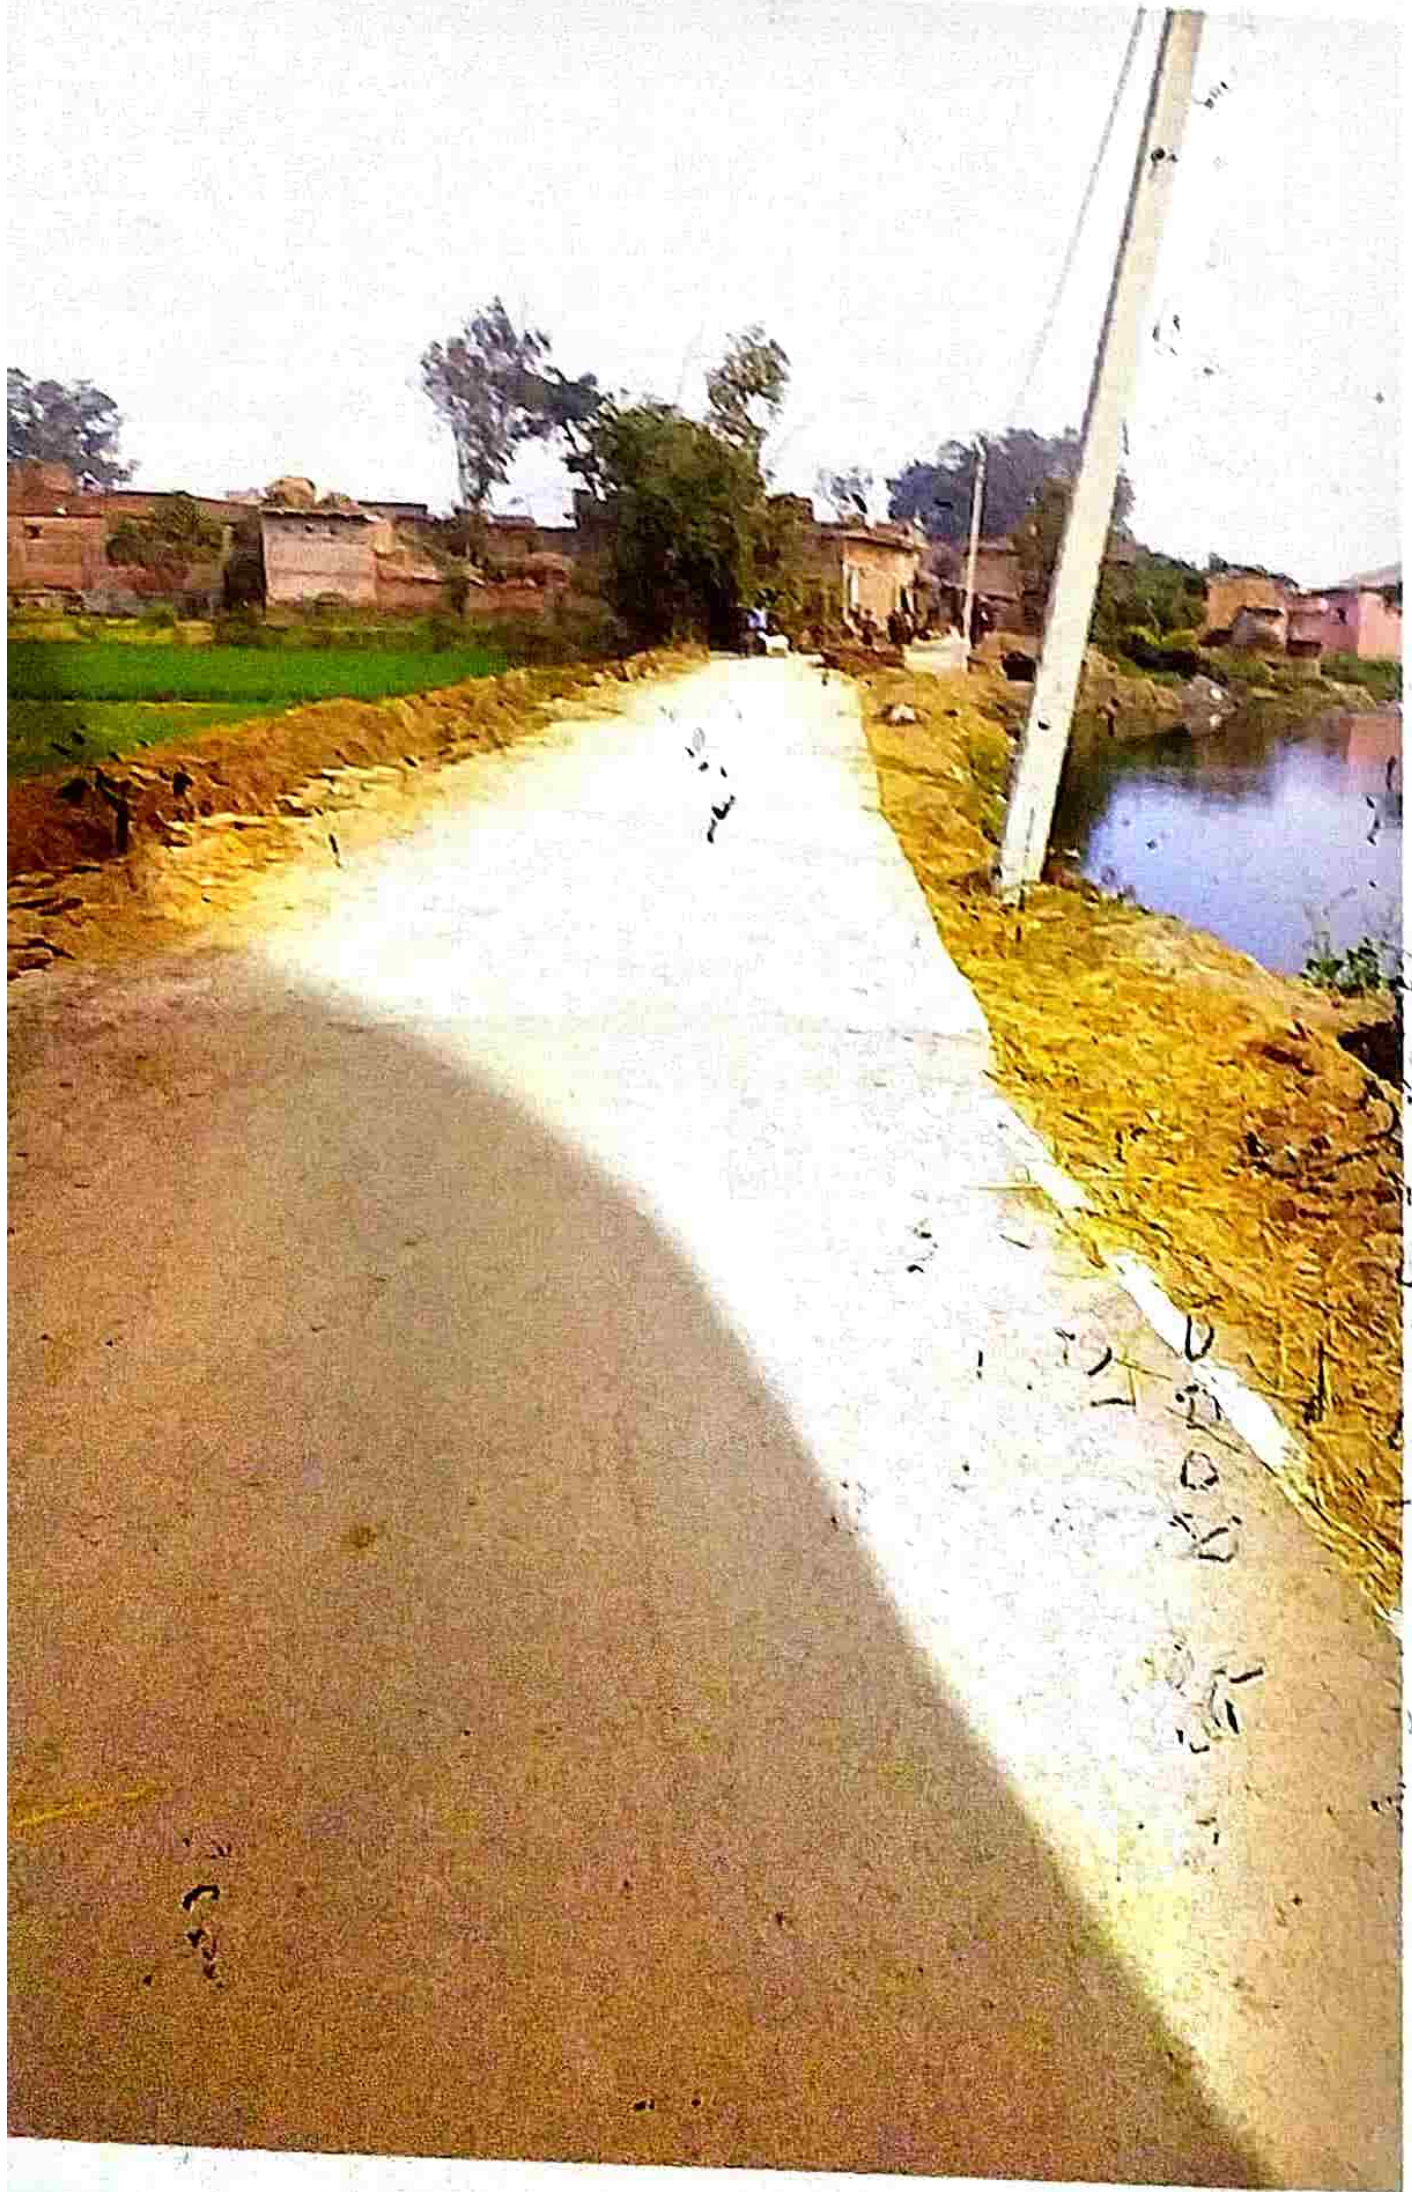




राजाडीह

गिलाई
9.30
KM



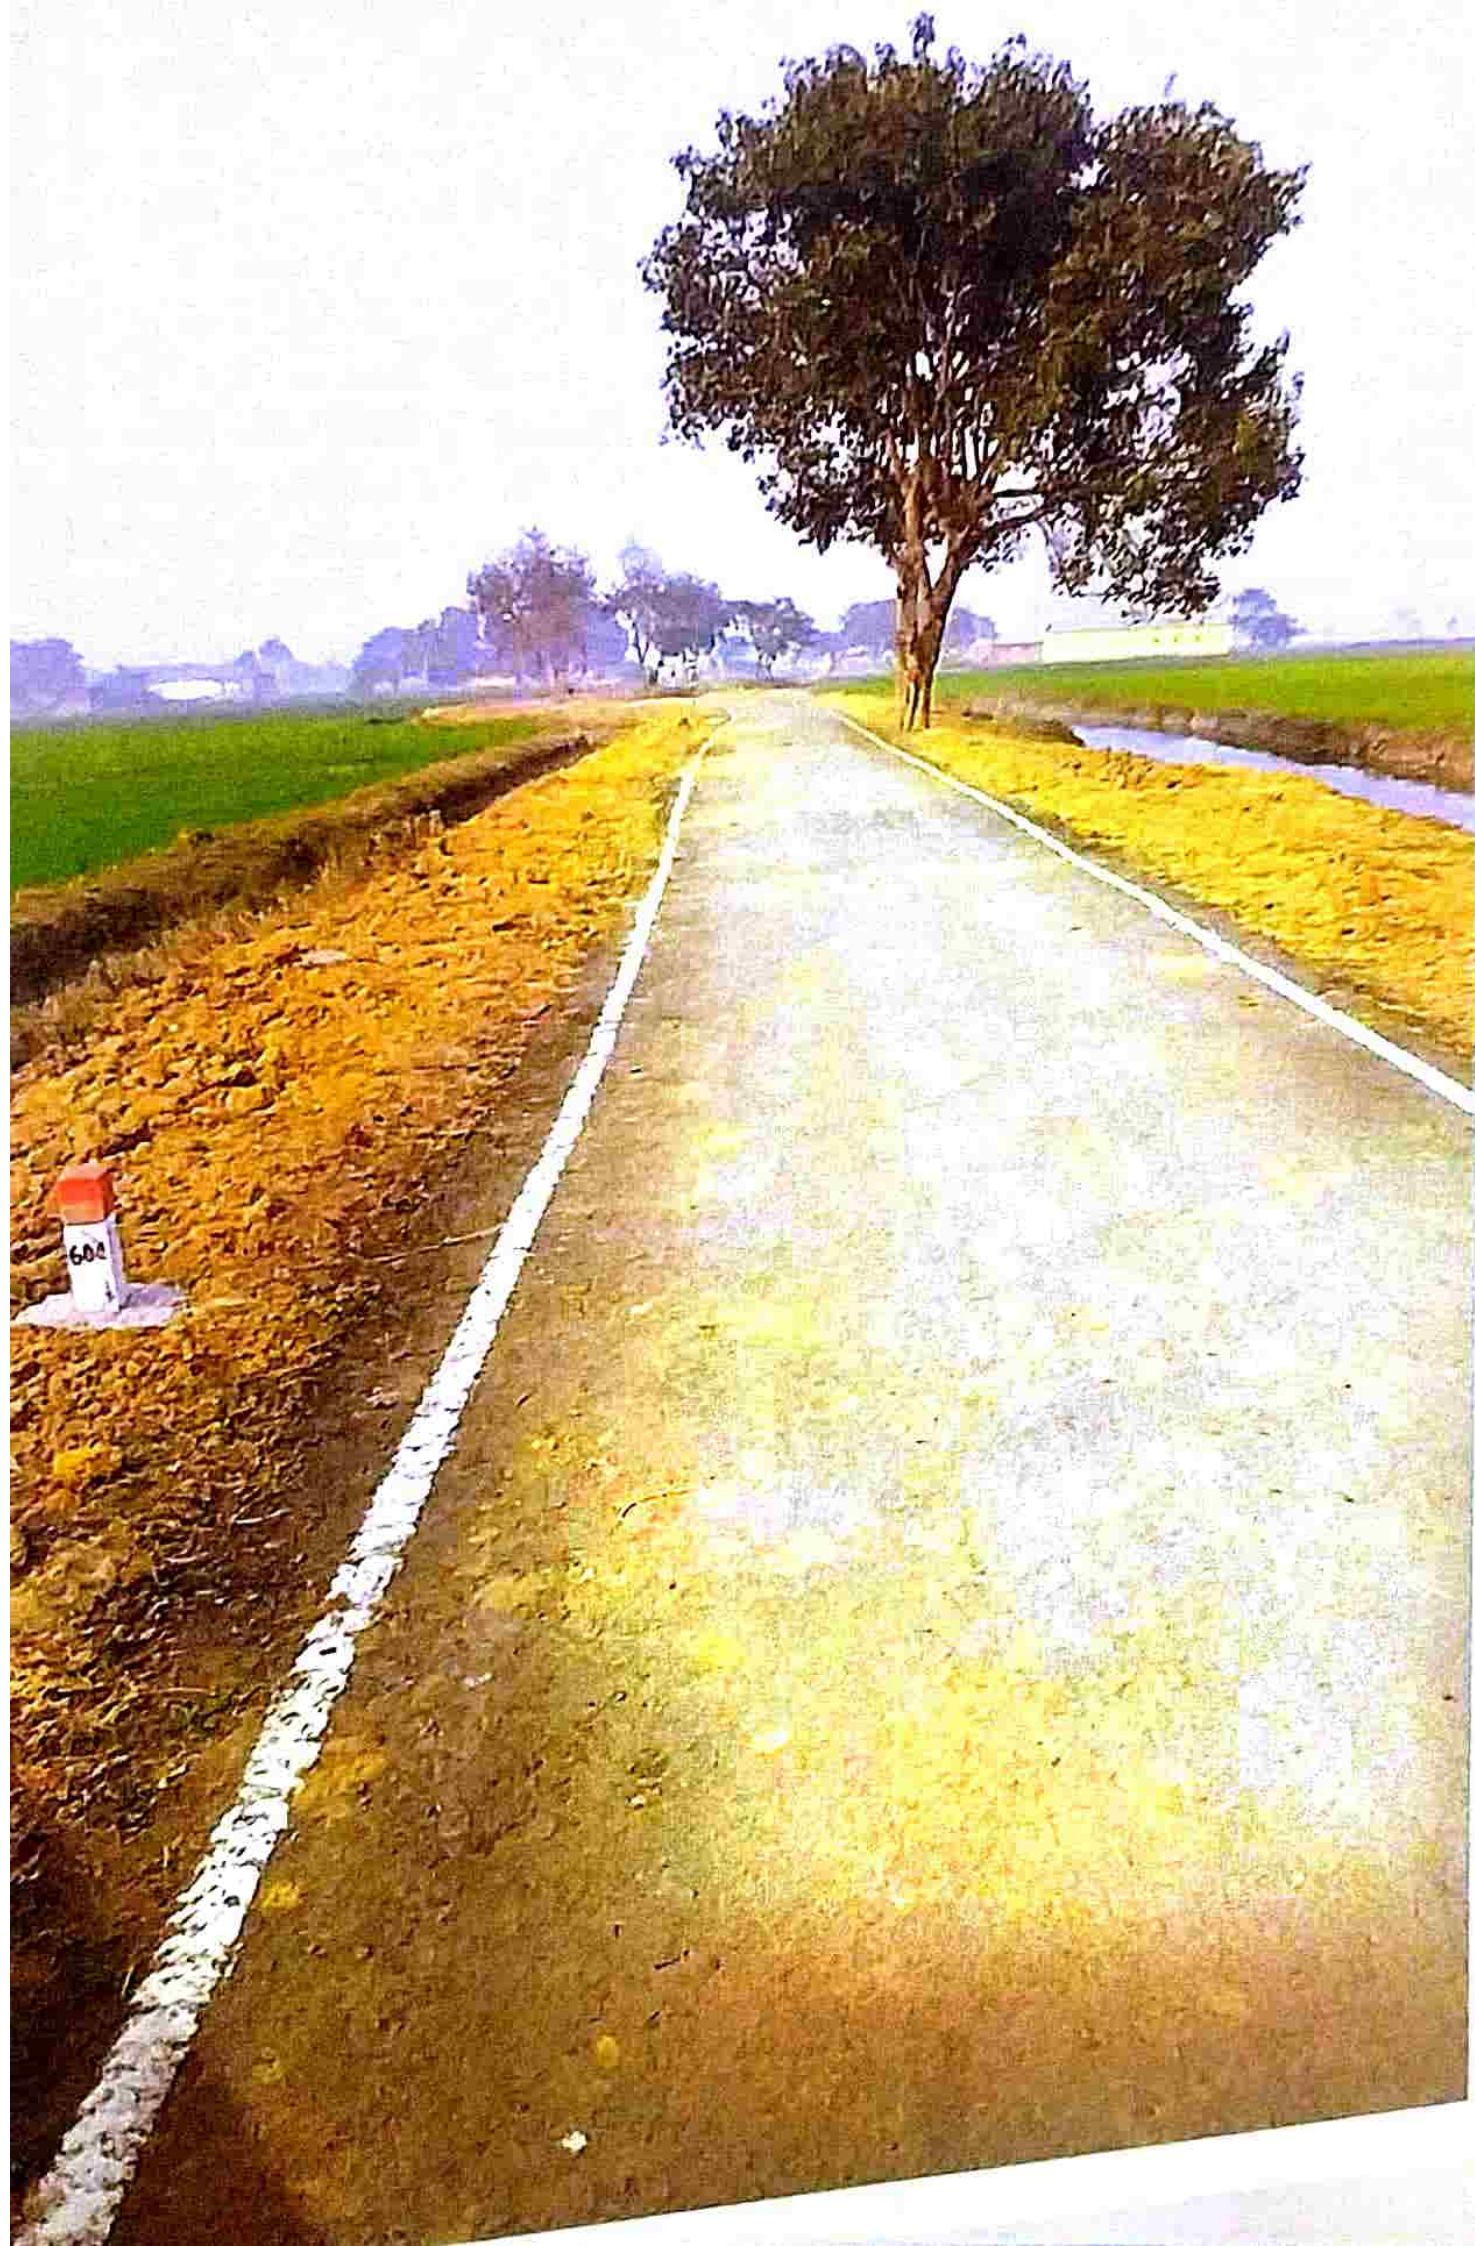

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Record Measurement

Name of Road: - Rajadth

Mahadalit to 9 to dilai

Mahadalit to 9.

Head - mmusy

Agency - mls Durgga Shakti
Construction.

Agreement No - 35/SBD/2019 19

Agreement date - 09/03/2019

Start date - 8/03/2019

Completion date - 7/12/2019

Item (1) providing and

fixing of typical

mmusy informatory

Sign board with Logo

with citizen - -

Qty - 2 COND

Item (2) providing and

clearing and grubbing

Road Land. - -

 $2 \times 5 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.105$ $2 \times 7 \times 30.0 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.147$

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Content of are
	No.	L.	B.	D.	
			BP Qty = 0.252 Hk		
2x 3x 30.00 x 3.50 x			$\frac{1}{10000} = 0.06$		
2x 6x 30.00 x 3.50 x			$\frac{1}{10000} = 0.126$		
2x 6x 30.00 x 1.50 x			$\frac{1}{10000} = 0.052$		
2x 3x 30.00 x 3.50 x			$\frac{1}{10000} = 0.063$		
2x 1x 20.00 x 1.50 x			$\frac{1}{10000} = 0.006$		
2x 1x 10.00 x 3.50 x			$\frac{1}{10000} = 0.007$		
			Qty = 0.571		
Item (3) Providing and fixing of working benchmark pillars--					
			Qty = 1.00 Nos		
Item (4) Providing and fixing of working Reference pillars--					
			$\frac{930}{250} = 3.72$ Nos.		
Ppate 03/10/19 20					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	Nc.	L.	B.	D.	
Record Measurement					
Name of Road:- Rajadeth					
mahadalit to 9 to fider					
mahadalit Tola. --					
Heard - mmcrsy					
Agency - M/S Durga Shakti					
Construction.					
Agreement No - 35/SB/19-20					
Agreement Date - 08/03/2019					
Start Date - 08/03/2019					
Completion Date - 07/08/2019					
Governing auth H.P.C.					
Item (1) Providing Earth					
Work in excavation					
of fender. ---					
$1 \times 2 \times 3.90 \times 1.150 \times 1.50 = 13.45 \text{ m}^3$					
$1 \times 1 \times 5.350 \times 1.130 \times 0.365 = 2.20 \text{ m}^3$					
Qty = 15.65 m ³					
Item (2) Providing p.c.c					
as levelling course					
in fender. ---					
$1 \times 2 \times 3.90 \times 1.150 \times 0.150 = 1.35$					
$1 \times 1 \times 5.311 \times 1.130 \times 0.250 = 1.50 \text{ m}^3$					
Qty = 2.85 m ³					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (3) providing plain Reinforced Cement concrete in sub-st-structure - - -					
$1 \times 2 \times 3.60 \times \frac{(1.00 + 0.70)}{2} \times 1.35$					$= 8.26 \text{ m}^3$
$1 \times 2 \times 3.60 \times \frac{(0.70 + 0.40)}{2} \times 1.43$					$= 5.66 \text{ m}^3$
$1 \times 2 \times 3.60 \times 0.40 \times 0.60$					$= 1.73 \text{ m}^3$
Less pipe $1 \times 2 \times \frac{3.14}{2} \times (0.83)^2 \times 0.58$					$= (1) 0.57 \text{ m}^3$

$$Q_{H} = 15.08 \text{ m}^3$$

Item (4) providing m/s laying in R.C.C pipe					
N/3 for culvert in first class bedding					
$1 \times 3 \times 2.50$					$= 7.50 \text{ m}$

~~Rajadik~~
13/10/19
28

Recd of measurement -

Name of Road - Rajadik
Mahadik hla to Ailar
Mahadik Tola.

Continuation

4th & Final Bill.

59

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road:-	Rajadish				
Mahadashit tola to Eilai					
Mahadashit tola					
Agency -	M/S Dugga Shakti Const.				
Agreement No -	35/SB3/2018-19				
Agreement Date -	09/03/2019				
Start Date -	08/03/2019				
Completion Date -	7/12/2019				
Actual Measurement Date	26/10/20				
By	12/6/21	12/6/21			
At					

Abstract of cost.

Name of Road:-	Rajadish			
Mahadashit tola to Eilai				
Mahadashit tola				
Agency -	M/S Dugga Shakti Const.			
Agreement No -	35/SB3/18-19			
Agreement Date -	09/03/2019			
Start Date -	08/03/2019			
Completion Date -	7/12/2019			
Measurement Date	NIL.			
Item 1/6 providing				
fixing of typical masonry				
information sign board				
to maintenance at				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			68	11495	
Less be/oc	10/1	(C)	68	61497	= 0
61,75,345	PS2		61753	4720	
duct less ppr			52525	3620	
	PS2		922	811	= 0
			9,22	809	= 00
ORDER					
12/6/21		(Rough)			
JE		12/6/21			
		A.E.			
C2P					
12/8/21		10/7			
JE					

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
4th & Final Bill					
Progressive value			61753	95	ac
Final payment			5252	536	ac
Final payment			922	809	ac
SD (a)	51		46140	00	
SD (b)	52		27654	00	
SD (c)	1		9228		ac
SD (d)	1		9228		ac
SD (e)	1		9228		ac
SD (f)	1		9228		ac
SD (g)			12751	200	
SD (h)			13017	00	

SD (i)			14772	00	
SD (j)			1409	00	
SD (k)			1409	00	
SD (l)			1409	00	
SD (m)			1409	00	
SD (n)			1409	00	
SD (o)			1409	00	
SD (p)			1409	00	
SD (q)			1409	00	
SD (r)			1409	00	
SD (s)			1409	00	
SD (t)			1409	00	
SD (u)			1409	00	
SD (v)			1409	00	
SD (w)			1409	00	
SD (x)			1409	00	
SD (y)			1409	00	
SD (z)			1409	00	

Executive Engineer

Rural Works Department

Works Division, Bikaner
