

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-cc.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 2023-67177 हिलसा, दिनांक 24-12-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष NABARD योजना अन्तर्गत Nalanda Jila Antargat Utkhanan Parisar Telhara Nalanda Se Jatan Lohar Hote NH 110 Tak Sadak Ka Nirman Karya पथ का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष NABARD योजना अन्तर्गत Nalanda Jila Antargat Utkhanan Parisar Telhara Nalanda Se Jatan Lohar Hote NH 110 Tak Sadak Ka Nirman Karya पथ का सम्वेदक Sri Sujcet Kumar है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-06/2018-19 एवं एकरानामा की राशि रु०-60,57,828.00 (साठ लाख सन्तावन हजार आठ सौ अठाईस) रु० मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-03.03.2019 एवं समाप्ति की तिथि-02.03.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-31.01.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की नोंग की गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण पथ ग्रामीणों द्वारा जमीन विवाद बताया गया है। कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, एकंगरसराय एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल प्रमण्डल, एकंगरसराय के द्वारा दिनांक-31.01.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल आवेदन को दिनांक-31.01.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, फोटोग्राफ एवं मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Const of 20 ad form left hander for 1500 telling str
(2) Name of Contractor :- str subject matter station color hole HH110 fall under NABARD 24 Ekampuram Alack
(3) No. of agreement order :- 062120/18-19
(4) Date of commencement of work :- 3-3-2019
(5) Contractor's date of completion of work :- 2.3.20
(6) Date of Actual Completion:-
(7) Date of hindrance :-
(8) Provision extension date :- 31/1/21
(9) Further extension of time rewarded:-
(10) Reference of contractor's application if any :-
(11) If any defects have been found the work date :-
(12) Region :-
(13) Proportion of work date up to completion of time :-
(14) Proportion of up date work done :-
(15) Recommendation of J.E. :- हमारी प्लीजो हाव बिना कामीन बिना covid 19 के
(16) Recommendation of A.E. :- काम लक्षण काम नही है हमारे 31-1-21 तक लक्षण
निम्नलिखित भी काम हमारी प्लीजो
28-9-20
J.E./A.E.
Signature
(17) Final order or recommendation of the E.E.:-

Signature of Contractor

Signature of Contractor

Signature of

Signature of

Executive Engineer



D. A. H. J.

ASSOCIATION, HILSA (NALANDA)

C

शपथ-पत्र Affidavit

Witnessed that on 25-9-2020
no has identified by Sri S. A. H. J.
Advocate has affirmed on S A before
e the facts stated in the Affidavit

No. 5892 Date 25-9-2020

NOTARY

समस्त, Hilsa (Nalanda)

Authorized U.S. (H)

सेख्य प्रमाणक हिल्सा नालन्दा

Dilip Kumar

NOTARY

Hilsa, Nalanda (Bihar)

शपथ पत्र

मैं सुजीत कुमार पिता रघु भलु महतो, साकिन+पोड+धाना- तेल्हाड़ा, जिला- नालन्दा बिहार धर्म-हिन्दु, राष्ट्रीयता भारतीय पुर्यक व्याप्त करता हूँ।

1. यह कि मेरे द्वारा नार्वाड योजना अन्तर्गत उत्खनन परिषद तेल्हाड़ा नालन्दा से जतन लोडर होते एन0एच0 110 तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
2. जिसका एकरारनामा सं0- SBD 56/ 2018 - 2019 (Date - 03-03-2019) जिसका कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 03.03.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि - 03.03.2020 था।
3. यह कि पथ में स्थानीय लोगों द्वारा कई काफी विवाद उत्पन्न रहने के कारण पथ निर्माण कार्य करने में काफी समय भ्रष्ट हुआ। जिसके कारण कार्य निष्पादन करने की अवधि के अन्तर्गत कार्य पुरा नहीं हो सका है।
4. यह कि कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन होने से कार्य का निष्पादन स समय पूर्ण नहीं हो सका।
5. यह कि अब मेरे द्वारा यह कार्य दिनांक - 31/01/2021 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
6. यह कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरान्त मुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के बड़े हुए दर का दावा पेश नहीं करूँगा। उपर लिखि गयी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य हैं।

शपथ पत्र हाजा को पढ़ को पढ़वाकर
सुन को समझ लिया और सही पाकर
अपना हस्ताक्षर बना दिया।

S. A. H. J.

शपथकर्ता का हस्ताक्षर



4591

I identify the Signature L.T.I.
of deponant... S. A. H. J.
Who has put his/her signature/
or L.T.I. in my presence.

S. A. H. J.



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, हिलासा।

दिनांक- 25.6.2020

राजमती देवी, सरपंच ग्राम- कचहरी- तेलहाडा, एमंगरस
नालन्दा ने आवेदन देकर अवगत कराया कि उत्खनन
परिसर तेलहाडा, नालन्दा से जतन लोहार होते हुए NH-110
तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था, लेकिन बुद्ध विहार
के पल्लव कार्य करने में देर हो गई थी। सड़क निर्माण
के लिए सिर्फ कांजीकरण करना बाकी रह गया है।

उत्तर: मैरा आपसे अनुरोध होगा कि इनके
परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए
उक्त सड़क का निर्माण के लिए समय बग दिया
जाय।

भवदीय
कोशाशेन्द्र कुमार
25.6.20

सेवा में

श्री भानु कार्यपालक अभियन्ता महीदय

कार्य प्रमाणपत्र, हिलमा (नालन्दा)

विषय: - सड़क निर्माण के काम में ग्रामीणों द्वारा जमीन सबन्धी काफी विवाद उत्पन्न होने के सबन्ध में /

महोदय,

निवेदन पूर्ण कहना है, कि आपके विभाग के द्वारा संवेदक (सुजीत कुमार) को उत्खनन परिसर रीलहाड़ा नालन्दा से जलन लौटार होने N.H.-110 पर सड़क का निर्माण कार्य करने के लिये दिया गया था। इस पथ का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल रहा था। लेकिन कुछ लोग सड़क के किनारे का जमीन मालिक अपने घर से बाहर कमाने के लिये रास्ते दुर्जे थे, वो सभी लोग करवी माह 2020 में अपने घर वापस आये, उसके बाद सड़क निर्माण कार्य को होते देख अपना जमीन में सड़क बनने का जिक्र करने लगे और आक्रोश से कार्य को रुकित करने को कहने लगे। उसके बाद संवेदक सुजीत कुमार हमारे पास आये, और सड़क निर्माण कार्य में रुका पड़ने वाले व्यक्ति के बारे में बताया। तब हमने रीलहाड़ा पंचायत के सम्पर्क होने के लिये विवादित जगह पर जाकर सम्झौते का प्रयास किया लेकिन वह व्यक्ति टाल-मटोल करता रहा। पुनः संवेदक के आग्रह करने पर मैं भानुजीय सांसद महीदय (श्री कौशलेन्द्र प्रसाद) जी को सूचना दिया। उसके बाद मार्च 2020 में भानुजीय सांसद महीदय विवादित जगह पर आये और सभी लोग से मिलजुल कर विवाद को निपटारा किया और मुझे संवेदक द्वारा कार्य करवाने के लिए कहा गया। उसके कुछ ही दिन बाद कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण संवेदक द्वारा कार्य सम्मय पूर्ण नहीं हो सका।

राजश्री देवी
13.03.2020
सरपंच

राज कचहरो तेवहाड़ा
रुंवर वसुध (नालन्दा)

પગાનું નક્કી કરાવેલું છે. નિ
 રૂ. માટે પુરુષ મે. મહાગુરુ રૂ. મા
 મી. રૂ. ૧૦૦ (૧૦૦ રૂ.) પુરુષ
 જિલ્લા મે. મહાગુરુ રૂ. માટે
 સહાયક અધિકારી સમક્ષ રૂ. માટે
 રૂ. માટે પ્રમાણ રૂ. માટે
 રૂ. માટે રૂ. માટે રૂ. માટે

Executive Engineer
 Rural Works Department
 (Works Division, Hilsa)

The MB is referred to an
 Vender K. Dye, J. E. (Kangasana)

8/5/2015
 A.B.

Sch. XLV—Form No. 34

Expenditure for 1937

First Entry for DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 34

Name of Officer

Date of first entry

Date of last entry

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

(i) Name of work - Canal of ground from

14/11/2013

Station Labour for N.H. 100 km under

NABARD in Ekamra Sarni Block.

(ii) Name of Contractor - Shri. P. K. Sharma

(iii) Agreement No. - 1/1/1/1/1

(iv) Date of start - 09.07.2013

(v) Date of completion - 02.08.2013

Receipt entry

SN.	Sl. No.	Area	Mean Area	Subst.	Volume
1	0-50	2.00			
2	50	2.70	2.85	50	117.50
3	100	1.80	2.10	50	94.50
4	150	2.0	1.75	50	87.50
5	200	2.30	2.25	50	112.50
6	250	2.0	2.25	50	112.50
7	300	2.50	2.25	50	112.50
8	350	2.50	2.50	50	125.00
9	400	1.22	1.45	50	92.50
10	450	1.0	1.10	50	55.00
11	500	1.0	1.0	50	50.00
12	550	1.0	1.0	50	50.00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
SCM.	Charge	Area	Mean Area	Depth	Volume
13	6.00	0.00	0.50	50	25.00
14	6.50	0	0	50	0.00
15	7.00	0	0	50	0.00
16	7.50	0	0	50	0.00
17	8.00	0	0	50	0.00
18	8.50	0	0	50	0.00
19	9.00	0.0	1.50	50	75.00
20	9.50	0.8	1.20	50	98.00
21	10.00	0.60	0.40	50	20.00
22	10.50	0.00	0.00	50	0.00
23	10.00	0	0.00	10	0.00
24	0.00	1.00			

25	50	2.50	1.75	50	87.50
26	30	2.00	2.25	30	67.50

1390.00 m³

Work (2) chime and plaster of roof

$$37 \times 30m \times 3.5 = 3885 m^2$$

$$1 \times 10m \times 3.5 = 35 m^2$$

Item (3) providing subgrade and

earthen slop (1:1)

$$37 \times 30m \times 3.75 \times 0.3 = 1248.75 m^3$$

$$1 \times 10m \times 3.75 \times 0.30 = 11.25 m^3$$

1260 m³

10/5/17
J.E.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (13) Box of Blue (1.4) 5 inch					
(29)	10				
Qty per unit (11)					
40 m ³					
@ 6442 = 65 m ³					257982 = 10
Item (14) Box of plaster on cm (1.4)					
(30)	10				
Qty per unit (10)					
340 m ²					
@ 179 = 67 m ²					61088 = 10
Item (15) Box of cement punny					
(31)	10				
Qty per unit (12)					
340 m ²					
@ 47 = 99 m ²					16317 = 10
Item (16) Box of dyer of 5 inch					
(32)	10				
Qty per unit (16)					
2.00					
@ 9442 = 44225 = 18985 = 00					
					3897298 = 10
Less 101					389730 = 10
					3507568 = 10
Less previous 44					2470151 = 10
					1037417 = 10
Sum					
301170					
J.C. / E. K. J. S. S.					




बिहार सरकार
राज्य योजनान्तर्गत

सड़क का नाम- उत्कलन परिसर तेलहाड़ा तालाब से जलन लोहार होते एम.एच.
110 तक सड़क निर्माण कार्य।

कुल लम्बाई = 1.120 कि.मी. वी.टी.सडक 1.120 कि.मी.

पुलिया-२ नडा

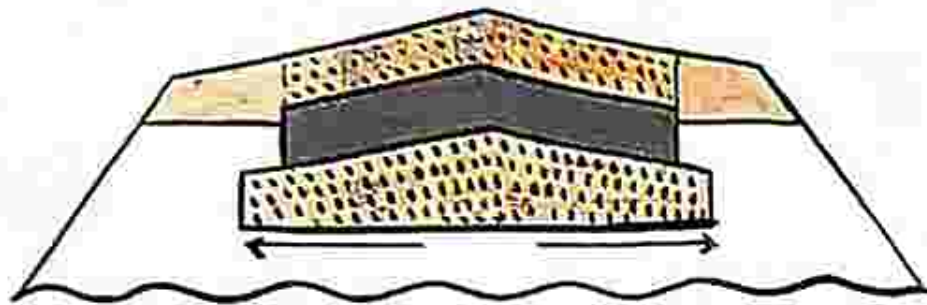

1. बंधनका मिट्टी कार्य 3037 घनमी. (268 ट्रक के समतुल्य)
पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ।

2. दातेदार उपआधार 912 घनमी. (81 ट्रक के समतुल्य)

मामा यत्न मी (इक के सलदुनय)

मिहरी आनी कीश (पेकल) एकली दूक के समतुल्य)

पत्थर का घुस घुस (दक के सानु-य)

3. जिंटी कृत परत या 2 परतों में उबलू बी.एस. प्रत्येक परत 1.5 से.मी. मोटी घन मी. प्रत्येक परत अलग-अलग निमित्त की जायेगी।

मिटर 317 घबसी/34 दूक के समतुल्य

पथर का बूरा/मुरम 72, धतमी. (6 इक के समतुल्य)

पंथरका युग/दुर्गम १२

4. संश्लेषण यह एक संश्लेषण प्रतिक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक अणु एक साथ जुड़कर एक बड़े अणु को बनाते हैं।

राजका हात बायल 35 07 07

इस के समझना

विद्यार्थी (2019-20) 2. प्रश्न के संश्लेषण)





REDNOTE
ALVIN TAYLOR

