

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक... 984अनु० / बिक्रमगंज / दिनांक... 10/8/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:- MMGSY (S.C) योजनान्तर्गत Hathdiha to Nawdih में समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि MMGSY (S.C) योजनान्तर्गत Hathdiha to Nawdih का कार्य संवेदक श्री राजु कुमार सिंह, को दिनांक-08.03.2021 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का समय दिनांक-07.03.2020 था परन्तु कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा प्राप्त आवेदन में जमीन विवाद एवं सार्वजनिक बाधा का उल्लेख किया गया है। जिसके कारण कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक-31.10.2020 तक पूर्ण करा लिया जायेगा, संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के द्वारा अनुशंसित आवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक श्री राजु कुमार सिंह, द्वारा कार्य में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

अतः उक्त कार्य का दिनांक-31.10.2020 समय वृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

P. N. S.
10/8/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- *Hafatila to Nawadth*
2. Name of Agency :- *Raju Kumar Singh*
3. Date of written order to commence the work :- *08.03.2019*
4. Contract date of the Completion:- *07.03.2020*
5. Extension date of the Completion:- *31.10.2020*
6. Agreement No. :- *33SBD/2018-19*
7. Upto date Payment :-
8. Agreement Value :-
Consf. cost - 104.68527
Mant. cost - 11.24611

115.93138
31.10.2020
9. Time applied for :-
10. Cause of extension of time :- *Land dispute and Public Licence*
11. Signature of contractor with date:- *Raju Kumar Singh*
12. Recommendation of Junior Engineer :- *Recommended* *[Signature]*
08/08/20
JE
13. Recommendation of Assistant Engineer :- *Recommended* *[Signature]*
08/08/20
AE
14. Recommendation of Executive Engineer :- *Recommended.*
P. N. Singh
10/8/20
EE



बिहार BIHAR

राजु कुमार सिंह
पता- संतोषी माँ पथ सासाराम

Z 511288

अनिल कुमार गुप्ता
मुद्रांक विभाग
ला. नं०-53/96
अवर निबंधन कार्यालय
विक्रमगंज (रोहतास)

शपथ पत्र

मैं राजु कुमार सिंह, ग्राम + पो०- संतोषी माँ पथ सासाराम, रोहतास (बिहार) शपथ

पूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूँ।

1. यह की मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह की पथ का नाम Hathdiha to Nawadih का कार्य सम्पन्न किया जाना है।
3. यह की मेरे द्वारा जमा किया गया सभी कागजात सही है।
4. यह की कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है।
5. यह की बड़े हुए दर का दावा नहीं करूंगा।

सत्यापन

मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ की इन शपथ पत्र की कंडिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता

ने मेरे समक्ष अपनी हस्ताक्षर की है।
The deponent/exculant who has put
his/her signature in my presence

अधिवक्ता

शपथकर्ता

04.12.2020

कार्यालय, अंचल अधिकारी दावथ रोहतास।

पत्रांक...4106..... दिनांक...7.7.2020....

प्रेषक

अंचलाधिकारी,
दावथ।

सेवा में,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, दावथ।

विषय:- MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा सख्या-33 SBD/2018-19 के तहत Hathdiha to Nawdih पथ में अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक- शून्य/दिनांक-25.06.2020

महाथय,

उपर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा सख्या-33 SBD/2018-19 के तहत Hathdiha to Nawdih का कार्य निष्पादन हेतु पत्रों का अवलोकन के क्रम में पाया गया कि भवदीय का निष्पादन नहीं हुआ है। पत्र निष्पादन हेतु स्वयं द्वारा जाँच किया गया। जाँच के क्रम पाया गया कि उपरोक्त सड़क निर्माण का कार्य पुरा कर लिया गया है, परन्तु उपस्थित कुछ लोगों से पुछताछ किया। उनलोगों द्वारा बताया गया कि सड़क के किनारे बने सिंचाई हेतु करहा के लिए कुछ लोगों के द्वारा विवाद कर सड़क निर्माण कार्य बाधित कर रोक दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों के आपसी सहमती से विवादित लोगों को समझा बुझाकर सड़क का निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन



Name of work-
 Location of work-
 Agency by which work is executed-
 Date of measurement-
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Record Entry					
N/W - Hathodika to Nawadik					
Agency - Raju Kumar Singh					
Agreement No - 33567/18-79					
Date of starting - 9/03/19					
Date of completion - 08/03/20					

(1) Setting out pillars					
(a) Bench mark pillar - 2 Nos.					
(b) Reference pillar - 6 Nos.					
(2) clearing & grubbing of road land -					
$2 \times 10 \times 30m \times 3.50 =$				$2160m^2$	
$2 \times 10 \times 30m \times 3.50 =$				$2100m^2$	
$2 \times 10 \times 30m \times 3.40 =$				$2040m^2$	
$2 \times 10 \times 30m \times 3.50 =$				$2100m^2$	
$2 \times 10 \times 30m \times 3.50 =$				$2100m^2$	
$2 \times 2 \times 30m \times 3.50 =$				$420m^2$	
$2 \times 11 \times 10m \times 3.50 =$				$770m^2$	
				$10999m^2$	
				$= 1.01 \text{ hec}$	

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Constn of deep well meet material obtained from borrow pit					
Chains	see H	Measure Area M ²	Measure Area M ²	Distance M	Qty M ³
0	2.196	—	—	—	—
50	2.674	2.435		50	121.75
100	3.07	2.872		50	143.60
150	3.818	3.444		50	172.20
200	3.76	3.789		50	189.45
250	3.924	3.842		50	192.10
300	4.354	4.139		50	206.95
350	4.574	4.464		50	223.20
400	2.712	3.643		50	182.15
450	2.665	2.689		50	134.43
500	3.616	3.141		50	157.03
550	2.879	3.248		50	162.38
600	1.175	2.027		50	101.35
650	1.954	1.565		50	78.23
700	1.889	1.922		50	96.08
750	1.491	1.640		50	84.50
800	1.206	1.349		50	67.43
850	1.099	1.153		50	57.63
900	2.151	1.625		50	81.25
950	2.201	2.176		50	108.80
1000	1.94	2.071		50	103.83
1050	1.703	1.822		50	91.08
1100	1.207	1.455		50	72.75
1150	1.171	1.189		50	59.45

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
D.WORK					
① E/W in excavation					
in foundry					
1000mm φ					
5 X 2 X 6.45m X 1.40 X 1.50 = 27.09m ³					
5 X 1 X 4.85m X 1.53 X 0.365 = 2.708m ³					
600mm φ					
5 X 2 X 3.90m X 1.15 X 1.50 = 67.275m ³					
5 X 1 X 5.35m X 1.13 X 0.365 = 11.033m ³					
					108.106m ³
② P/V pcc m 15 in foundry					
1000mm φ					
2 X 6.45m X 1.40 X 0.150 = 2.709m ³					
1 X 4.931 X 1.53 X 0.250 = 1.886m ³					
600mm φ					
5 X 2 X 3.90m X 1.15 X 0.25 = 6.727m ³					
5 X 1 X 5.31 X 1.13 X 0.25 = 7.501m ³					
					18.823m ³
③ P/V pcc m 20 in sub-structure					
1000mm φ					
2 X 6.15m X 0.825 X 3.18 = 32.269m ³					
less pipe portion					
2 X 0.7857 X (1.23) ² X 0.622 = 1.1478m ³					
600mm φ					30.791m ³
5 X 2 X 3.60m X 0.70 X 2.78 = 70.056m ³					
5 X 2 X 3.60m X 0.40 X 0.60 = 8.64m ³					
less pipe -					
5 X 2 X 0.7857 X 0.83 X 0.53 = 42.868m ³					
					75.128m ³
					67.138m ³
Total					97.979m ³
					106.614m ³

Continuation

Part	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of Qty and cost					
Setting out pillar					
② Bench mark vide					
P-1 = 2 No @ Rs 4628.73 each = 9257.46					
③ Reference pillar vide					
P-1 = 6 No @ Rs 2103.74 each = 12622.44					
④ Clearing & grubbing of road land vide					
P-1 = 101 m ² @ Rs 49739.42 per ha = 50237.41					
⑤ Constn of embankment material obtained from borrow pit vide P-3					
= 3088.97 m ³					

⑥ Lead 100 m = 2209.32 m ³					
⑦ @ Rs 132.58/m ³ = 1292867.00					
Lead 1000 m = 879.645 m ³					
⑧ @ Rs 187.23/m ³ = 164469.60					
⑨ Box cutting vide					
TMB P-3 = 31.35 m ³					
⑩ @ Rs 82.01/m ³ = 2571.00					
⑪ Constn of embankment material obtained from roadway cutting vide P-3					
= 18.81 m ³ @ Rs 27.98/m ³ = 526.00					
⑫ Constn of subgrade					
vide P-3 = 2610.00 m ³					
⑬ @ Rs 189.60/m ³ = 494856.00					

Continuation

Rs 1027632.00

1) P/V ...
 Value P = 10.70.291M³
 @ R 2998.80/M³ = 31982.01 = 10
 2) P/V ...
 Value P = 72.70.312M³
 @ R 4609.51/M³ = 324082 = 10
 3) P/V ...
 Value P = 108.106M³
 @ R 285.11/M³ = 30807 = 10
 4) P/V ...
 Value P = 18.823M³
 @ R 598.10/M³ = 1125.82 = 10

5) P/V ...
 Value P = 106.619M³
 @ R 6999.17/M³ = 746245 = 10
 6) SIF ...
 1000 mm φ = 7.50 M
 @ R 4437.60/M = 33282 = 10
 7) 600 mm φ = 37.50 M
 @ R 1205.18/M = 45194 = 10

10) P/V and fixing ...
 18 ... 2 No.
 @ R 10.53.33 each = 20307 = 10
 Rs 5528413 = 10
 less 10% = Rs 552841 = 10
 Rs 4975572 = 10
 Rs 30,00,000

Continuation

1) Bork
 28/6/19
 J.E. c.t.l
 P.m.
 578112
 28-08-19
 J.E.
 7-10-19

Form NO. 134					Contents of area
S. No.	Details of actual measurement				
	No.	L.	B.	D.	
300	Running Bill				
410	Hath diha to Newadik				
Agent - Rajukumar Singh					
Agreement No - 388BD/18-19					

① P/V ~~C&P~~ grading III

$$10 \times 30.0 \text{ m} \times 3.75 \times 0.075 = 84.375 \text{ m}^3$$

$$46 \times 30 \text{ m} \times 3.75 \times 0.075 = 50.625 \text{ m}^3$$

$$135 \text{ m}^3$$

② CP 10 CM

③ CP 10 cm excavation in foundation

$$2 \times 2 \times 3.90 \text{ m} \times 1.15 \times 1.50 = 26.91 \text{ m}^3$$

$$2 \times 1 \times 5.35 \text{ m} \times 1.13 \times 0.265 = 4.413 \text{ m}^3$$

$$31.323 \text{ m}^3$$

④ P/V PCC 15 cm in foundation

$$2 \times 2 \times 3.90 \text{ m} \times 1.15 \times 0.15 = 2.691 \text{ m}^3$$

$$2 \times 1 \times 5.311 \times 1.13 \times 0.25 = 3.00 \text{ m}^3$$

$$5.691 \text{ m}^3$$

⑤ P/V PCC 20 cm in sub-structure

$$2 \times 2 \times 3.60 \text{ m} \times 0.70 \times 2.78 = 28.022 \text{ m}^3$$

$$2 \times 2 \times 3.60 \text{ m} \times 0.40 \times 0.60 = 3.456 \text{ m}^3$$

$$31.478 \text{ m}^3$$

$$\text{less } 2 \times 2 \times 0.7857 \times (0.83)^2 \times 0.53 = 1.147 \text{ m}^3$$

$$30.331 \text{ m}^3$$

⑥ P/V RCC 12 mm H.P. 600 mm

$$2 \times 3 \times 2.56 \text{ m} = 15.00 \text{ m}$$

12/02/20
J.E

CA
R.M.

9/3/20
J.E

Continuation

			B/L	1525	50420✓
				178	66020✓

Pass - D A/E 17.6002 - Seven
6c 894-7512 and 400 all

~~P. 111~~
~~12212~~

RECEIVED
FBI - NEW YORK
JAN 10 1967

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK (100-108881)
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows]

93

Continuation





बिहार सरकार

CROSS-SECTION FLEXIBLE PAVEMENT



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

योजना का नाम :- हथडीहा से नावाडीह
 पथ की लम्बाई :- 1.570 कि.मी. एकरारनामा की राशि :- 115.93 लाख
 5 साल तक रख रखाव की राशि :- लाख
 कार्य प्रारम्भ की तिथि :- 08.03.2019
 कार्य समाप्ति की तिथि :- 07.03.2020
 सन्देशक का नाम :- राजु कुमार सिंह
 कार्यकारी एजेन्सी :- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बिक्रमगंज
 बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (बिहार सरकार) द्वारा संचालित

मिट्टी कार्य - 385569 घन मी.
 सब ग्रेड - 368897 घन मी.
 जी एस बी - 102207 घन मी.
 मेटल - 784766 घन मी.
 बालू - 422.04 घन मी.
 ग्रेड-3 - 450.40 घन मी.
 ग्रेड-3 - 544.98 घन मी.
 स्क्रिनिंग - 108.096 घन मी.
 P.C.C - 153.00
 सीमेंट - 5355 टन/बालू 6885 प्
 गिट्टी - 137.70 घन मी.
 इमल्शन - 85-4.271 MT KS-1388 MT
 बिंदुमन - 9.593 MT

~~Book~~
8/8/20
J.E.


~~S. PK~~
08/08/20
AG

~~P. Weller~~
07/8/20
EL

FILM

FUJICOLOR
QUALITY PAPER
DIGITAL



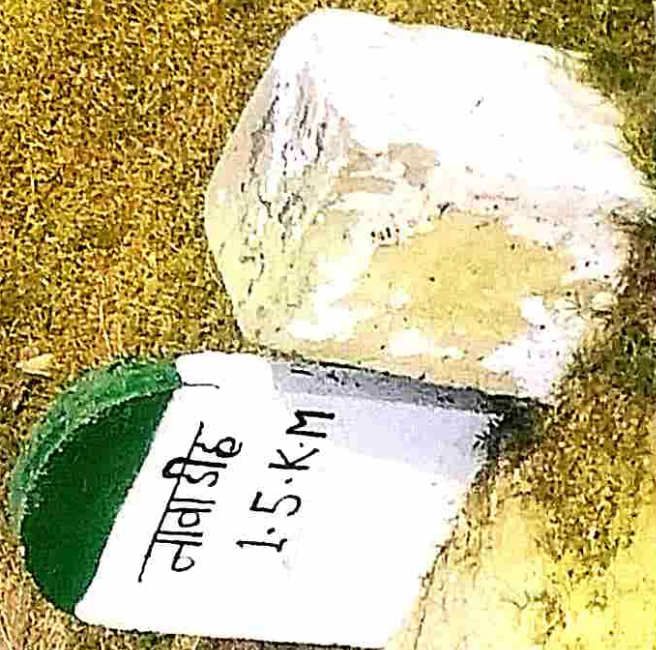

नवाडीह

1.5 KM



