

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

पत्रांक 514 (अनु०) /

नालन्दा/दिनांक 02.07.21 /

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

विषय :- शीर्ष-राज्य योजना (नाबाई) योजनान्तर्गत High Level Bridge Over Shashi River in Noorsarai Bara Bigha To Pandaychak तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत का पत्रांक-841 (अनु०) दिनांक-01.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि संवेदक श्री राकेश कुमार, ग्राम+पोस्ट-डोईया, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा के द्वारा कराये गये शीर्ष-राज्य योजना (नाबाई) योजनान्तर्गत High Level Bridge Over Shashi River in Noorsarai Bara Bigha To Pandaychak तक पथ निर्माण कार्य की अवधि विस्तार संबंधित आवेदन प्रपत्र एवं प्रासंगिक पत्र अनुशंसा के साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के द्वारा प्राप्त हुआ है।

अतः दिनांक 30.11.2021 तक अवधी विस्तार हेतु कार्यपालक अभियंता, हरनौत के अनुशंसा से सहमत होते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:-1. मूल आवेदन,

2. फोटोग्राफ,

3. शपथ-पत्र का प्रति,

4. संवेदक का पत्र एक प्रति,

5. अंचल अधिकारी नूरसराय का पत्र एक अदद।

विश्वासभाजन

Ambar
27/7/21

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

S...
11/7/21

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

- Rakesh kumar
1. Name of Contractor:- Rakesh kumar
 2. Name of Work:- Construction of High Level Birdge Over Shashi River in Noorrai Bara bigha to Pandi Shak Road.
 3. Agreement No. & Date:- 07/300/2019-20, 27.06.2019
 4. Agreement Value:- - 1,76,87,708.00
 5. Date Of Commencement:- 27-06-2019
 6. Actual Date Of Completion:- 26-06-2020
 7. Extension On Previously Given On:- NO
 8. Extension Applied For:- 30-11-2021
 9. Reason For Hindrance:- Land distribution (भूमि विवाद) in approach
 10. Percentage Of Work Done:- 98% has been work done.
 11. Recommendation BY The J.E. :- Time of extension may begin 28/05/2021
 12. Recommendation By The S.D.O. :- Time extension may begin 28-6-21
 13. Recommendation By The Executive Engineer:- forwarded with recommended 01.06.2021
 14. Recommendation BY The S.E. :- C/S
 15. Final Order Of The C.E. :- अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, नालन्दा

Signature of the Contractor

26/4/2020

अधीक्षण अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय अंचल अधिकारी नूरसराय (नालन्दा)

पत्रांक: ४५१

दिनांक ०६.०५.२१

अंचल अधिकारी,

नूरसराय।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल (हरनौत)।

विषय :

H.L.R.C. बारा विगहा पुल के सम्पर्क पथ के निर्माण के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि H.L.R.C. पुल निर्माण का कार्य प्रमण्डल हरनौत के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें बारा विगहा ग्राम के तरफ जाने वाले रास्ता में ग्रामीणों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसके कारण कार्य बाधित हो गया था। विवाद को मुश्किल के अध्यक्षता में ग्रामीणों द्वारा आपस में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया तथा वर्तमान में इस प्रकार का विवाद कार्यालय के सज्ज्ञान में नहीं है।

अतः निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।

सादर सूचनार्थ।

विश्वसिभाजन

०६/०५/२१
अंचल अधिकारी,
नूरसराय।



शपथ-पत्र Affidavit

Notary Public, Bihar, 2020-SL: No. 18273
Who has been known by Srv.
Advocate solemnly affirmed and
notarized before me the facts stated
in the affidavit are true

NOTARY PUBLIC
BIHAR
(Notary)

Affidavit No. 142314
Authorized U/S (1) of Notaries
Act, 1952 and U/Rules 11 (4) (B)
Not Notaries R. 2 1952

समक्ष,

नोटरी पब्लिक,
बिहार शरीफ, नालन्दा।

शपथ-पत्र

मैं, राकेश कुमार पिता स्व० झुलन प्रसाद, ग्राम + पोस्ट- डोईया,
थाना- नूरसराय, जिला- नालन्दा

1. यह कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हरनौत के अधीन नवार्ड योजना अन्तर्गत नूरसराय बाजार से बारा बिगहा पाण्डेयक रोड में सासी नदी पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पूल निर्माण कार्य एकरानामा संख्या- 07/एफ०बी०डी० 2019-20 है।
2. यह कि मेरा विभाग के पास अवधि विस्तार भुगतान के अलावा कोई बकाया नहीं है।
3. यह कि यह कार्य एकरानामा के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण एवं संतोष पूर्ण कार्य कर रहा हूँ।
4. यह कि नदी में पानी रहने एवं पहुँच पथ में/विवादित जमीन के कारण समय पर कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है।
2. यह कि उपरोक्त निर्माण कार्य में छः माह की अवधि विस्तार करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बातों को पढ़कर समझ लिया और सही पाकर
अपना हस्ताक्षर बना दिया।



राकेश कुमार
शपथकर्ता

I identify the signature/L.T.I. of
Deponent ... राकेश कुमार ...
Who has put his/her Signature
or L.T.I. in my Presence.

Advocate


En. No. 126/89


Mob. No.

नालन्दा जिला अधिवक्ता राध, बिहारशरीफ।

1076-5231-2000-000000000000



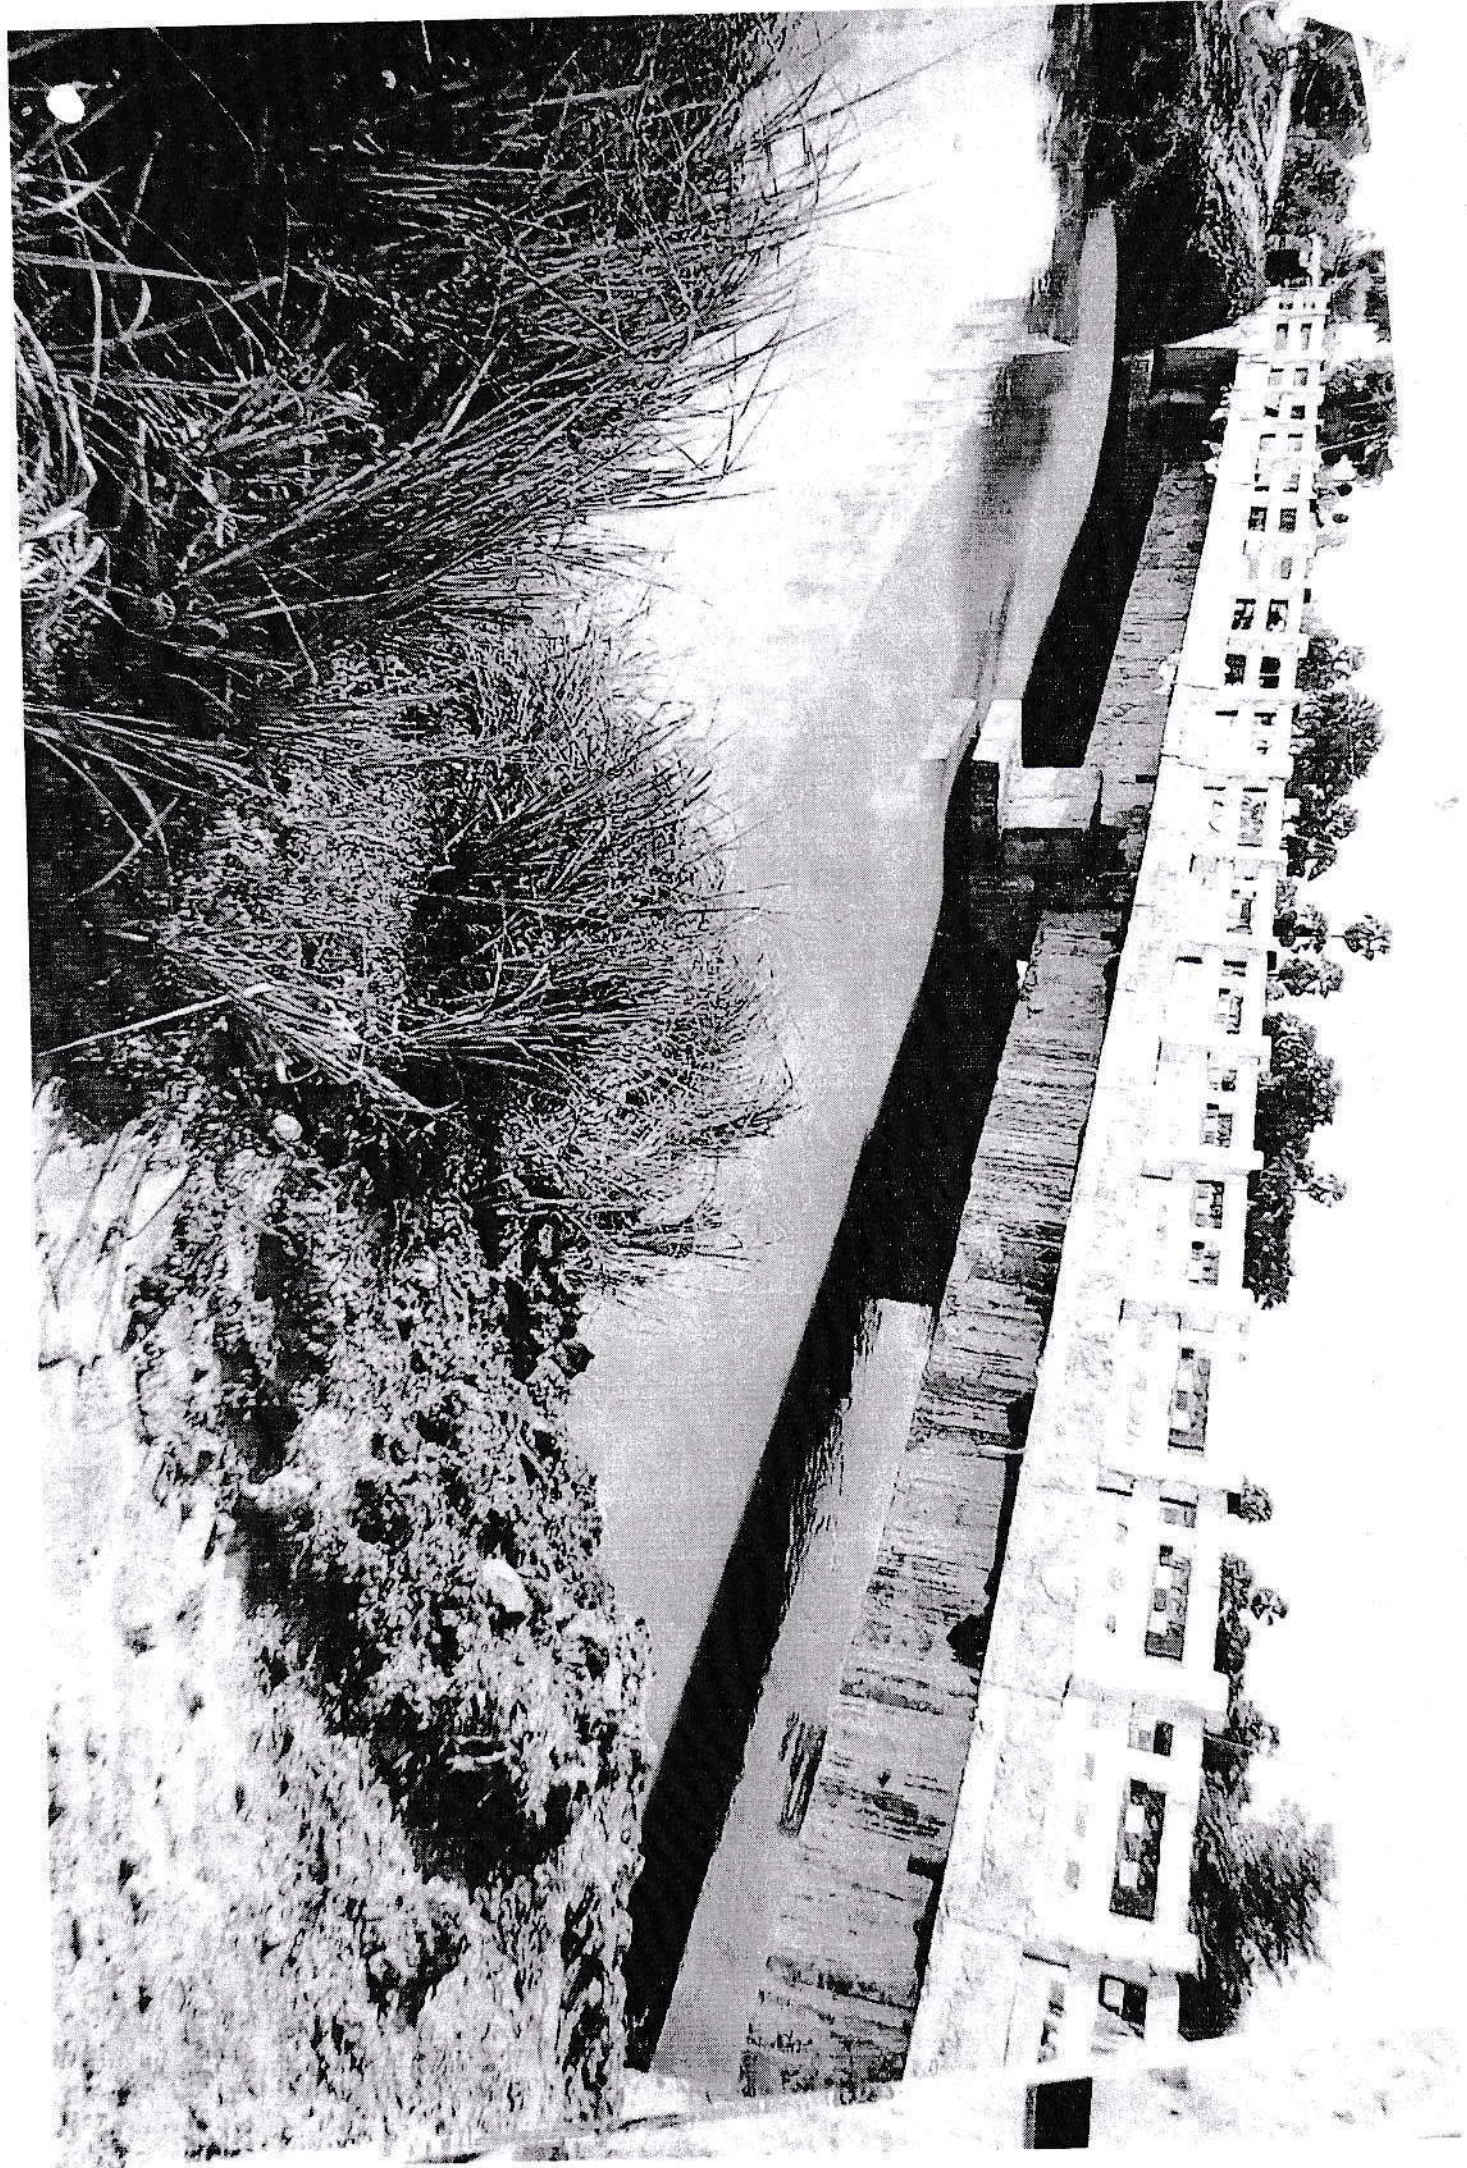

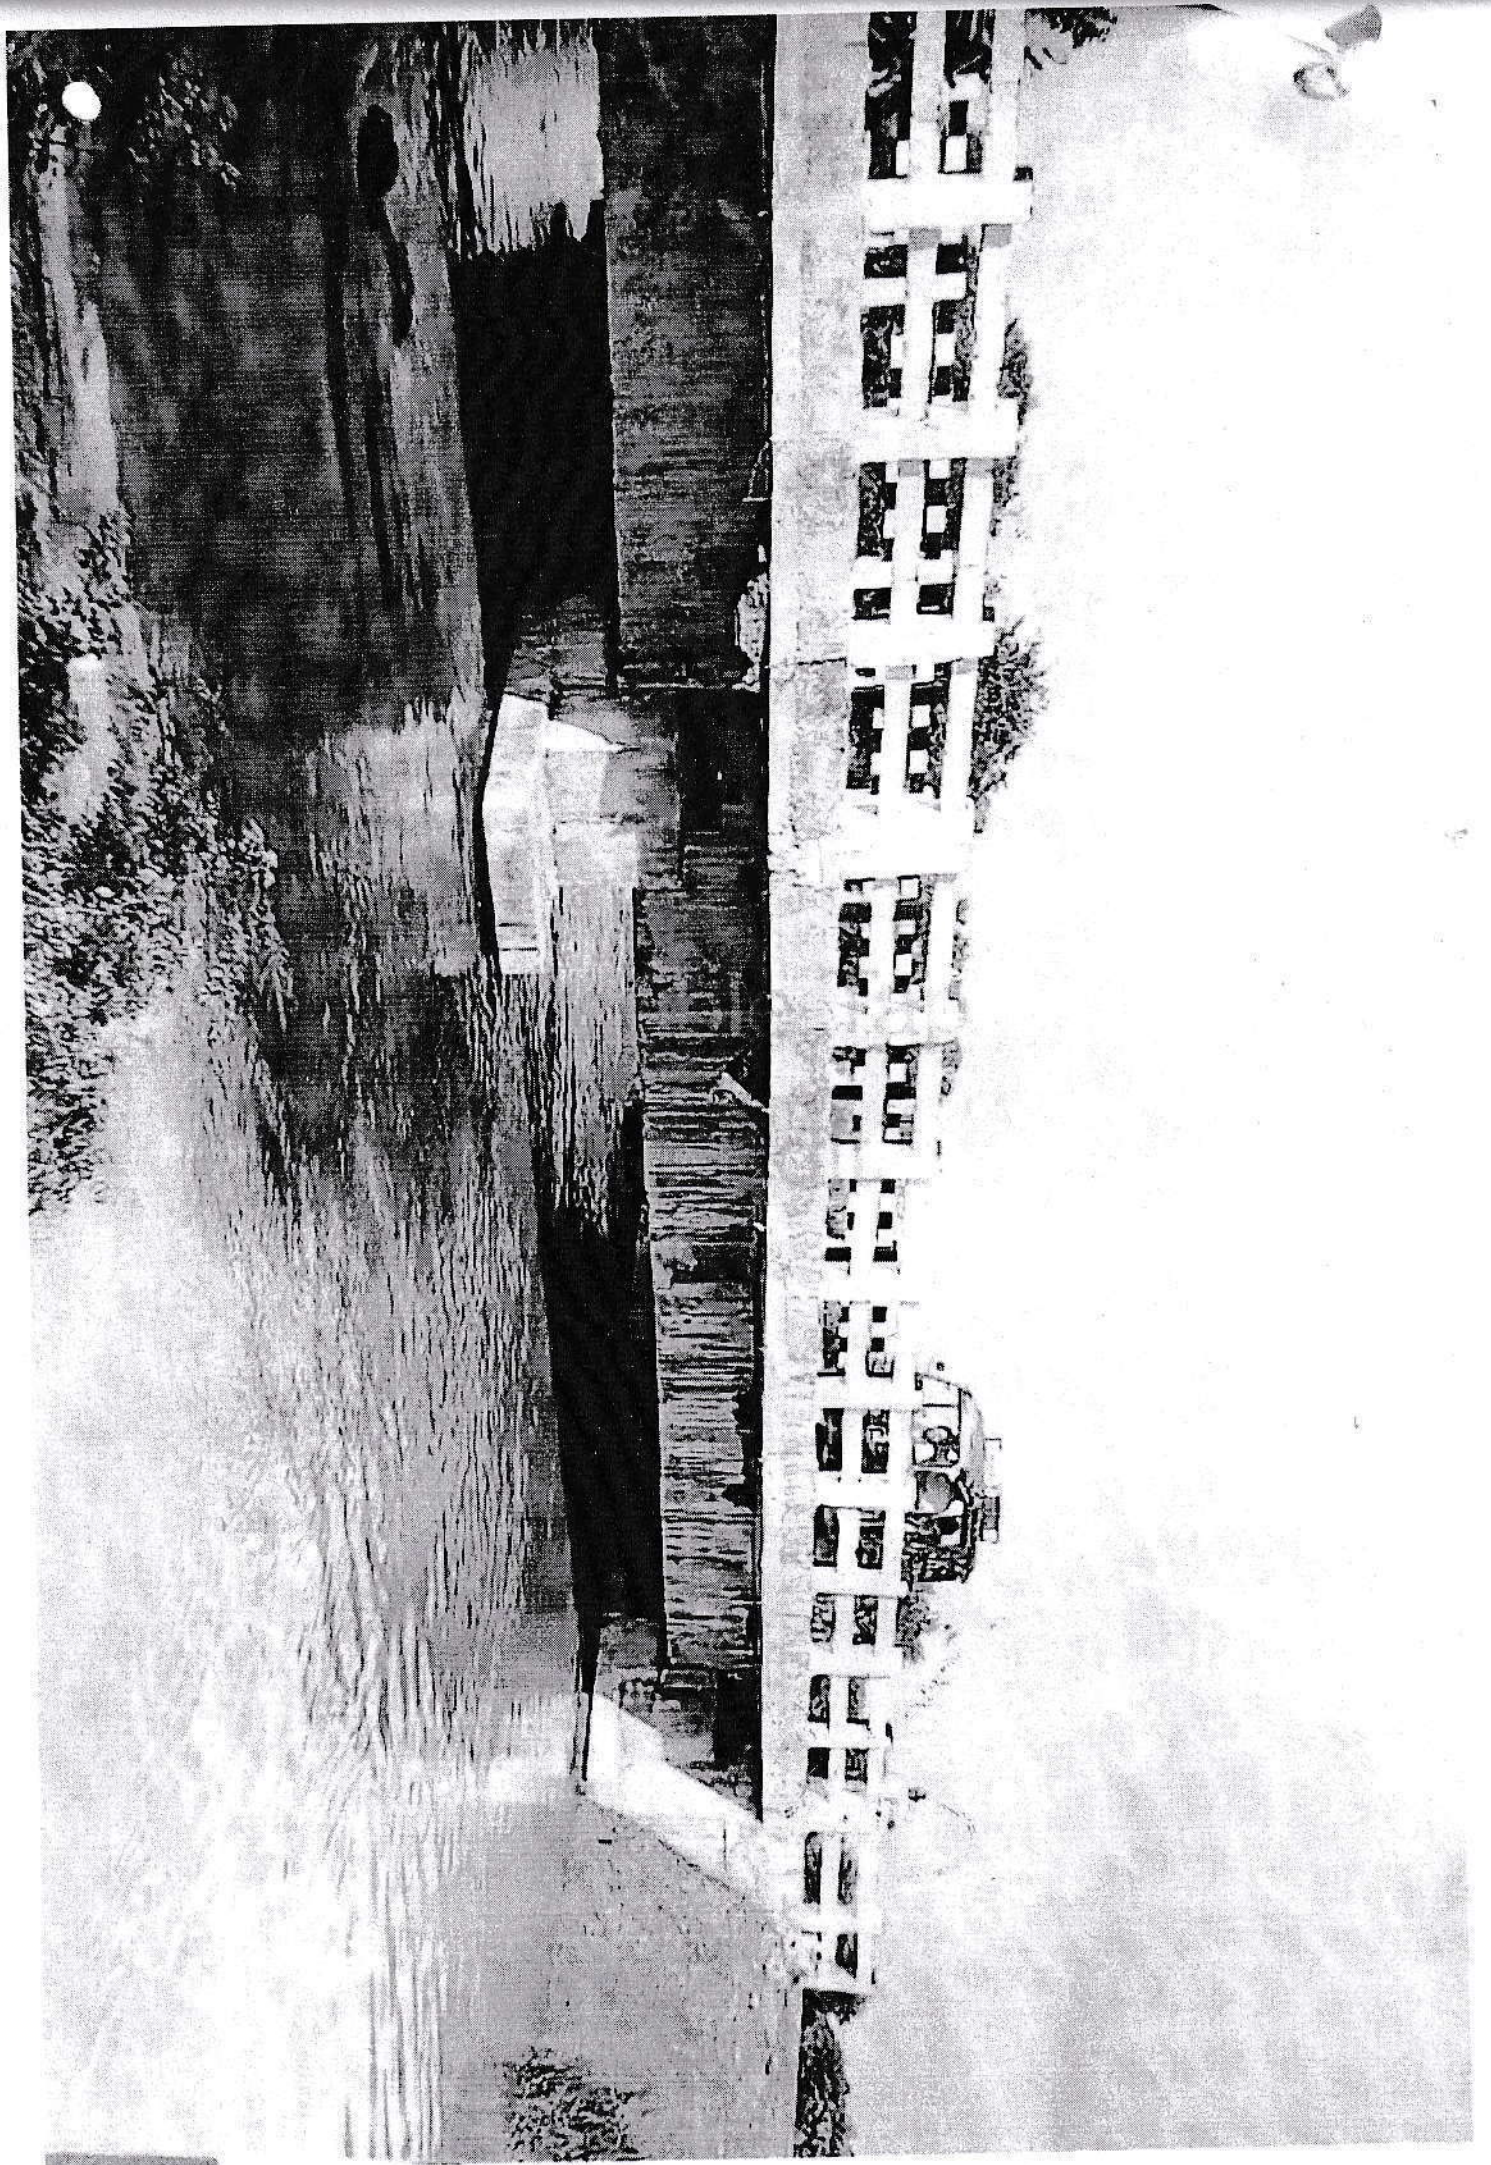

Latitude: 25.261765
Longitude: 85.438527
Elevation: 51.13192 m
Accuracy: 5.0 m
Date: 23-03-2021 12:28
Note: Shashi nadi rooprai me Bara bigha se pandeychak path



शीर्ष योजना 4515 (नोवार्ड)

पथ का नाम: शाशी नदी नूर सराय में बारा बिगड़ा से पांडे चक पथ

प्राक्कलित राशि: 1.75.69.889.00 लाख पैकेज सं: 07/58D/2019-20

पाँच वर्षीय रख-रखाव की राशि: 1.17.820.00 लाख

कार्य प्रारंभ की तिथि: 27-06-2019 कार्य समाप्ति की तिथि: 26-06-2020

संबेदनक का नाम: राकेश कुमार

कार्य एजेन्सी: कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल इस्बोल

Konieczność nadzwyczajnie barabigłia ze pandeychhak path

NABARD
RURAL WORKS DIVISION HARNAUT (NALANDA)

R.W.D. WORKS DIVISION HARRIS (INTERIOR)
NAME OF WORK CONSTRUCTION & FIVE YEAR MAINTENANCE
TEARFILL COVER IN MOOREBARI BAPA BIGHA TO

CONSTRUCTION & FIVE YEAR INVESTMENT
"SHASHI RIVER IN MOORSARI BARA BIGHA TO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835

PANDEY CHAK ROAD (TENDER ID 73097)

UNDER STATE SCHEME (NABARD) YEAR: 18 19

NAME OF AGENCY RAKESH KUMAR DOYA NALANDA (B/D No 33177)

AGREEMENT No. 07580/2017-20

AGREEMENT No 07/80/2017-20
ACCEPTED RATE 10.21/BELEM OF BCG RATE

CONSTRUCTION COST 1,75,67,889.00

MAINTENANCE COST 117,026.00

AGREEMENT VALUE 176,873.00

DATE OF AGREEMENT 27-04-2019

DATE OF AGREEMENT 27 08 2017
INTENDED DATE OF COMPLETION 26 08 2020

SUMMARY OF 5 YEAR MAINTENANCE COST

SUMMARY OF 5 YEAR MAINTENANCE COST
CONSTRUCTION OF HIGH LEVEL R.C.C. BRIDGE OVER SHASHI
CANE CANAL CHAK ROAD UNDER

CONSTRUCTION OF HIGH LEVEL R.C.C. BRIDGE
RIVER IN MOORSARAI BARA PANDEYCHAK ROAD UNDER
MOORSARAI DISTRICT NALANDA

RIVER IN NOORSARAI BLOCK FUNDING
NOORSARAI BLOCK NOORSARAI DISTRICT NALANDA

| PARTICULARS | QUANTITY | UNIT | 5 YEAR MAINTENANCE COST | |
|--|----------|------|-------------------------|---------------|
| | | | RATE | AMOUNT IN RS. |
| 1ST YEAR MAINTENANCE COST | 0200 | KM | 37065.00 | 7413 |
| 2ND YEAR MAINTENANCE COST | 0200 | KM | 58470.00 | 11694 |
| 3RD YEAR MAINTENANCE COST | 0200 | KM | 124670.00 | 24934 |
| 4TH YEAR MAINTENANCE COST | 0200 | KM | 177425.00 | 35485 |
| 5TH YEAR MAINTENANCE COST | 0200 | KM | 250760.00 | 50152 |
| GRAND TOTAL COST OF 5 YEAR MAINTENANCE COST 127000 | | | | |
