

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार।**

पत्रांक :- **901**
प्रेषक,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कटिहार।

/कटिहार, दिनांक- 01-6-21

सेवा में,
अपर-मुख्य-कार्यपालक-पदाधिकारी,
BRRDA, 3रीं मंजिल, भूमि विकास बैंक भवन,
बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष New Maintenance Policy-2018 योजनान्तर्गत निर्माण हेतु आवंटन की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष New Maintenance Policy-2018 योजनान्तर्गत ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, कटिहार द्वारा विहित प्रपत्र में अधियाचना तैयार कर आपके अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
Ramar
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, कटिहार।
27.05.21

ज्ञापांक:- **901**
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, 3054 MR, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

/कटिहार, दिनांक:- 01-06-21

Ramar
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, कटिहार।
27.05.21

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of May, 2021

New Maintenance Policy-2018						
Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars		
1	New Maintenance Policy-2018	Lt. No.- 017 Dt.- 26.02.21	80.03702	Certified that out of Rs. 150.44203 lacs received upto the year-2021-22 in favour of Ex. Engineer, RWD, Katihar a sum of Rs. 134.37447 lacs has been utilized for the purpose of NMP-2018 rural roads Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 16.06756 lacs remaining unutilized at the end of the period under.		
		Lt. No.- 027 Dt.- 04.05.21	70.40501			
			Total :-		150.44203	

- 'D (W) Division, Katihar.

Lab Job No: 11

Date: 30-05-2021

Name of Customer :Gajmattia Infrastructure Pvt. Ltd.

Name of Work/ Road :Kursela Power house to Majadiha Village Kali Asthan Tak

Sr.no	Location of test(in km)	Corrected U.I value(mm/km)	Road catagory
1	0.1	2109	G
2	0.2	2497	G
3	0.3	2109	G
4	0.4	2400	G
5	0.5	2303	G
6	0.6	2206	G
7	0.7	3175	G
8	0.8	2787	G
9	0.9	3369	G
10	1.0	2981	G
11	1.1	3078	G
12	1.2	3466	G
13	1.3	3078	G
14	1.4	3175	G
15	1.5	3272	G
16	1.6	3659	G
17	1.7	3562	G
18	1.8	3078	G
19	1.9	3304	G
Average IRI Value		2926.74	


31/05/2021
J.E.


31.05.2021
A.E.


31/5/2021

Lab Job No: 11
Date: 30-05-2021

Name of Customer: Gajmattia Infrastructure Pvt. Ltd.
Name of Work/Road: Kursela Power house to Majadiha Village Kali Asthan Tak

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
30/5/21	14:17:46	11	0.1	210	0	2100	2109	ROAD	25.45137	87.25860	Normal
30/5/21	14:20:42	11	0.1	250	10.1	2500	2497	G	25.45139	87.25940	Bridge
30/5/21	14:21:17	11	0.1	210	10.1	2100	2109	G	25.45102	87.26034	Normal
30/5/21	14:21:53	11	0.1	240	10.1	2400	2400	G	25.45151	87.26089	Speed Breaker
30/5/21	14:22:28	11	0.1	230	10.1	2300	2303	G	25.45236	87.26121	Normal
30/5/21	14:23:30	11	0.1	220	10.1	2200	2206	G	25.45301	87.26156	Normal
30/5/21	14:23:30	11	0.1	320	10.1	3200	3175	G	25.45353	87.26233	Normal
30/5/21	14:23:28	11	0.1	280	30.3	2800	2787	G	25.45386	87.26334	Normal
30/5/21	14:23:42	11	0.1	340	30.3	3400	3369	G	25.45422	87.26423	Speed Breaker
30/5/21	14:23:58	11	0.1	300	30.3	3000	2981	G	25.45459	87.26508	Normal
30/5/21	14:24:14	11	0.1	310	20.2	3100	3078	G	25.45487	87.26606	Normal
30/5/21	14:24:14	11	0.1	350	10.1	3500	3466	G	25.45511	87.26701	Normal
30/5/21	14:25:24	11	0.1	310	10.1	3100	3078	G	25.45496	87.26769	Speed Breaker
30/5/21	14:26:00	11	0.1	320	10.1	3200	3175	G	25.45437	87.26853	Normal
30/5/21	14:27:45	11	0.1	330	10.1	3300	3272	G	25.45403	87.26942	Normal
30/5/21	14:28:21	11	0.1	370	10.1	3700	3659	G	25.45363	87.27021	Speed Breaker
30/5/21	14:28:56	11	0.1	360	10.1	3600	3562	G	25.45274	87.27008	Normal
30/5/21	14:29:31	11	0.1	310	10.1	3100	3078	G	25.45259	87.27003	Normal
30/5/21	14:29:31	11	0.06	200	10.1	3333	3304	G	25.45262	87.26980	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 0.969 * X + 74.60$$

$$X = 3333$$

$$Y = 3304$$


(R) RURAL ROAD
Good <4000
Average 4001-5000
Poor >5001

[Signature]
31/5/2021

[Signature]
31.05.2021
A.E

[Signature]
31/05/2021
SE

File : C:\RAM KUMAR\MISC Files\Bump integrator\Text File Kursela Sameli_30.05.2021_Copy\11\11
 Name of Customer : Gajmattia Infrastructure Pvt. Ltd., Name of Work/ Road : Kursela Power house to Majadiha

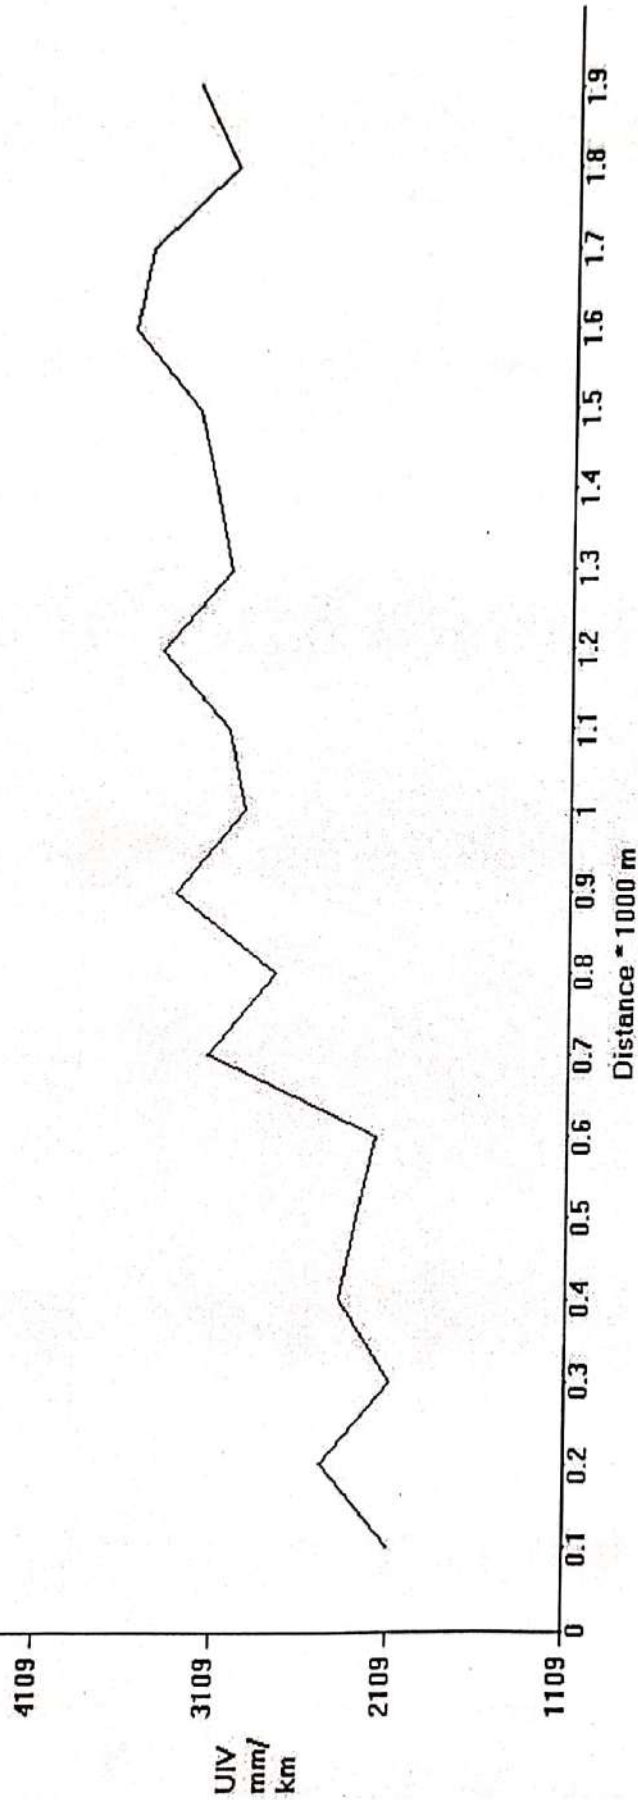

[Signature]
 31/05/2021

[Signature]
 31.05.2021
 A E

[Signature]
 31/05/2021
 SE

