


FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Razulla Eksara Path to Nagar Puz
- (2) Name of Contractor :- Saryu Sharan Singh
- (3) Agreement no. :- 18/SB D / 2018-19.
- (4) Agreement Amount :- 30,24,601.00
- (5) Date of commencement of work :- 04/01/2019
- (6) Schedule date of completion of work :- 03/07/2019
- (7) Date of hindrance :- 11/01/2019
- (8) Provisional extension date :- 13/08/2024
- (9) Further extension of time required:- NO
- (10) Reference of contractor's application if any :-
- (11) If any defects have been found in the work date :-
- (12) Reason :- Land Dispute & Public Hindrance
- (13) Percentage of work done upto schedule completion of time :- 100%.
- (14) Percentage of upto date work done :- 100%.
- (15) Recommendation of J.E. :- जमीन में निजी जमीन होने के कारण सखमथ कार्य रुक गया है। पूरा नहीं हो सका।
- (16) Recommendation of A.E. :- संवेदक के द्वारा जा सकती है। अतः सखमथ वृद्धि दी जा सकती है।
- (17) Final order or recommendation of the E.E. :- अनुज्ञप्ति के साथ अग्रसारित।

Saryu Sharan Singh
Signature of Contractor


Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Rajgir
Executive Engineer



शपथ पत्र Affidavit

N.D.B.A. OCT 2021, SL. No :- 4770

Affidavit has been Sworn
by.....
Has been identified by Sri.....
was affirmed on S.A. before me
The facts Stated in the affidavit

नोटरी पब्लिक

विहारशरीफ, नालंदा

Notary, Nalanda 18/11/21

शपथ पत्र

Sl. No. 82 Date 18/11/21

मैं, तरयु शरण सिंह सिता स्व० रामानन्द सिंह, शास्त्र महाविद्या, पौ-
थाना- वैत, जिला- नालंदा, राज्य- बिहार, धर्म- हिन्दू, राष्ट्रीयता-
भारतीय, शपथ पूर्वक बयान वी यौजना करता हूँ कि

- 1- यह कि मैं उपरौक्त पते का स्थान है निवासी हूँ।
- 2- यह कि मैं तरयु शरण सिंह एक तंबक हूँ और मैं अनियोजित अभिज्ञता हूँ।
- 3- यह कि मैं एम. एम. जो. स्ती. वा स्ती. स्त. तो. यौजना अंतर्गत स्तुला
एकतारा पथ तै नगरपर पथ का निर्माण का कार्य करना था।
- 4- यह कि भूमि कववाव के कारण कार्य अवरुद्ध रहा एवं तत्काल कार्य पूरा
हो सका।

यह कि मैं दि० 10.05.2021 को कार्य पूर्ण कर दिया हूँ।

यह कि तत्काल वृत्ति के स्वोक्ति के उपरान्त भुगान के अलावा अन्य किसी
कारण के बड़े हुए दर का दावा नहीं करूँगा।

यह कि उपर लिखी गई तारो बातें तथ्य वी तहो है।

शपथ पत्र के मजमून वाजा को पढ़ वी तम्मा लिया
और तहो पाकर अपना ह० बना दिया।

I certify the signature/L.T.I. of
deponent
Who has put his/her Signature
on L.T.I. in my Presence..

Sasru Sharan Singh
शपथकर्ता का ह०/

Advocate
19/11/21

In No. 276/19
Mob. No.



Mob :- 9122417077, 8789201041

M/S SARYU SHARAN SINGH

Vill-Maha Bigha, P.O+P.S- Ben, Dist- Nalanda, Pin No- 803114

Mail ID :- Saryu Sharan.1@gamil.com.

Ref :-

Date..11/01/2019.

श्रीवा में

साहायक अभियन्ता,

ग्राम वडा नं० १३१३ अन्तर्गत प्रमण्डल क्षेत्र (मालगीर) गानकपुर

विषय:- ससुलगा एकसार पवा से नगरपाल, पवा के निर्माण कार्य में आवश्यकता के समानन्द में।

महाशय

शानिना निवेदन महेश्वरि उपर्युक्त पवा ग्रामीण कार्य

निर्माण, कार्य प्रमण्डल मालगीर द्वारा mms by (SC) साग-१८-१९

केसे नाम से स्वीकृत हुआ है, जिसका स्वीकृती सं- १८/३८८/२०१८-१९

है। इस पवा का निर्माण कार्य चल रहा है। पर आपने कुछ लोग

का निजी पानी है। जो निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अतः श्री माता से निवेदन है कि स्थल का

मापीयता कर सही सिमांकन कराकर पवा निर्माण कार्य

सुनिश्चित कर पाए गए हों के मांगी है।

आपका निवेदायी-

Saryu Sharan Singh

ग्राम - महाबिघा

पो.मालगीर + अ.मालगीर (मालगीर)

M/S SARYU SHARAN SINGH

Saryu Sharan Singh

Mobile No- 9122417077.



सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य अवर प्रमण्डल वेन (नालन्दा)

पत्रांक.....

राजगीर

दिनांक.....

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल वेन।

सेवा में,

अंचलाधीकारी
वेन (नालन्दा)

विषय:- शीर्ष MMGSY(SC) अन्तर्गत रसुला एकसारा पथ से नगर पर निर्माणधीन पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सुचित करना है कि विषयांकित पथ रसुला एकसारा पथ से नगर पर मे जमीन विवाद उत्पन होने के कारण पथ का निर्माण कार्य बाधित हो गया है। इसलिए उक्त पथ के रेखांकन में आने वाली सरकारी जमीन को सिमांकन करने की आवश्यकता है।

अनुरोध है कि विषयांकित पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन हेतु सरकारी अमीन से मापी कराकर प्रतिवेदन देने की कृपा की जाय ताकि पथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल वेन

ग्राम पंचायत राज एकसारा

प्रखण्ड-वेन (नालन्दा)

प्रतीगा देवी

मुखिया

आवास

ग्राम-एकसारा, वेन (नालन्दा)

Mob:-7050205023

9060894432

पत्रांक..... 568

दिनांक..... 04/06/2019

प्रेषक :- मुखिया ग्राम पंचायत राज एकसारा प्रखण्ड (वेन) नालन्दा
 प्रेषित :- कार्यपालक अभियंता ग्रा. का. वि. कार्यमंडल राकमीर
 (नालन्दा)
 विषय :- खुल्वा एकसारा पथ से नगर पर पथ का कार्य अवलोकन
 के संबंध में,

महोदय,
 उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना चाहती हूँ कि
 प्राचीन जनता नगर पर, सैदपुर एवं संवेदक मेरे पास
 आये और समझाया है अवगत कराये। Poplain जल रहा पर
 गाँव के लोग रोकवाहिये हैं कार्य वाधित लम्बे अन्तराल तक
 अंचलाधिकारी का भी समझाया है अवगत कराये पर
 अंचलाधिकारी का लापरवाही है लम्बे समय तक कार्य वाधित
 रहता है। बुझाकार पथ के खुल्वा वाले जमीन मालिक का गुलाकर
 मागला निजी जमीन का दान करने की बात थी। पथ का
 निजी जमीन में पड़ना था उसकी चौड़ाई कम थी, मीड़ी
 स्थल पर रहकर कार्य में मिट्टी कार्य को पूर्ण
 करवाई।



(Signature) D. P. V.

मुखिया

ग्राम पंचायत राज एकसारा

प्रखण्ड-वेन (नालन्दा)

Name of Road - Rasulla Ekam Path to Nagarpur.

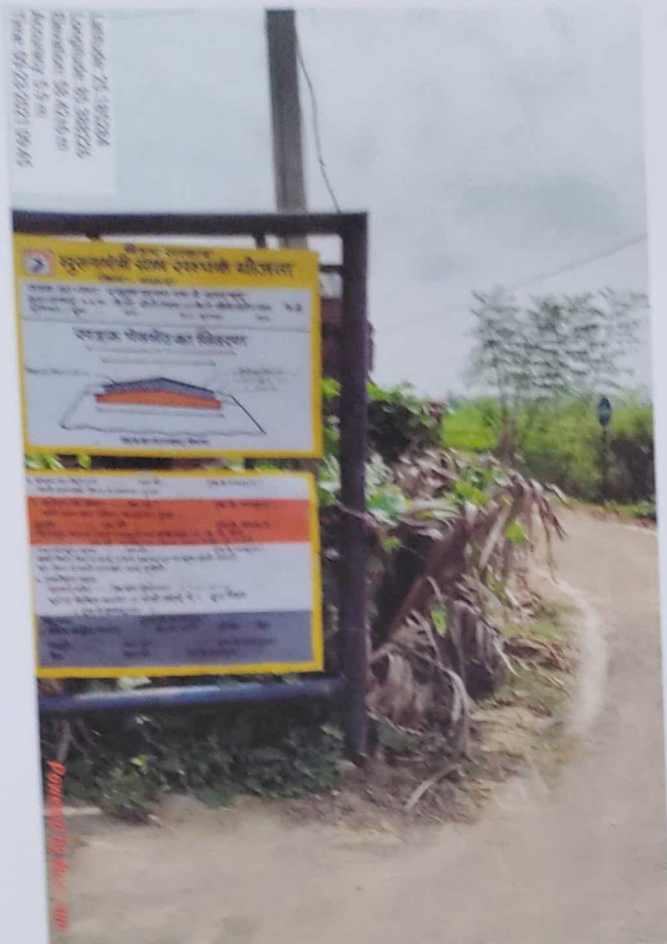

20/11/21
56

28/11/21
B-E

Name of Road - Rasulla Eksara Path to Nagar Par



20/11/21
58

20/11/21
E.E.

Name of Road - Rasula Eksara Path to Nagar Par



Latitude: 25.185278
Longitude: 85.380217
Elevation: 52.65±11 m
Accuracy: 25.3 m
Time: 09-23-2021 10:14
Note: rasula eksara road to nagar par

2/11/21
JE.

2021
2-2

2nd Final Bill

7

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				C
	No.	L.	B.	D.	
Name of work. - Construction & Maintenance of Road from Road Eksara Path To Nagar for Agency! - Sargu sharan Singh.					
Agreement No! - 18/SBP/2018-1					
Date of commencement! - 01/01/20					
Date of completion! - 03/07/2018					
Actual Date of completion! - 18/09/21					
Date of entry! -					

Up to Date Measurement				
① Dismantling of existing Cement concrete	do	do	do	1/2
1x 3.50x3.35x0.15				1.75
② Dismantling of existing R.C.C.	do	do	do	1/2
2x 6.00x0.825x1.50				14.8
③ Removing all type culvert	do	do	do	1/2
1x 3.00x1.00				3.0
④ Excavation for structure	do	do	do	1/2
Abu	2x	7.60x2.13x1.60		51.8
Road	4x	1.76x1.93x1.60		21.71
Other				

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Raipur

Amir
28/11/21

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Conte of ar
	No.	L.	B.	D.	
⑤ Providing PCC M-15 as below					
----- 20 ----- 20 ----- 6.12					
Abut.	2x	7.60x	2.13x	0.20	6.47
Retain.	4x	1.76x	1.93x	0.20	2.71
Floor	1x	6.20x	1.73x	0.15	1.60
Cut-off wall	2x	6.00x	1.00x	0.20	0.16
					10.94
⑥ P/W P.C.C. M-15 in open foundation					
----- 20 ----- 20 ----- 6.12					
	2x	6.80x	$\frac{1.93+1.33}{2}$	1.40	31.1
	4x	1.76x	$\frac{1.73+1.13}{2}$	1.40	14.1
	2x	1.20x	$\frac{0.80+0.375}{2}$	1.40	1.9
					47
⑦ P/W P.C.C. M-15 in substructure					
----- 20 ----- 20 ----- 6.12					
	2x	6.00x	$\frac{1.13+0.70}{2}$	1.30	14.2
	4x	1.98x	$\frac{0.93+0.40}{2}$	1.59	8.35
					22.6
⑧ S/P4 Placing HYSD Bar					
----- 20 ----- 20 ----- 6.12					
	2x	2.7x	2.30x	0.89	110.52
	2x	8x	6.00x	0.89	85.41
					195.93

28/11/17
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Rajgarh

ABSTRACT OF COST

16

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
① Plt. & fixing Bench mark / reference					
Pillar	20		20		40
(i) Bench mark					
1.00 No	vide TMB	P-04			
	@ Rs 42.71/10			Rs 42.71	
② (ii) Reference Pillar					
1.00 No	vide TMB	P-04			
	@ Rs 102.64/10			Rs 102.64	
③ Clearing & grubbing Road (m)					
0.26 Ha.	vide TMB	P-04			
	@ Rs 50148.62/Ha.			Rs 13034	

③ Construction of Embankment					
1420.694 m ³	vide TMB	P-15			
	@ Rs 111.65/m ³			Rs 15801	

④ Construction of Sub grade					
790.80 m ³	vide TMB	P-10			
116.798 m ³	vide TMB	P-14			
907.598 m ³	@ Rs 157.15/m ³			Rs 142511.9	

⑤ Construction of G.S.B. Grd					
333.26 m ³	vide TMB	P-11			
	@ Rs 2002.85/m ³			Rs 66711.6	
				Rs 128762.1	

Amn
24/11/17
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Rajgir

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Conter of are
	No.	L.	B.	D.	
B.P.				1/3	98762
⑥ P.V. laying & Com bedding WB 1hr-3				1/2	
124.74 m ²	vide	TMB	P-	11	
118.12 m ²	②K	2819.33/m ²		1/3	35168
⑦ Providing & applying Prime Coat (SS)				1/2	
1671.08 m ²	vide	TMB	P-	12	
	②K	49.96/m ²		1/3	8348
⑧ Providing & applying Dack Coat (RSI)				1/2	
1671.08 m ²	vide	TMB	P-	12	
	②K	16.87/m ²		1/3	2822
⑨ P.V. laying & rolling MSS 20mm				1/2	
1671.08 m ²	vide	TMB	P-	12	
8100410	②K	193.05/m ²		1/3	322602
⑩ R.C.C. M-5 shade K.M. stone				1/2	
1.00 No.	vide	TMB	P-	13	
	②K	2203.44/No		1/3	22031-
⑪ R.C.C. M-5 shade 200 m stone				1/2	
2.00 No	vide	TMB	P-	13	
	②K	643.39/No		1/3	12871-
				1/3	17771147

Continuation

Amish
29/11/21

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Rajgir

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B.F.				12037751
(22) P/R R.C.C. 14-15 in open foundation					
.....do.....do.....do.....do					
474105 m ³ vide TMB P-08					
@ 5225 m ³ /m ³					15246195
(23) P/R R.C.C. 14-15 in substructure					
.....do.....do.....do.....do					
22648 m ³ vide TMB P-08					139211
@ 617323 m ³					1539762
(24) P/R R.C.C. 14-20 in substructure					
.....do.....do.....do.....do					
2832 m ³ vide TMB P-09					
3840 m ³ vide TMB P-08					
6672 m ³ @ 617323 m ³					1541821
(25) R.C.C. 14-25 in Deck slab					
.....do.....do.....do.....do					
3885 m ³ vide TMB P-08					
3885 m ³ @ 748932 m ³					1527495
(26) S/P 4 Placing HYSD Bar					
.....do.....do.....do.....do					
195978 kg vide TMB P-08					
288360 kg vide TMB P-09					
484338 kg / 1000					38150
0.4843 m ³ @ 78772.49 m ³					1538153
(27) Providing weep holes					
.....do.....do.....do.....do					
2000 No vide TMB P-09					
@ 13478 No					152685

24/11/21

Executive Engineer
Public Works Department
Works Division, Rajiv

21

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	H.	
	B. f.				25.84/59
(28) Paving on Parapet wall					25.84/59
26.56 m ²	W. B.	7.14	1.0		
@ 110.67/m					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
Less 0.25% Disposal					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
					1.84
					2.51/6
					11.33/098
					25.84/59
					27.99/1
					11.33/098
