

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी।

E-mail ID.- eerwdgogri@gmail.com

पत्रांक 1160(अनु०) का० प्र०, गोगरी दिनांक २२-०६-२०२२

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, गोगरी।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
MMGSY, कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषय :- MMGSY अन्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य उपरान्त अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि MMGSY अन्तर्गत Revised के उपरान्त कार्य समर्पित के बाद कुल मो०-11,19,961=00 (ग्यारह लाख उन्नीस हजार नौ सौ एकसठ) रुपये मात्र का आवंटन FDR मद में उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इस पत्र के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना राशि समर्पित की जा रही है।

सूचनार्थ सादर समर्पित।

अनु०- यथोक्त




विश्वासभाजन

(Signature)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोगरी।
(Signature)
22/6/22

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए पथों के मोटरेबुल कार्य का अधियाचना

कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-गोगरी।

Sl. No.	Division	Name of Road & Birdge	Length (in k.m)	Damaged Length (in k.m)	Amount (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Gogari	Parmanent Restoration of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola	3.200	0.160	11.19961	Work Complete
Total =					11.19961	


 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल-गोगरी।

 22/6/22

 22/6/22



बिहार BIHAR

18/5/2020 1000/- ना वरुण (अलेख) निष कुपार सिन्हा
= 1000/- 1000/-

18/5/2020
मुद्रांक विक्रेता AH 650489
ला० नं०- 4/90-91
अनु० न्यायलय, गोगरी

Agreement,

19-5-20/2020-21

S.B.D No. 19-5-20/2021-2021

This agreement, made the Thirteenth day of June..... 20 between Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Gogri (Hereinafter called "the Employer") of the one part, and Maa Vaishnavi Devlopers ,Add.-Rana medical Hall, Near Budh Murti, Kadamkuan District. Patna, (Bihar)[Name and Address of Contractor] (Hereinafter called "the Contractor" of the other part).Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute the Construction. of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola (Tender ID- 85983) MMGSY (Name and identification number of Contract) (Hereinafter called "the works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees 2,49,38,121=00 (Two Crere Forty Nine Lakh Thirty Eight Thousand One Hundred Twenty One Only) in 0.25% Below

MAA VAISHNAVI DEVELOPERS
Contractor Concern

PARTNER

13.6.20
कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Gogri

Sd/-
13/6/20

13/6/20



बिहार BIHAR म० विभाग की तिथि मद्रास का मूल्य केस का नाम और पता अनिलेश कुमार 8/4/22
 31/05/22 500X02 = 500000/- 1/2/22
 Supplementary AGREEMENT of AGREEMENT No. 106/S.B.D. of 2022-23
 ला न०-3/2001

Name of Work :- Permanent Restoration of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola (MMGSY) Under FDR Scheme

Name of Agency :- Maa Vaishnavi Devlopers,
 Add.- Rana Medical Hall, Near Budh Murti, Kadamkuan
 District- Patna (Bihar)

Date of Commencement :-

DD	MM	YYYY
----	----	------

Time of Completion :-


DD	MM	YYYY
----	----	------


Estimate Cost. :- Rs- 11,23,394/-


Supplementary Agreement Value:-Rs.- 11,20,586/- 0.25 % Below

Earnest Money :- Rs- 60,000/- (Details Attached)

This Agreement made the Dated 2 / 06 / 2022 between EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION-GOGRI Hereinafter called "the Employer of the first part" and Maa Vaishnavi Devlopers, , Add.- Rana Medical Hall, Near Budh Murti, Kadamkuan District- Patna (Bihar) here in after called "the contractor of the other part", Executive Engineer RWD Works Division Gogri. Whereas the Employer's is desirous that the contractor execute the extra Work" Permanent Restoration of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola (MMGSY) Under FDR Scheme, hereinafter called "the Work" and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution of Such works and the remedying of any defects therein, at a Cost. of Rs- 11,20,586/- (Eleven Lakh Twenty Thouseand Five Hundred Eighty Six Only)


 Contractor


 Executive Engineer
 Rural Works Department,
 Works Division-Gogri
 2/6/22



बिहार BIHAR

२३५७
ललितेश कुमार सिंह
R 864717
अनिलेश कुमार सिंह
मुद्रांक विक्रेता
बनमंडल न्यायालय परिसर गोरख
ला 10 नं०- 03/01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Executive Engineer
R.W.D. Works Div.
Gorakhpur
21/6/22

FDR

M.B.No 557

Schedule XLV Form No. 134.

૫૨-૨૩

બડી પેકાન સંતાળી માતા હ પેકાન પરિચયી ટોલા
તક વધ નિર્માણ કાર્ય

પ્રમંડલ, ગોગરી

DIVISION

અવર પ્રમંડલ ગોગરી

SUB-DIVISION

M.B.No-557

Measurement Book

કાર્યપ્રશાસન

Mund
કાર્યપાલક સમિતિ
ગ્રામીણ કાર્ય વિભાગ
કાર્ય પ્રમંડલ, ગોગરી

Scanned with CamScanner

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्तक में मशीन द्वारा अंकित
पृष्ठ-100 (एक सौ) पन्ने हैं जिसे
शुद्धी श्वेता कुमारी सहायक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
अवर प्रमंडल, गोगरी वर्क निर्गत
किया जाता है।

Murali
Executive Engineer
R.W.D. Works Div.
Gogri
Baskar
17-5-22

Sch. XLV - Form No. 134

प्रमंडल, गोगरी DIVISION

अवर प्रमंडल, गोगरी SUB-DIVISION

Measurement Book

557

No.

Name of Officer _____

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work—					Permanent Restoration
of work of Bari Paikant					
Santoshki mata to Paikant					
bachhimi tolar under FDR scheme					
Name of Agency—					Mad Vaishnavi Devel
S. Agreement No:—					04 SBD/2022-23

Record measurement					
Date— 17.05.2022					
1. Conf. of embankment					
with material obtained					
from borrow pits etc—					
do-do. all Comp. job—					
Chainage	Dis	Area	mean	Fill volume	
	tance	in m	Area		
0.250	0	3.941			
0.280	30	1.816	2.879	86.355	
0.350	70	4.671	0.000	0.000	
0.360	10	4.779	4.725	47.250	
0.410	50	0.791	0.000	0.000	
0.450	40	0.844	0.818	32.700	
0.500	50	0.958	0.901	45.050	

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
Date - 28.05.2022					
1. const. of embankment					
with materials obtained					
from borrow pits etc -					
do-do. all comp. job -					
Qty. vide T.M.B.P. (3)					
267.75 m ³					
Q.R. 150 = 38/m ³ — P. 40,264/-					
2. const. of subgrade &					
earthen shoulder etc -					
do-do. all comp. job -					
Qty. vide T.M.B.P. (3)					
1517.25 m ³					
Q.R. 176 = 58/m ³ — P. 2,67,916/-					
3. const. of granular sub-					
base by providing well					
graded material etc-do.					
all comp. job					
Qty. vide T.M.B.P. (4)					
272.30 m ³					
Q.R. 2517 = 15/m ³ — P. 6,85,420/-					
C.O.P. 9,93,600/-					

Continuation

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोगरी

material consumption

i) Elue - 1785.0 m³

ii)

THIRD / REVISED / FDR

Permanent Restoration

A. Vide Letter No - BRDA (HR) - MMWSY - 124/18-1227
Patna Dated 6-11-2019

A.A. Amount for construction work & 5 year
Maintenance cost ₹ 255.05 Lakh

Revised construction cost ₹ 2,32,16,982.00

Revised 5 year Maintenance cost ₹ 29,07,037.00

₹ 2,61,24,019.00

Contractor Rate Quoted

0.25% below on BOB Rate (-) ₹ 65,310.00

₹ 2,60,58,709.00

Add Contingency @ 2.25%

+ ₹ 5,22,382.00

Total ₹ 2,65,81,091.00

or ₹ 265.81 Lakh

% Increase from A.A. Amount 4.22 %

~~Revised~~ T.S. No. III-39(R)/22-23 D. 02-05-2022


~~Revised~~ S.E. Letter No. 321 D. 02-04-2022

Revised Technically Sanctioned for Rs. 2,65,81,000.00

(Rupee Two crore sixty five Lakh
Eighty one thousand only)

Technical Sanction does not mean sanction of rate. Rate will

given in financial note should be followed strictly.


Chief Engineer
Road Works Department

02/05/2022

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक-
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-

ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
मुख्य अभियंता-2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी के अधीन शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ/पुल के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-321 अनु0, दिनांक 02.04.2022 तथा विभागीय पत्रांक-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य)-23-66/2020-1311 पटना, दिनांक 08.05.2021, पत्रांक-4849 दिनांक-07.12.2021 एवं पत्रांक 4665, दिनांक 15.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय प्रासंगिक पत्रों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी के अधीन शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ/पुल के पुनर्स्थापन कार्य हेतु 01 (एक) अदद पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। योजना का नाम, पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' के क्रमशः स्तम्भ-3, 5 से 6 एवं 7 में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है, जो कि पत्र के परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 से 06 में अंकित है।
3. निर्माण कार्य MMGSY की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सहरसा ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
11. मूल तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन इस पुनरीक्षित प्राक्कलन का भाग होगा।
12. अधीक्षण अभियंता प्राक्कलन में प्रावधानित विभिन्न कार्यों से संबंधित मदों का परिमाण, दर एवं इकाई की अपने स्तर से जाँच कर लेंगे। मूल एकरारनामा के दरों के आधार पर ही विभिन्न मदों के दर का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्य अभियंता को अविलंब सूचित करेंगे।
13. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

अनु0- परिशिष्ट "क" एवं स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,

ह0/-

मुख्य अभियंता-2

ज्ञापांक-

1425

/पटना,

दिनांक- 04.05.22

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-2

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 03 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 से 06 के अनुसार।

विवरणी

1. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 07 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य MMGSY योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रोसेक्सन एवं प्री-लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification Rural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62 की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में MMGSY की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य किसी भी तरह से MMGSY की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग/BRRDA, बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण-नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरान्त प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।
29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जांच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

(महेश्वर)

मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

परिशिष्ट 'क'



ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोगरी के अधीन शीर्ष MMGSY (SC) योजनान्तर्गत पुनरीक्षित प्रावधिक स्वीकृति प्रदत्त योजना की सूची:-

Sl No.	Name of Division	Name of Scheme	Administrative Approval			Revised T.S Cost (in lakh)
			Length (in k.m.)	Department Ref Lett. No. & Date	Total cost (in lakh)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gogari	Bari Paikant Santhoshi Mata to Paikant Paschimi Tola	3.200	1227/06.11.19	255.050	265.810

(Signature)

Chief Engineer-2
R.W.D, Patna



Name of Road :- Bari Paikant Santoshi Mata To Paikant Paschimi Tola

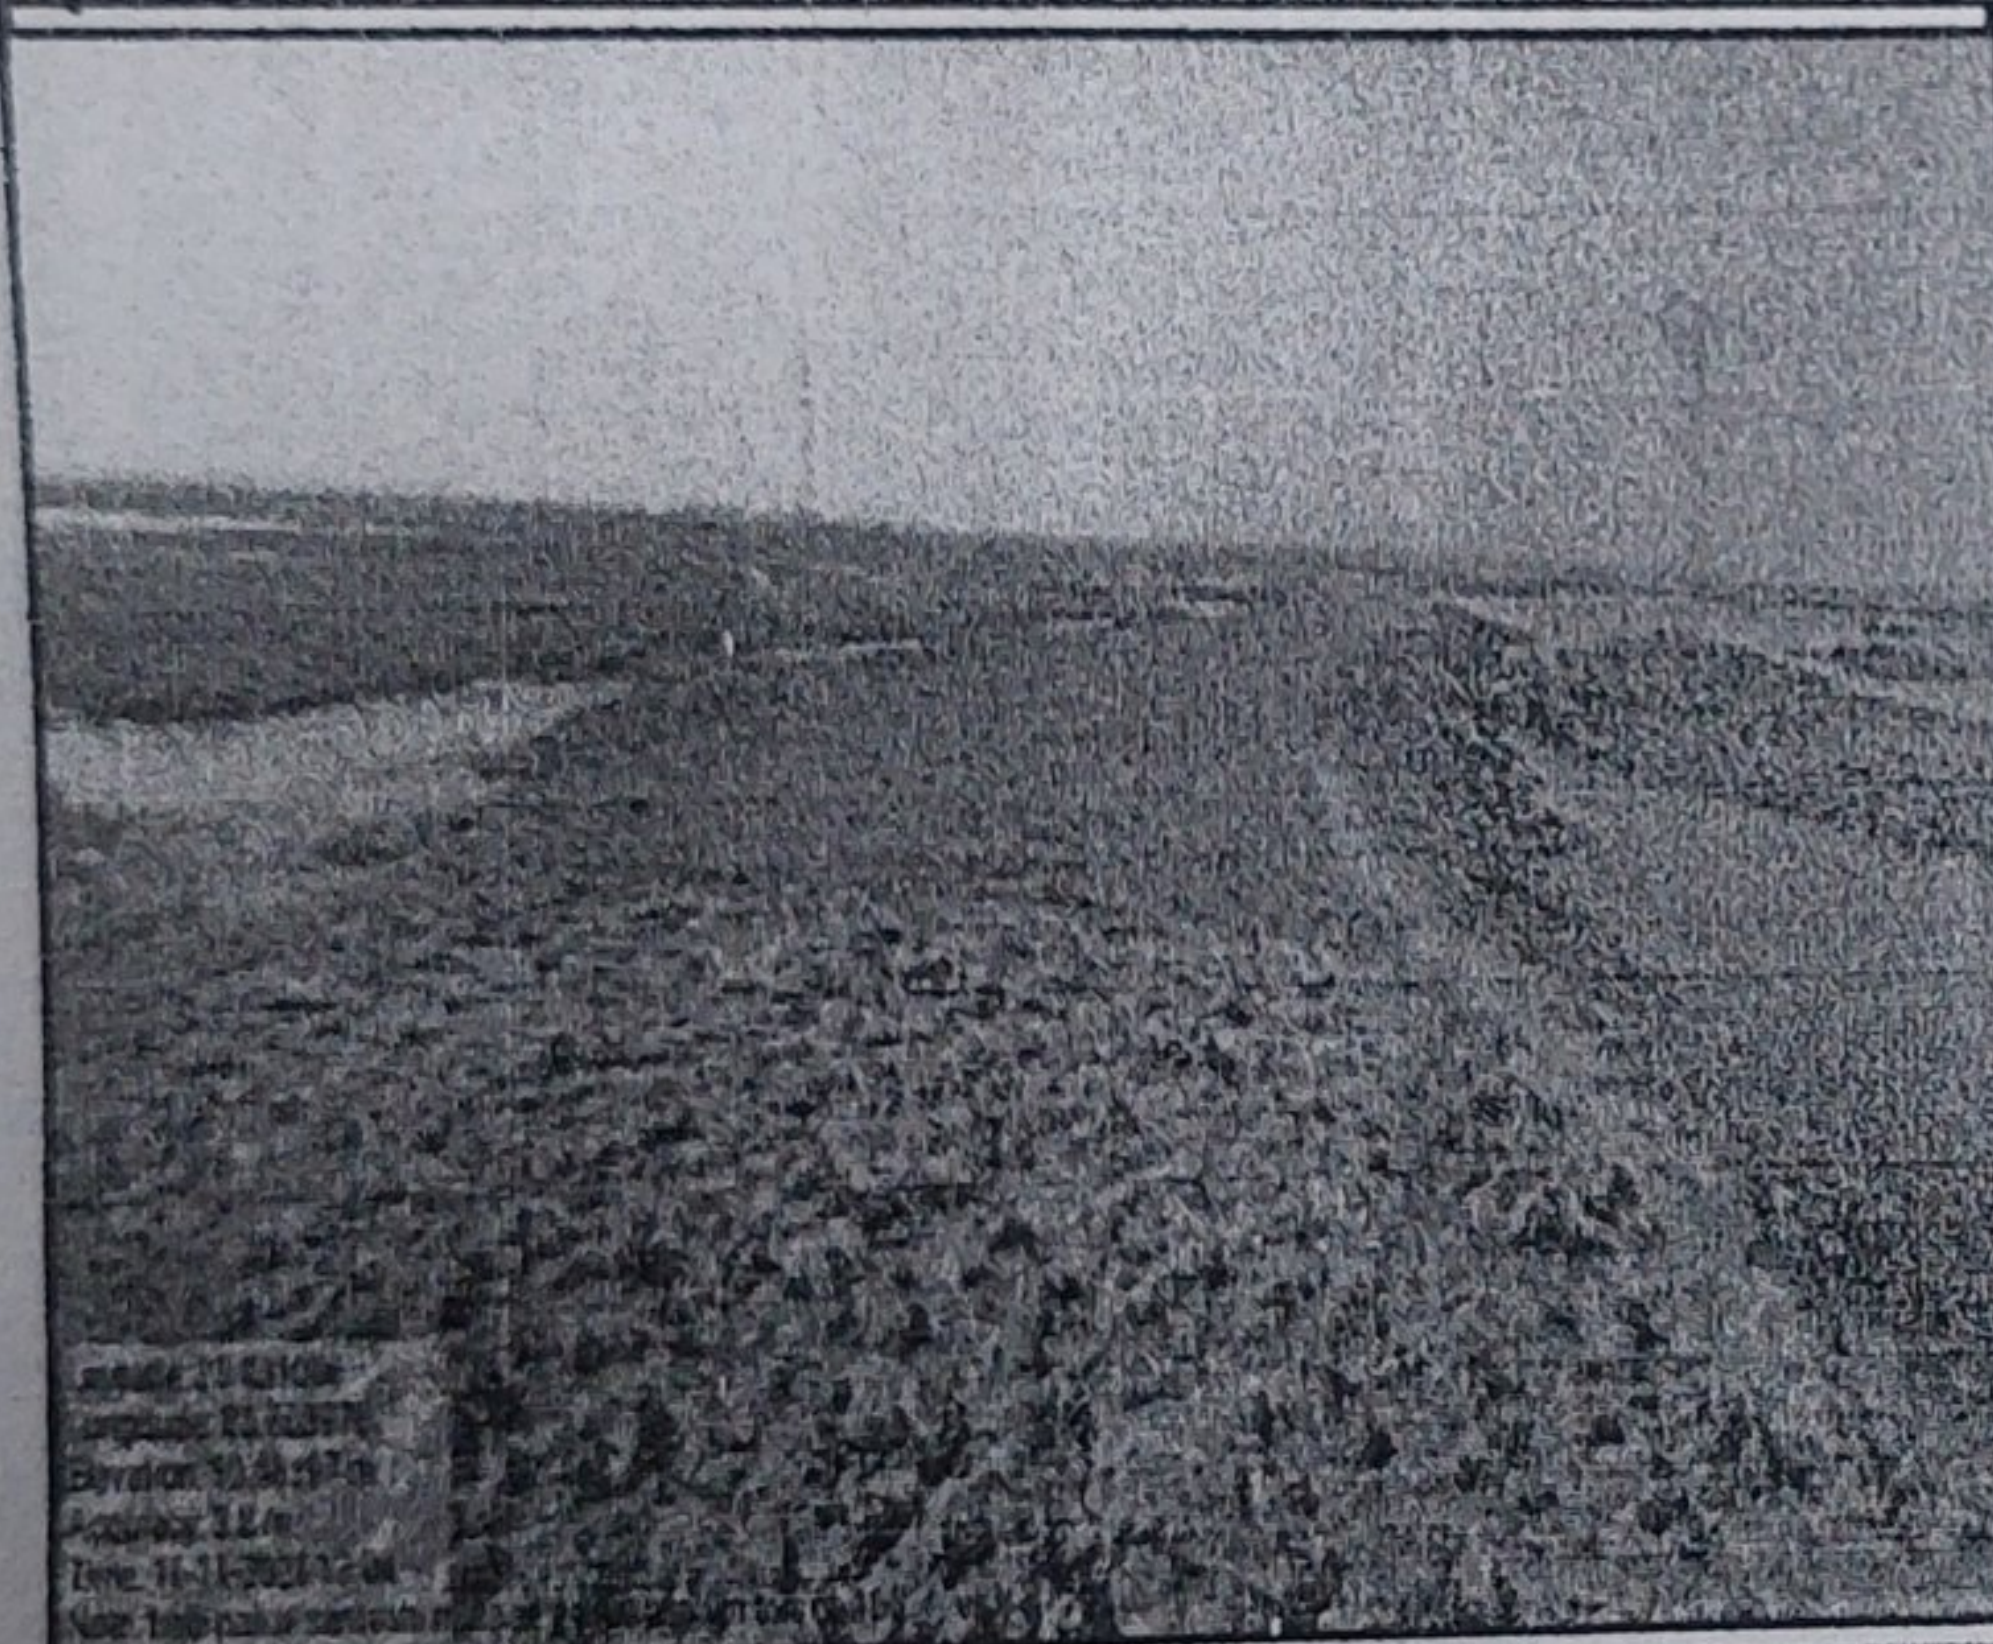

Signature


Akum
30/11/2021
E.E

Name of Road :- Bari Paikant Santoshi Mata To Paikant Paschimi Tola

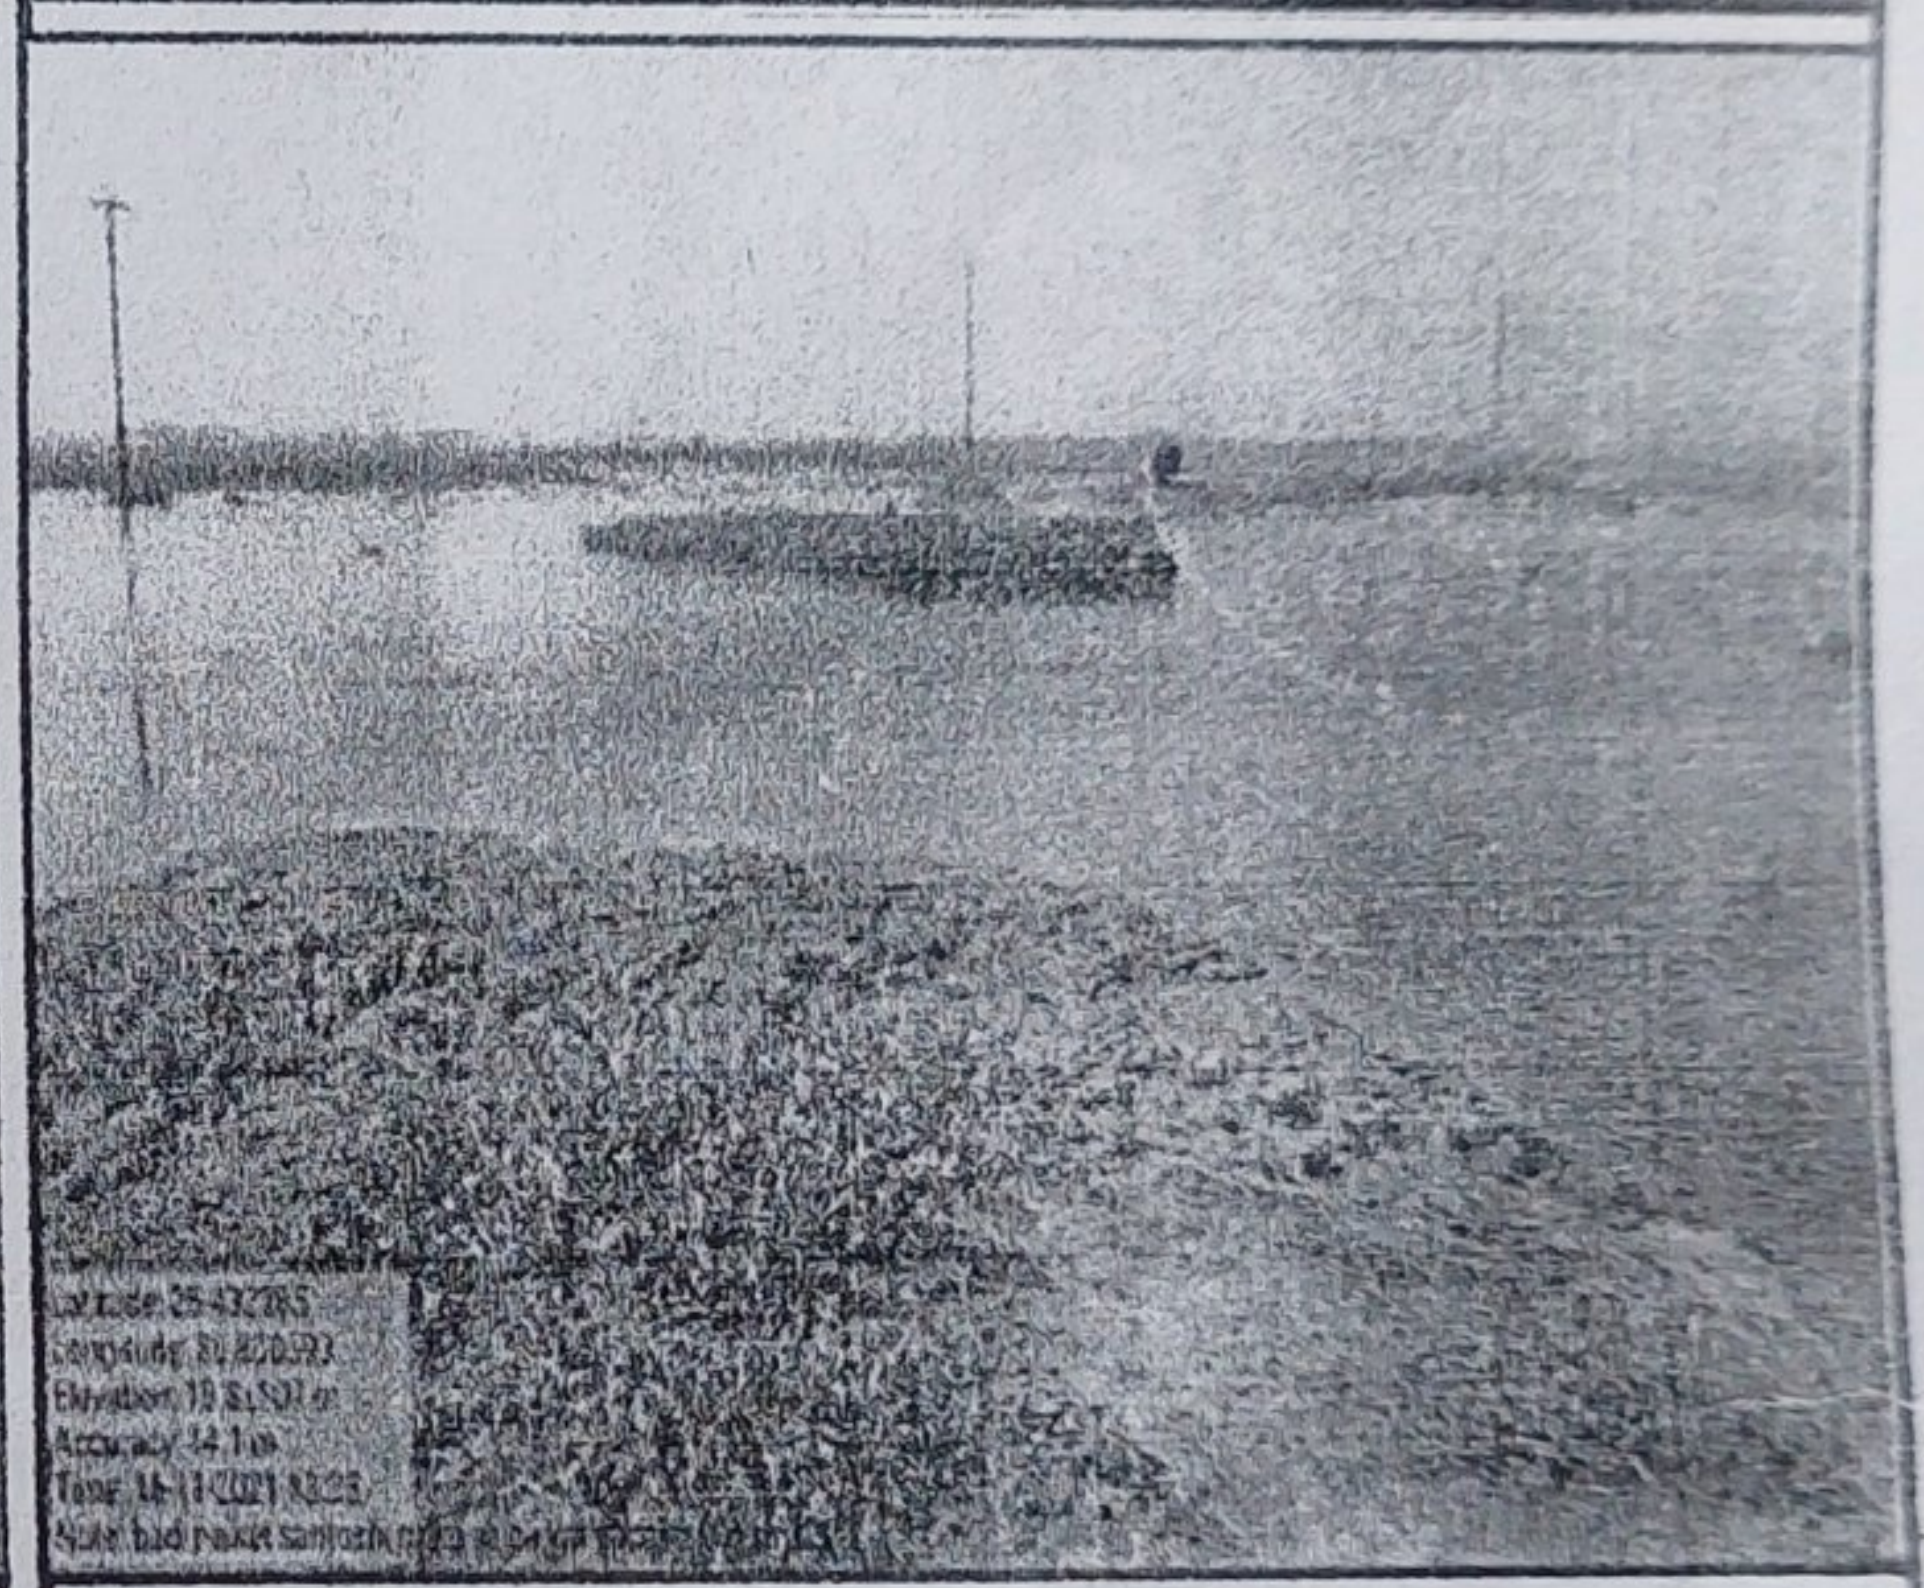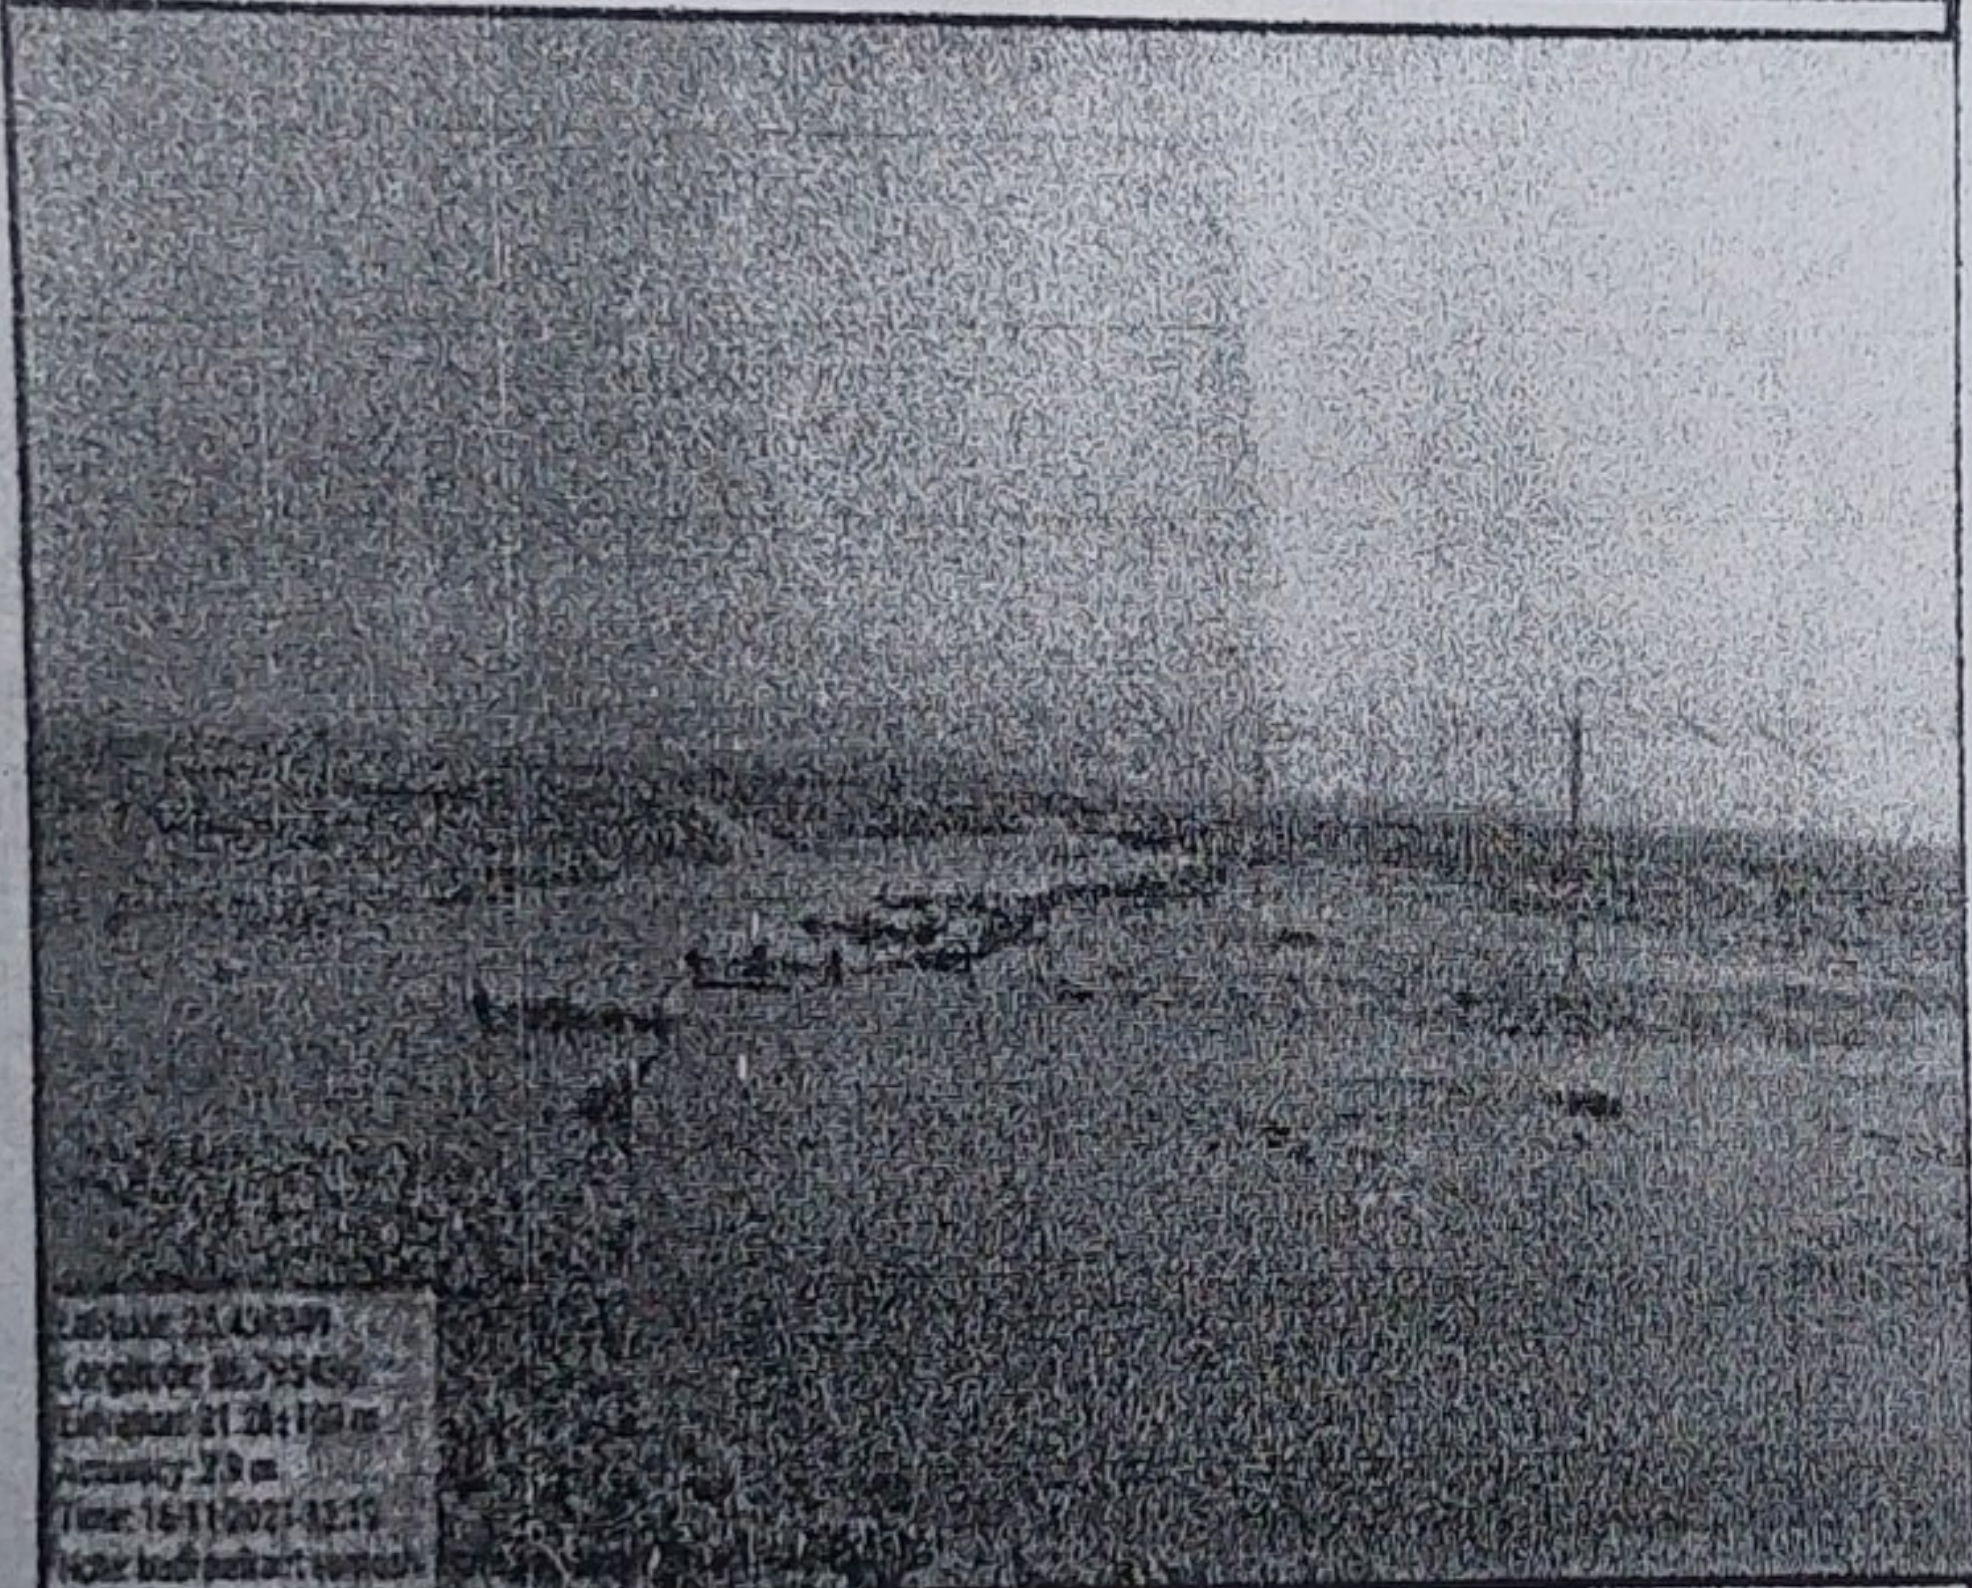


[Handwritten signature]


Akmal
30/11/2021
EE

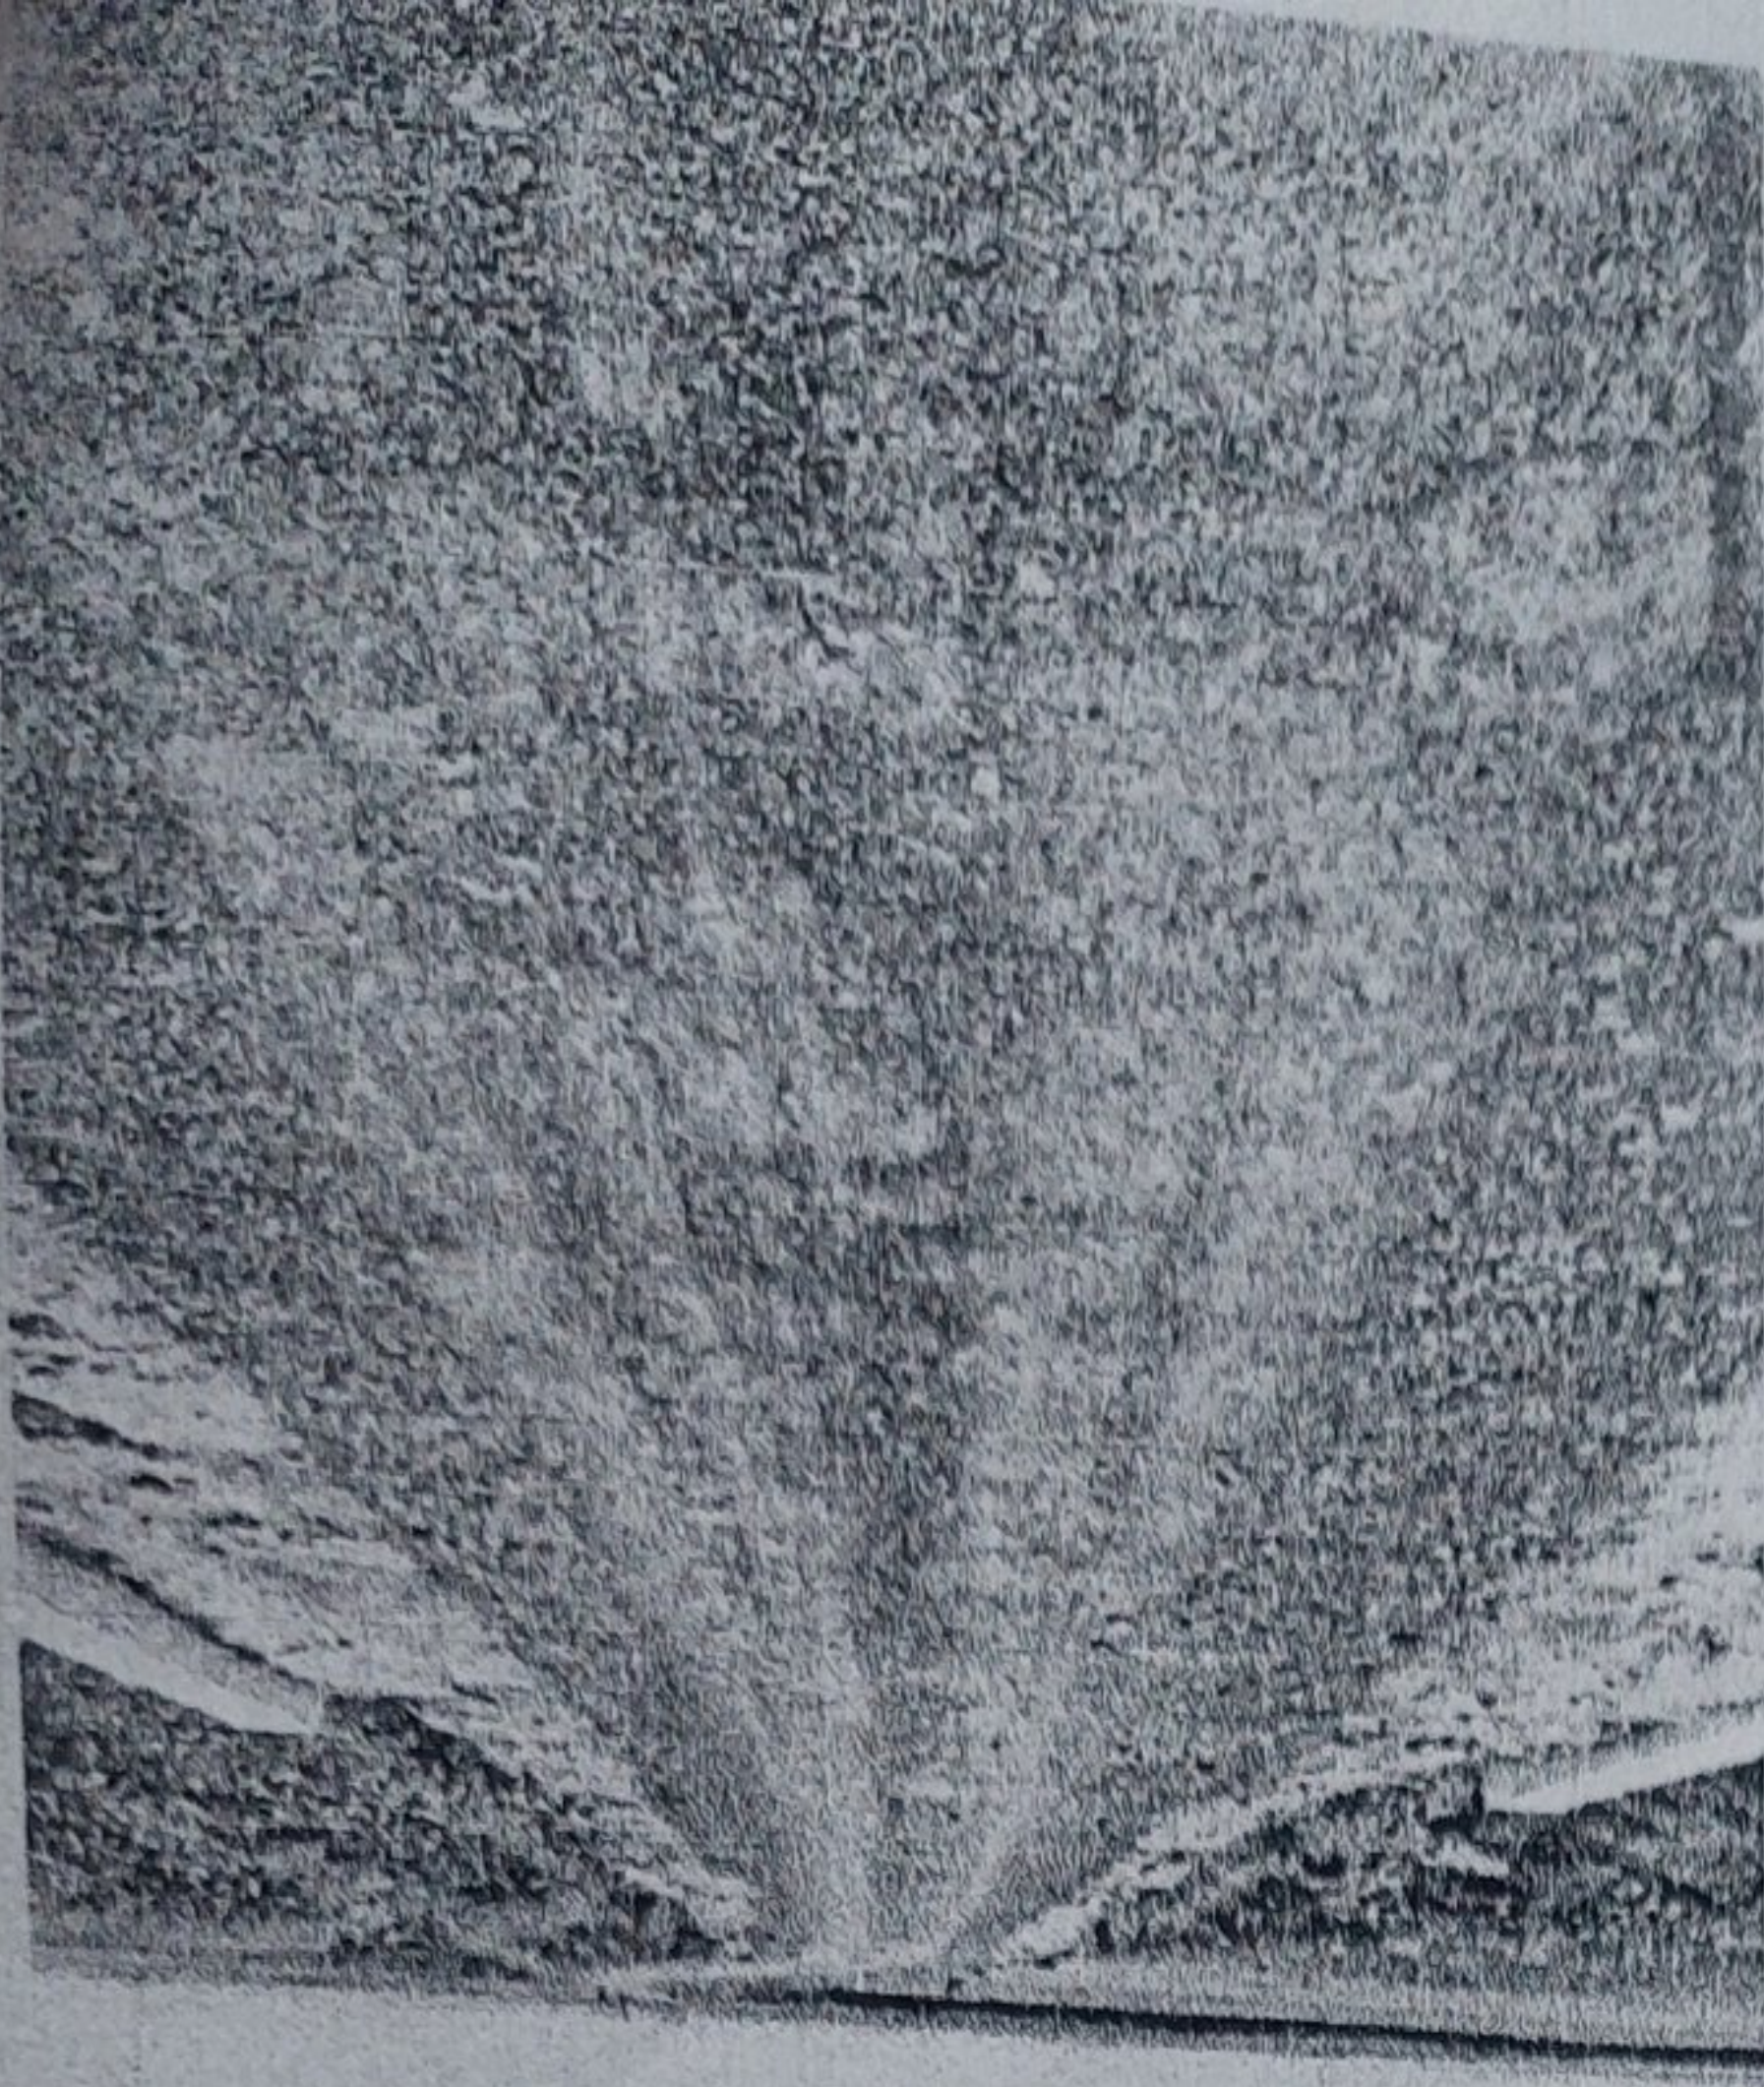

Latitude 25.431883
Longitude 86.809272
Elevation 8521.68 m
Accuracy 7.0 m
Time 05-13-2022 11:36

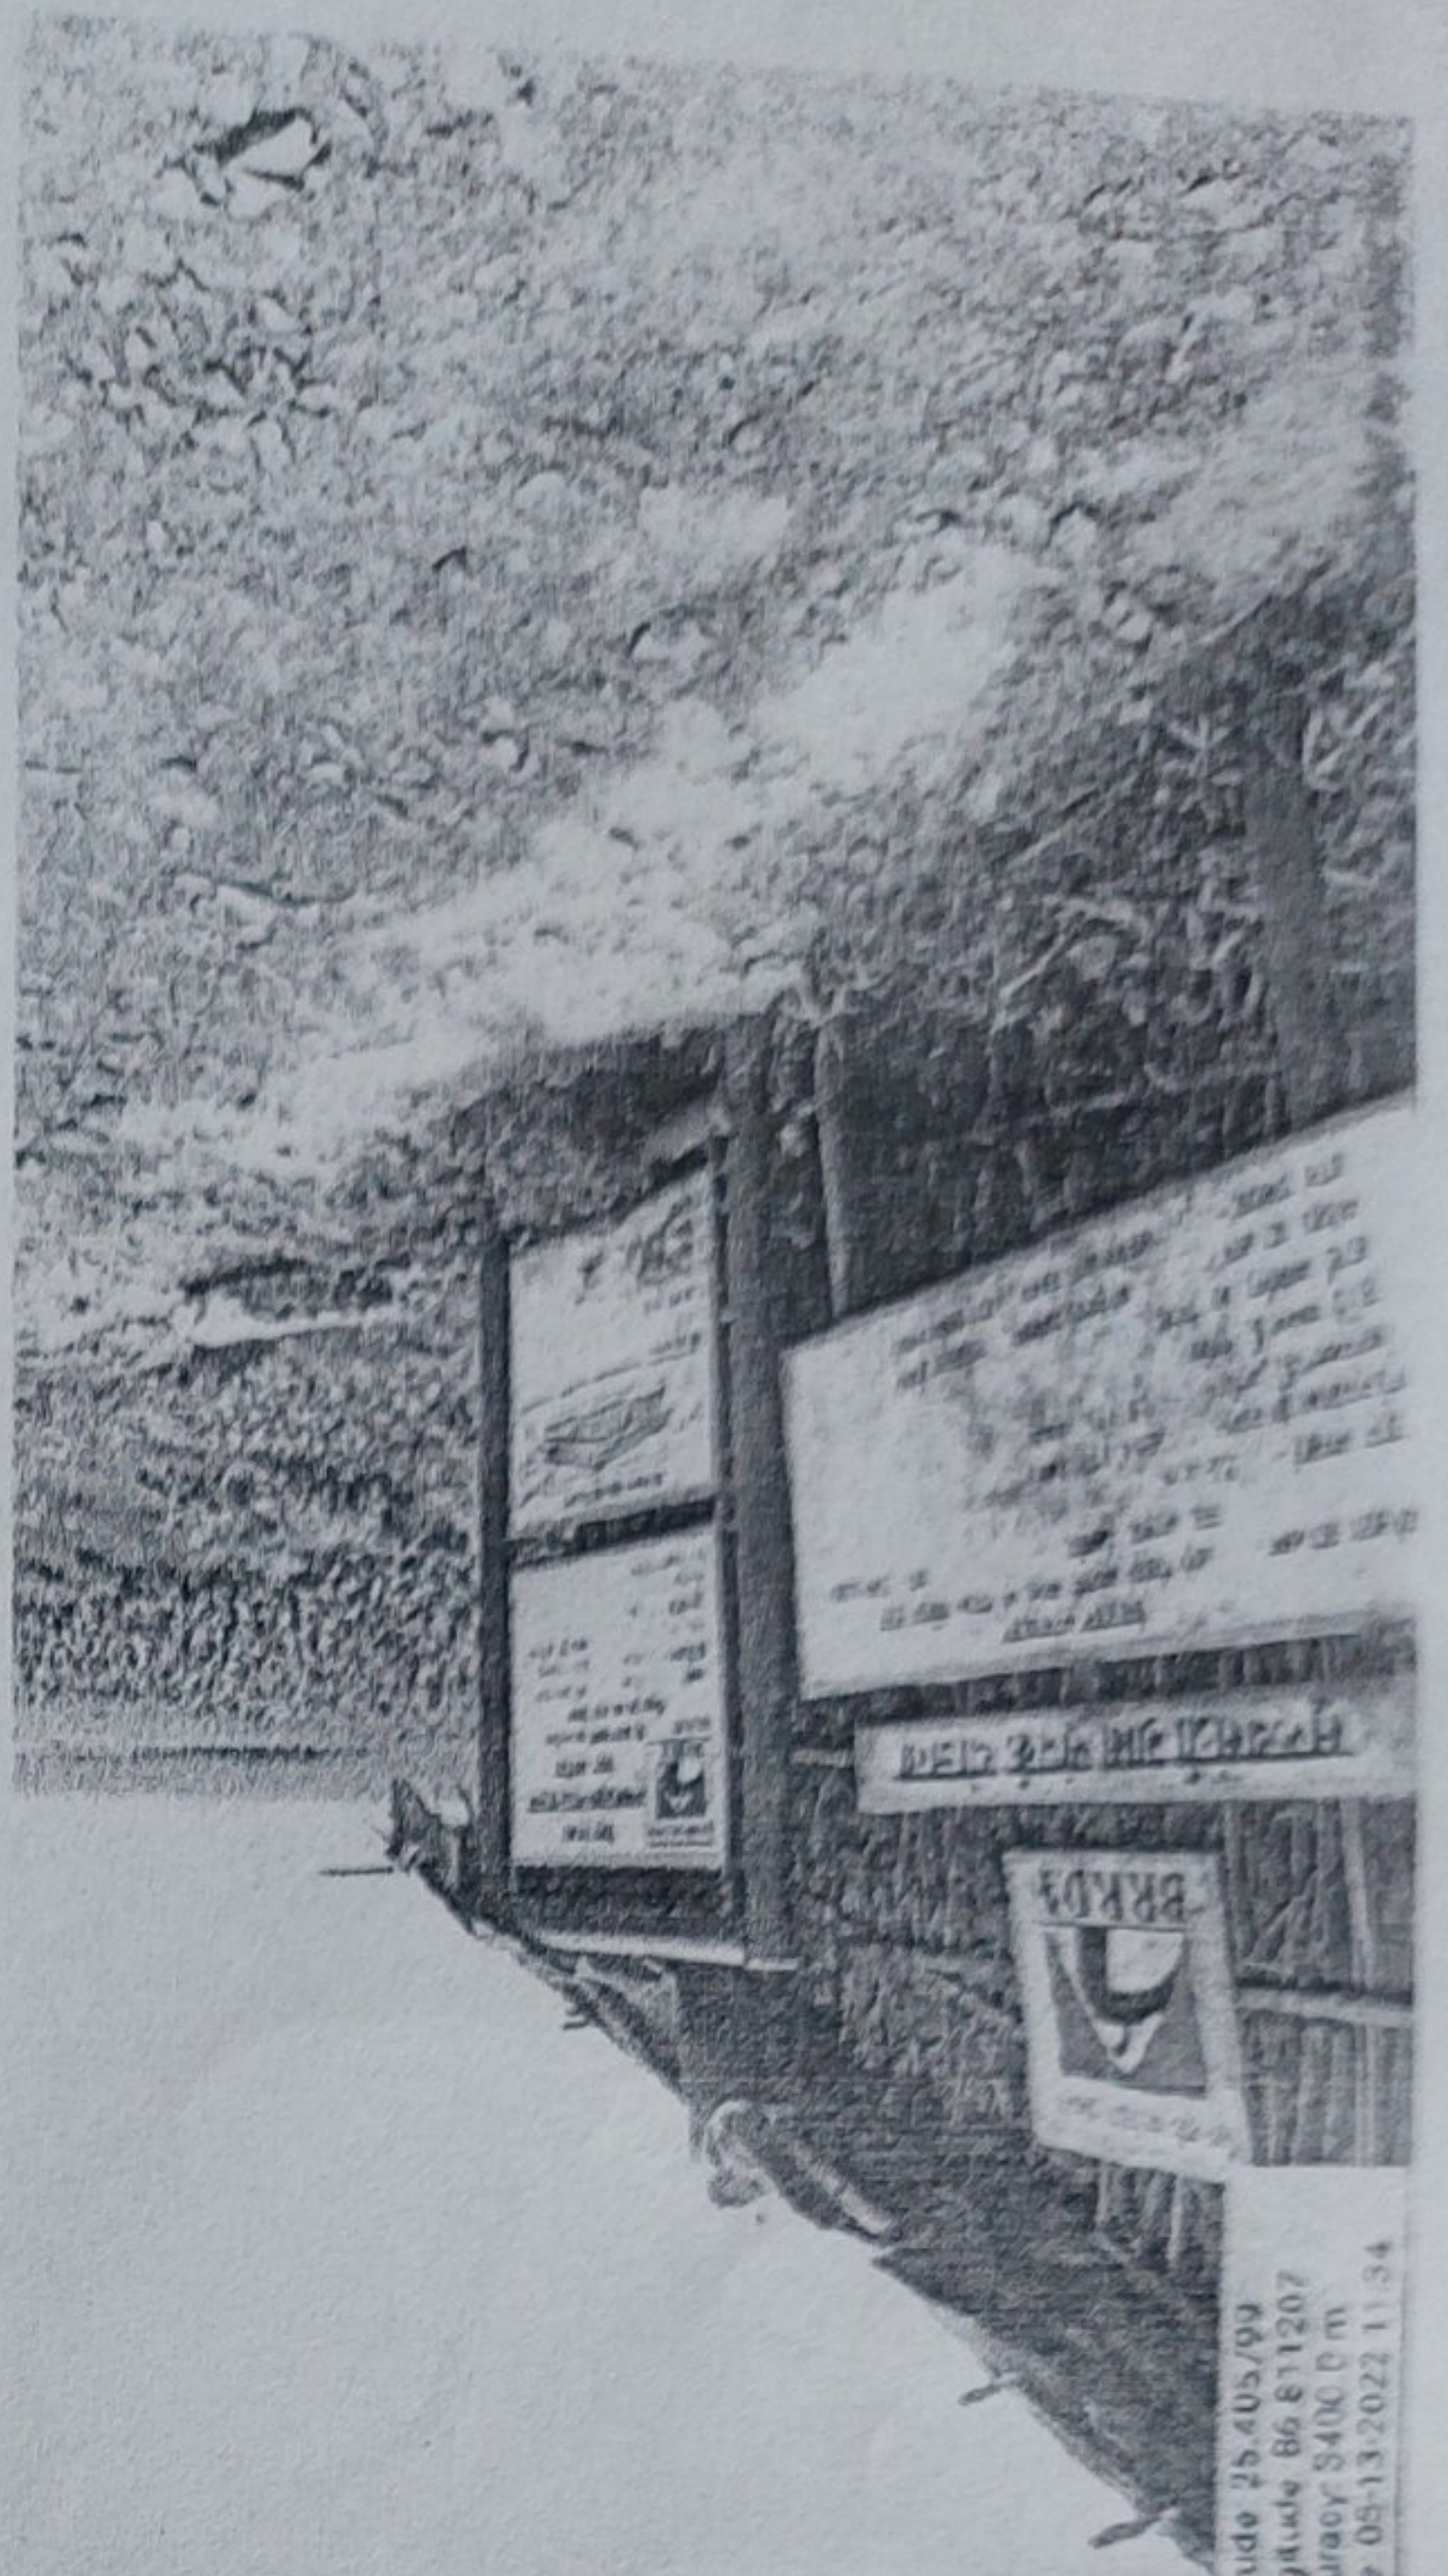

Latitude 25.405799
Longitude 86.811207
Elevation 8400.0 m
Accuracy 8.0 m
Time 05-13-2022 11:34



Latitude 25.431129
Longitude 86.805443
Elevation 8562.4 m
Accuracy 3.0 m
Time 05-13-2022 11:45



Latitude 25.431883
Longitude 86.809272
Elevation 8521.68 m
Accuracy 7.0 m
Time 05-13-2022 11:36

Handwritten signature and date: 21/06/2022
