

पत्र का क्रमांक: NH.110. सं २२५ २२५ फिलिप

Schedule XLV-Form No. 134

आयु प्रमाण संख्या: ३०९३ / २५-२६

DIVISION

आयु का सं. विभाग का सं. संख्या ५६१०१११६

SUB-DIVISION

आयु का सं. विभाग का सं. संख्या ५६१०१११६

MEASUREMENT BOOK

Mistungay Kuma (RRSMH/24-25
Feb 101)

प्रमाणित किया जाता है कि
ईस मापपुस्तक पंजी में मशीन
द्वारा मुद्रित 100= (सौ) पृष्ठ
है जो स.स.क अभियंता कार्य
अवर प्रमंडल जहानाबाद के
नाम से निर्गत किया जाता है।

5/5/25
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
अवर प्रमंडल (जहानाबाद)
5/05/25



Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(8) Providing and applying Primer coat etc etc					
	13473.75 m ²	@ 54.73/m ²			R 737413
(9) Providing and applying tack coat etc etc					
	9881.47 m ²	@ 18.83/m ²			R 186068
(10) Providing and laying Bituminous mastic etc					
	694.75 m ³	@ 8878.11/m ³			R 438729
(11) Providing and applying tack coat etc					
	9881.47 m ²	@ 15.88/m ²			R 156918.0
(12) Providing and laying semi dense etc					
	247.04 m ³	@ 11399.12/m ³			R 2816037
(13) Road marking etc all complete					
	500.00 m ²	@ 644.04/m ²			R 322020
(14) Providing and fixing km etc and 200m etc					
(1) 4 nos @ 2409.03/each					R 9636.00
(1) 10 nos @ 701.57/each					R 7016.00
(15) Direction and Place Identification					
	7.68 m ²	@ 13368.10/m ²			R 102667.0
(16) Resto-reflectorised Traffic					
(1) 8 nos @ 4127.52/each					R 33020
(1) 6 nos @ 4072.06/each					R 24432
(17) 6 nos @ Continuation 3928.32/each					R 23569.1
(18) 2 nos @ 8373.06/each					R 16746.0

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	D.
(17) providing and fixing boundary Pillar etc.				
10.00 nos @ 636.41/each				R 6364.0
(18) Planting of tree and shrub ornamental etc.				
63.00 nos @ 1221.96/nos				R 76983.0
				R 126470.55
GST 18%				R 2276469.0
L. cost 1%				R 126471.0
S. Fee				R 188800.00
				R 15238795.0
Below 22.05%				R 3360154.00
				R 11878641.0
Less Payment (1)				R 3158150.00
				R 8720491.0
DA				DA
15.12.25				CRP
J.C				
Materials				
W.M.M				
metal - 48.81 m ³ x 1115.24/m ³				
65.07 m ³ x 697.86/m ³				
Crushed Sand - 48.81 m ³ x 266.62/m ³				
Chips (B4 + S06C)				
B4 - 279.63 m ³ x 913.48/m ³				
279.63 m ³ x 602.28/m ³				
139.86 m ³ x 434.45/m ³				
S06C				
Chips - 205.80 m ³ x 602.28/m ³				
148.03 m ³ x 434.45/m ³				

Continuation

Name of the Road-N.H. 110 to S.S. Collage
Contractor Name-Mrityunjay Kumar
Length- 2.500 KM

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV	CATEGORY ROAD	IRI	Latitude	Longitude	Event
15/12/25	9:48:30	2	0.1	240	10.1	2400	2858 G		3.9	25.211918	85.693500	Normal
15/12/25	9:49:4	2	0.1	260	10.1	2600	3086 G		4.1	25.212788	85.677000	Normal
15/12/25	9:49:39	2	0.1	270	10.1	2700	3199 G		4.3	25.213270	85.621200	Normal
15/12/25	9:50:3	2	0.1	240	20.2	2400	2858 G		3.9	25.213360	85.526800	Normal
15/12/25	9:50:44	2	0.1	250	20.2	2500	2972 G		4	25.213507	85.434300	Normal
15/12/25	9:51:14	2	0.1	280	20.2	2800	3313 G		4.4	25.213750	85.335000	Normal
15/12/25	9:51:42	2	0.1	290	20.2	2900	3426 G		4.5	25.213918	85.244000	Normal
15/12/25	9:52:20	2	0.1	280	10.1	2800	3313 G		4.4	25.214128	85.141300	Normal
15/12/25	9:52:49	2	0.1	260	10.1	2600	3086 G		4.1	25.214300	85.505000	Normal
15/12/25	9:53:25	2	0.1	290	10.1	2900	3426 G		4.5	25.214488	84.999512	Normal
15/12/25	9:53:54	2	0.1	270	10.1	2700	3199 G		4.3	25.215130	84.999208	Normal
15/12/25	9:54:36	2	0.1	290	20.2	2900	3426 G		4.5	25.215860	84.999325	Normal
15/12/25	9:55:1	2	0.1	270	20.2	2700	3199 G		4.3	25.216632	84.999915	Normal
15/12/25	9:55:31	2	0.1	300	20.2	3000	3540 G		4.7	25.217475	84.999730	Normal
15/12/25	9:56:1	2	0.1	280	20.2	2800	3313 G		4.4	25.217930	85.470000	Normal
15/12/25	9:56:46	2	0.1	300	10.1	3000	3540 G		4.7	25.218208	85.138000	Normal
15/12/25	9:57:9	2	0.1	280	20.2	2800	3313 G		4.4	25.218565	85.227200	Normal
15/12/25	9:57:41	2	0.1	260	10.1	2600	3086 G		4.1	25.218825	85.323200	Normal
15/12/25	9:58:11	2	0.1	280	20.2	2800	3313 G		4.4	25.219008	85.419200	Normal
15/12/25	9:58:41	2	0.1	300	20.2	3000	3540 G		4.7	25.219113	85.510000	Normal
15/12/25	9:59:20	2	0.1	310	10.1	3100	3654 G		4.8	25.219653	85.563800	Normal
15/12/25	9:59:57	2	0.1	280	20.2	2800	3313 G		4.4	25.220445	85.597500	Normal
15/12/25	10:0:29	2	0.1	290	10.1	2900	3426 G		4.5	25.221205	85.658200	Normal
15/12/25	10:0:58	2	0.1	270	10.1	2700	3199 G		4.3	25.222023	85.680000	Normal
15/12/25	10:1:23	2	0.1	250	0	2500	2972 G		4	25.222595	85.659800	Normal

IRI	81570
AVG.IRI	3262.8

(R) RURAL ROAD

Good <4000
Average 4001-5000
Poor >5001

$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$
 $X = 2500$
 $Y = 2972$

22/12/25

15/12/25
25/12/25



Name of Customer :	Mityunjay Kumar
Name of Work/ Road :	N.H. 110 to S.S. Collage
Lab Job number	102
Date :	15-12-2025
Section No.	2

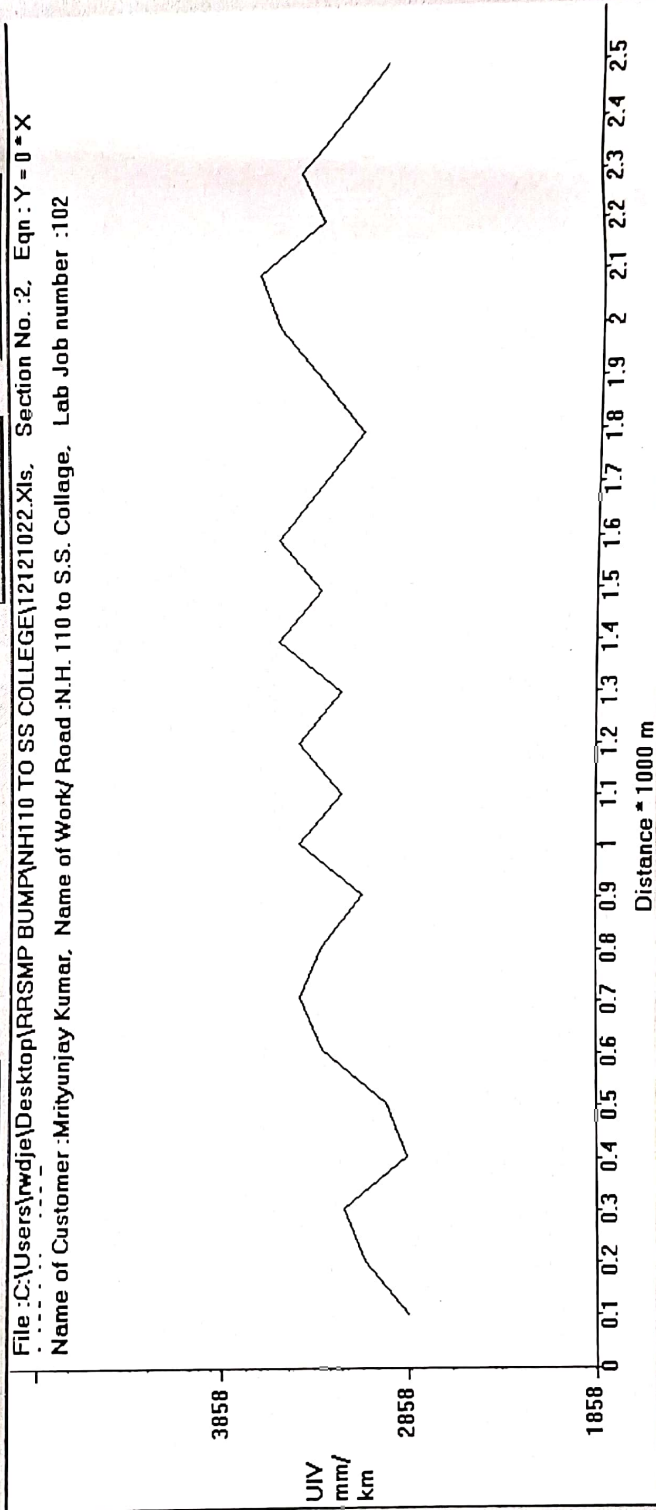
Test Date :	15-12-2025	Road Name :	N.H. 110 to S.S. Collage
Machine No :	393	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	0.00	Side :	
Start E No :	2.500	Interval	
Weather :	NORMAL	UIV Range :	1858 To 5000 mm/km
Start Location :	NH110	Dist Range :	0 To 2.6 * 1000 m
End Location :	SS COLLEGE	Equation :	$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\rwdje\Desktop\RRSMP BUMP\NH110 TO SS COLLEGE\12121022.Xls, Section No. : 2, Eqn : $Y = 0 * X$
 Name of Customer : Mityunjay Kumar, Name of Work/ Road : N.H. 110 to S.S. Collage, Lab Job number : 102



Yuvha
22/12/25

15/12/25
AF


25/12/25
AF

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।


अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (RRSMP-Gen) योजनान्तर्गत:-

1. पथ **N.H. 110 to S.S. Collage** में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, जहानाबाद।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, जहानाबाद।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।
