

MD. MAHAMOOD ALAM

Moh:- Dildarganj, ward No. – 38, Laheriasarai, Darbhanga

निबंधन संख्या - अभियंता प्रमुख (ग्रामीण कार्य विभाग) 2161390

Ref

Date... 30.10.2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत Subhash Chowk Jale to Tatama Tola. तक पथ निर्माण कार्य का समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत

Subhash Chowk Jale to Tatama Tola पथ निर्माण का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है,

जिसका एकरारनामा संख्या-49/SBD/2018-19 एवं दिनांक-16.01.2019 था। एकरारनामा के

अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि-15.07.2019 था। परन्तु वर्ष 2019 में बाढ़ आ जाने के

कारण एवं मेरा तबियत खराब हो जाने के कारण उक्त पथ का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं

हो सका है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा प्रमण्डल, कार्यालय में भी दिया गया है। वर्तमान में उक्त

पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जिसे मैं दिनांक-25.10.2020 तक पूर्ण रूपेण समाप्त कर दूंगा।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त योजना में दिनांक-25.10.2020 तक समय वृद्धि स्वीकृत करने की कृपा प्रदान करेंगे। इसके बाद मैं कोई अतिरिक्त दावा नहीं करूंगा।

अनु0:-यथोक्त।

MD. MAHAMOOD ALAM

विश्वासभाजन

34 रोज काम करेगा
30.10.2020
[Signature]

लुधियाना के साथ
30/10/2020
AK
[Signature]

दिनांक
1.11.2020
[Signature]

हस्ताक्षर
निमित्त
दिनांक
[Signature]

हस्ताक्षर
निमित्त
दिनांक
[Signature]

समय वृद्धि प्रपत्र

1. कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत Subhash Chowk Jale to Tatama Tola तक पथ निर्माण कार्य।
2. सम्बेदक का नाम :-
3. एकरारनामा संख्या :-
4. एकरारनामा अन्तर्गत कार्य का राशि:-
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:-
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि :- 16.01.2019
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि :- 15.07.2019
8. और अधिक समय जो माँग की जा रही है :- 16.07.2019 to 25.10.2020
9. कार्य विलम्ब का कारण:- परन्तु वर्ष 2019 में बाढ़ आ जाने के कारण एवं मेरा तबियत खराब हो जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका।
10. तिथि एवं समय जिसमें कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ:- 16.04.2019 to 16.07.2019
11. आवेदक द्वारा माँग की गई तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात प्रतिशत :- 100 प्रतिशत का पूर्ण हो चुका है।
12. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कबतक तिथि अंकित करें :- नहीं
13. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी:- नहीं दी गई थी।
14. सम्बेदक का हस्ताक्षर तिथि सहित :-
15. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति प्रतिशत में :- 35 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूर्ण।

Md Mahmood Alam

16. कनीय अभियंता की अनुसंशा एवं हस्ताक्षर :- 2019 के 15 अक्टूबर (वाल्मार्क एलिस हाथरस)

2019 के 15 अक्टूबर 2020

30.5.2020

17. अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुसंशा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित :-

AK
30/5/2020


18. कार्यपालक अभियंता की अनुसंशा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित:-

कार्य में जिला की प्रमुख दायित्व
जिस हेतु यह प्रमाणित किया गया है
जिस प्रमाण की वृद्धि अत्यन्त ही आवश्यक है
जिस प्रमाण की वृद्धि के लिए निवेदन
की उत्तरदायित्व यह मांगे की गई है
जिस हेतु यह प्रमाणित किया गया है
के लिए यह प्रमाणित किया गया है

19. अधीक्षण अभियंता की अनुसंशा:-

30/5/2020

04 समक्ष,
S. No. ...
Date 22/6/20

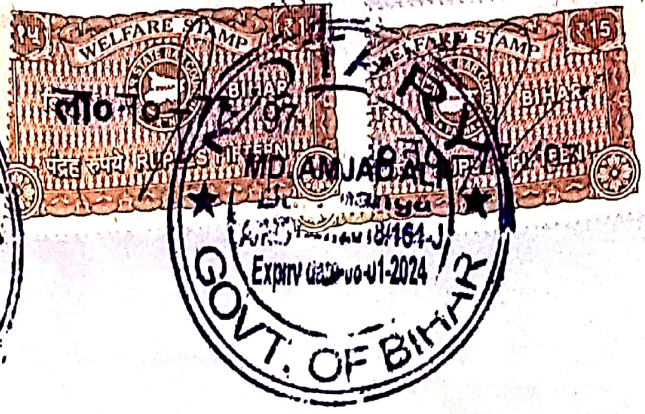

शपथ-पत्र


मैं मो० महम्मद आलम, मो०-दिदारगंज, वार्ड नं०-38, लहेरियासराय, जिला-दरभंगा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत Subhash Chowk Jale to Tatama Tola तक पथ निर्माण कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है।
3. यह कि उक्त कार्य का एकरारनामा सं०- 49 SBD/2018-19 एवं दिनांक- 16.01.2019 था।
4. यह कि उक्त पथ को दिनांक- 15.07.2019 तक समाप्त करना था, परन्तु परन्तु वर्ष 2019 में बाढ़ आ जाने के कारण एवं मेरा तबियत खराब हो जाने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सकेगा।
5. उक्त पथ को मैं दिनांक-25.10.2020 तक पूर्णरूपेण समाप्त कर दूंगा।
6. यह कि मेरे द्वारा निर्धारित समय तक उक्त पथ को पूर्ण नहीं करेंगे तो विभाग द्वारा किये गये कार्रवाई का मैं पूर्णरूपेण जिम्मेवार हूँगा।
7. यह कि मेरे द्वारा पूर्ण करने के उपरान्त एकरारनामा के अनुसार पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य भी किया जायेगा।
8. यह कि उपरोक्त कार्य को ससमय समाप्त नहीं होने के कारण समय वृद्धि स्वीकृत करने हेतु आवेदन दिया गया है।

9. यह कि मेरा आवेदन एवं समयवृद्धि स्वीकृत होने के बाद मेरा कोई भी अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।

मैं कि उपरोक्त लिखि गई सारी बातें मेरी जानकारी में है एवं सत्य है।

MD. Mahmood Alam
शपथकर्ता का हस्ताक्षर



Sri/Smt. ...
who is identified by Sri/Smt. ...
Advocate Sclerally affirmed and Declared
before me.

MD. AMJAD ALI
Notary Public (Govt. of Bihar)
Darbhanga

Identify the deponent who has
signed/Put L.T.I. or T.I. in my presence


MD. A. ...
22/6/20

कार्यालय कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2


अद्यतन स्थिति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मो० महम्मद आलम, मो०-दिदारगंज, वार्ड नं०-38, लहेरियासराय, जिला-दरभंगा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत ubhash Chowk Jalc to Tatama Tola. पथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसका एकरारनामा संख्या- 49 SBD/2018-19 एवं दिनांक- 16.01.2019 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि- 16.01.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि- 15.07.2019 था, परन्तु वर्ष 2019 में बाढ़ आने एवं संवेदक का तबियत खराब हो जाने के कारण उक्त कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। कार्य वास्तविक रूप से दिनांक-25.10.2020 तक पूर्ण करने हेतु संवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है।

वर्तमान में संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है।


30.5.2020
कनीय अभियंता,


30/5/2020
सहायक अभियंता,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2
