

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी -1

पत्रांक :- 1422

/दिनांक:- 04/07/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी - 1

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
मुजफ्फरपुर।

विषय:- शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत कुढ़नी बलिया पथ रेलवे गुमटी से बंगरा बंशीधर मुस्लिम टोला निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत कुढ़नी बलिया पथ रेलवे गुमटी से बंगरा बंशीधर मुस्लिम टोला निर्माण कार्य संवेदक मनजीत कुमार को आवंटित किया गया था। इस कार्य का समय वृद्धि हेतु संवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में भरकर आवेदन समर्पित किया गया है, जिसे मूल रूप में संलग्न किया जा रहा है। एकरारनामा से संबंधित मूल विषय निम्न प्रकार है:-

1. एकरारनामा संख्या : 26SBD/2019-20
2. एकरारनामा राशि : 43.48102 लाख
3. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि : 20.05.2019
4. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि : 19.02.2020
5. और जो अधिक समय की माँग की जा रही है : 30.08.2020

संवेदक द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्न विहित प्रपत्र में कार्य में विलंब का कारण अतिक्रमण तथा जमीनी विवाद दर्शाया गया है। विदित है कि अंचलाधिकारी कुढ़नी के पत्रांक 1055 दिनांक 12.06.2020 द्वारा दिये गये पत्र में जमीन विवाद रहने के कारण पथ का कार्य बाधित रहा।

अतः संवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र विहित पत्र सहित तथा शपथ पत्र मूल में संलग्न कर भेजते हुए दिनांक 30.08.2020 तक समय वृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-1

**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-1**

1. अभिकर्ता का नाम : मनजीत कुमार
2. कार्य का नाम : कुहनी व लिंगा पंच शेल्वे जुमती से लंगरा वंशीधर मुस्लिम टोला
3. एकरारनामा संख्या : 26/SBD/19-20
4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य : 4348102.00 रु
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : 4436839.00 रु
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि : 20.05.2019
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि : 19.02.2020
8. और अधिक समय जो माँग की जा रही है : 30.08.2020
9. तिथि एवं समय जिसमें कार्य संपादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ : 20.05.19 to 15.12.2019
10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णतः का अनुपात : 60%.
11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें : नहीं
12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गयी थी : X
13. अभिकर्ता का हस्ताक्षर : *Mangal Kumar*
14. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति : BT पूरी PCC बाकी है।
15. कनीय अभियंता की अनुशंसा : भूमि विवाद के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। समय बढ़ि के स्वीकृति दी जा सकती है। *Sumit*
10.06.2020
16. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित *Dispute land dispute work cannot be completed on time. If E may be given, Kanish*
10.06.2020
17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित अपने लिखावट में : *Recommended for final up to 30.8.20*
29/6/20
18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा :

समय वृद्धि हेतु प्रपत्र

योजना शीर्ष:- MMSY (SC)

पथ का नाम :- कुहनी व लिम पथ रेलवे जुमली से अंगरा अंगीधर मुस्लिम टोला

1. एजेन्सी का नाम :- मनजीत कुमार
2. प्रस्तावित पथ किस पैकेज में है
या एकल पथ है :- एकल पथ
3. पैकेज के सारे पथों के पूर्णता प्रमाण पत्र :- 60% कार्य पूर्ण
4. समय वृद्धि कारण का साक्ष्य :- संलग्न
5. संवेदक द्वारा भविष्य में वित्तीय दावा नहीं करने का प्रमाण पत्र :- संलग्न
6. मापी पुस्त पर अंकित कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण है एवं
मापी पुस्त की छाया प्रति कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित :- संलग्न
7. अंतिम विपत्र पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर :- हाँ
8. कनीय अभियंता एवं संवेदक के साथ खींचा हुआ तीन फोटो पथ
का रोड फर्निचर, मुख्य सूचना पट्ट, रोड फ्लैंक, किमी पोस्ट का
फोटो कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित :- संलग्न
9. संवेदक द्वारा अनुरक्षण Defect Liability में एकरारनामा के अनुसार
संतोषप्रद अनुरक्षण कार्य का संपादन किया जा रहा है :- हाँ
10. ATR लंबित है या नहीं :- नहीं

Burner
10.06.2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा

K Anand
10/06/20
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल

HEAD - MMGSY

NAME OF ROAD : KUDHANI BALIYA PATH RELWEY GUMTI TO
BANGRA BANSIDHAR MUSLIM TOLA



Bumr
10.06.2023
72

K. Anil
10/06/20
A.E.
20/7/20

HEAD - MMGSY (SC)

NAME OF ROAD : Kudhani Baliya Path Relwey Gumti Se Bangra
Bansidhar Muslim Tola.



Bimr
10.06.2020
a


Be amulach
10/06/20
A.E.

am
29/6

01/05/2020

HS 0000345961

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

29-MAY-2020 10:40:12

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREENIVAS RASHTRA STRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT MUZAFFARPUR

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT2931E2038K639

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)

₹10

BIHAR COURT FEE
BRC 2750492E2011N
27-MAY-2020




BRCT2931E2038K639



Statutory Alert: The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.sniclegstamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after Verification & locking by the Court Official.

Doc No. 01 Sr. 37
Date: 29 MAY 2020

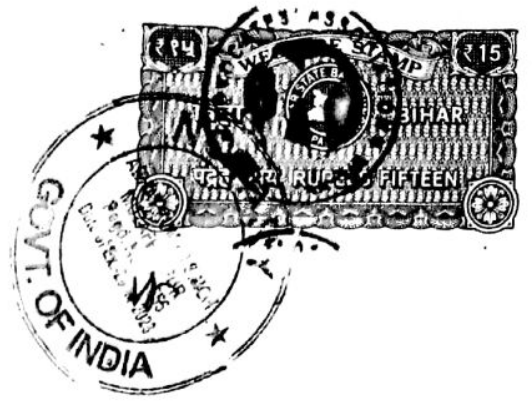

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक,
मुजफ्फरपुर।

शपथ-पत्र

मैं मंजीत कुमार, ई 121, पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20 शपथ पूर्वक बयान करता

हूँ:-

1. यह कि मैंने "कुढ़नी बलिया पथ रेलवे गुमटी से बंगरा वंशीधर मुस्लिम टोला पथ पथ" तक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत सड़क का निर्माण कार्य कर रहा हूँ।
2. यह कि ग्रामीण जमीन विवाद के कारण समय वृद्धि की मांग कर रहा हूँ।
3. यह कि समय वृद्धि के पश्चात रख-रखाव एवं जमानत की राशि के अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करूँगा।
4. यह कि शपथ पत्र के सारे तथ्य मेरी जानकारी में सही है।

अतः यह शपथ-पत्र है।

Mangit Kumar
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया।

Mukesh Kumar
अधिवक्ता
29.05-2020

Deponent Solemnly
Affirmed & declared before me

ASHAY KUMAR SINGH
Notary Public
Enrol. No. 1017/Muzaffarpur

29/05/2020

प्रेषक,

अंचल अधिकारी

कुढ़नी

सेवा में,

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल कुढ़नी

दिनांक:- 12/06/2020 /

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सम्पर्क योजना का सीमांकन के संबंध में।

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सम्पर्क योजना अंतर्गत कुढ़नी-बलिया रेलवे गुमटी से बंगरा बंशीधर मुस्लिम टोला तक अंचल अमीन से सीमांकन कराया गया। ग्रामीणों से पुछताछ से पता चला कि सड़क किनारे सीमांकन को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद था। कई बार ग्रामीणों के साथ बैठक कर अंचल अमीन द्वारा दिनांक 08.06.2020 को उक्त कार्य का निस्तार करा दिया गया। जिस कारण सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी

कुढ़नी

R.W.D., MUZAFFARPUR

G3B - Grading I

NAME OF DIVISION: - R.W.D. WORKS DIVISION Muz. East-1

DATE OF COLLECTION 11.5.20

DATE OF TEST 15.5.20

REF.: P10 (A.G. R. W.O. works Sub. Div. Kudhami mu: East-2 letter No. 0) dt. 16.1.20

MEMO NO 583 Dt. 12-1-20

R.W.D., WORKS DIVISION 1042 East 1

~~Bar~~
15/5/20
AE

25/5/23
कामाक्षी कार्य विभाग
अन्तर्गत प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर

PHYSICAL & GRADATION TEST OF

WBM - Gr-III

NAME OF WORK

Kudhani Baliya Path Railway Gums to Bangra Bensi dhar
Muslim Tola Underpinning

NAME OF DIVISION: - R.W.D WORKS DIV Muz. East-1

AGENCY: - 261 SBD 119-20

RECEIPT

DATE OF COLLECTION:-

11.5.20

:- PWD (A.E.R.W.D. works Sub.Div. Kudhani Muz. East-1)

DATE OF TEST :- 15.5.20

PHYSICAL TEST

Letter No- 07 Dt 16.1.20

NO	A.I.V		WATER ABSORPTION		REMARKS
	TEST VALUE %	REQUIRED LIMIT %	TEST VALUE %	REQUIRED LIMIT %	
	21.54 %	40%	0.752%	3%	Permissible

GRADATION TEST

no	Sieve No m.m	Weight Retained (KG)	% Wt of Retained	Cumulative % Retained (Kg)	% of passing (kg)	Required limit %	Remarks
			ch - 350 M				
			wt. of Sample -	24.519 kg.			
			wt. of Screen -	4.205 kg.			
			wt of s/m -	20.314 kg.			
	63	Nil	Nil	Nil	100.00	100	
	53	0.593	2.92	2.92	97.08	95-100	
	45	6.472	31.86	34.78	65.22	65-90	Permissible
	22.4	11.475	56.49	91.27	8.73	0-10	
	11.2	1.621	7.98	99.25	0.75	0-5	

Memo No 583

Date 15-5-2020

Copy To - E.E R.W.D. Works Div

Muz. East-1

[Signature]
15-5-20
L.A

[Signature]
15/5/20
A.E

[Signature]
15/5/20
E.E कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
राज्य प्रयोगशाला, मुजफ्फर
