



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमण्डल राजगीर (नालन्दा)
Email:- rwdrajgir@gmail.com, ee.rajgir@rwdbihar.in

पत्रांक 450

राजगीर

दिनांक 6/7/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल राजगीर।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:- कार्य अवधि बढ़ाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि संवेदक Ranjan Brothers & Sons Construction द्वारा दो पथों में कार्य अवधि बढ़ाने की माँग की गई है, जिसे विभागीय MIS पर Uplod किया गया है।


अतः उक्त दो पथों को अग्रेतर कारवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

- 1.Murgawon Chhabilapur Road to Balwapar
- 2.Murgawon Chhabilapur Road to Murgawon Koyri Tola

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल राजगीर

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of Contractor:- Ranjan Brothers & Sons Construction
2. Name of Work:- Murgaoon Chhabilapur Path to Murgawa Koyridola
3. Agreement No. & Date:- 03/SBD/2019-20
18-06-2019
4. Agreement Value:- 3995783.00
5. Date Of Commencement:-
6. Actual Date Of Completion:- 17-12-2019
7. Extension On Previously Given On:-
8. Extension Applied For:- 31.08.2020
9. Reason For Hindrance:- Land disputed.
10. Percentage Of Work Done:- 80-1.
11. Recommendation BY The J.E. :- 
30/06/20
12. Recommendation By The S.D.O. :- Recommended 
1.7.20 AE
13. Recommendation By The Executive Engineer:- Recommended upto 31/8/20

21/7/20
14. Recommendation BY The S.E. :-
15. Final Order Of The C.E. :-



Signature of the Contractor

अंचल कार्यालय, बेन (नालन्दा)

पत्रांक- ५५५ दिनांक- ३०/०६/२०२०

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
बेन।

सेवा में,

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल बेन
NATGAR

विषय:-

शीर्ष MMGSY (SE) अन्तर्गत मुरगौवा छबीलापुर पथ से मुरगौवा कोईरी टोला
निर्माणधीन पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 25 / दिनांक 30.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि संबंधित पथ का
अंचल अमीन बेन से मापी करायी गयी, अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि
खेसरा नं० 1362 का मापी प्रेम कुमार व राजनन्दन प्रसाद के मौजुदगी में मापी कर चिह्नित
कर दिया गया है। पथ का निर्माण सरकारी भूमि में हो रहा है। किसी रैयत के भूमि में रोड
का निर्माण नहीं हो रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी

बेन।

सेवा में

पत्रांक सं-425/

दिनांक 24-6-2021


अंचल अधिकारी

वेन

विषय :- शीर्ष MAMGSI (S.C.) अन्तर्गत सुरगांव दक्की साधु
पथ से सुरगांव केईरी रोसा निर्माणधीन पथ का
नापी प्रतिवेदन।

दि. 20/06/2021
सहायक

उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक-29-6-2021
को ग्राम-सुरगांव स्थल पर पहुँच लगा मुल नक्शा का
अवलोकन कर, विवादित खेसरा नर-1362 को आगे
चैम कुमार व राजनदन पसाय के मौजूदगी में खेसरा नर
1362 को नापी कर चिन्हित कर दिया। रोड का निर्माण
सरकारी भुमी में हो रहा है, किसी इलाके के भुमी में रोड
निर्माण नहीं हो रहा है।

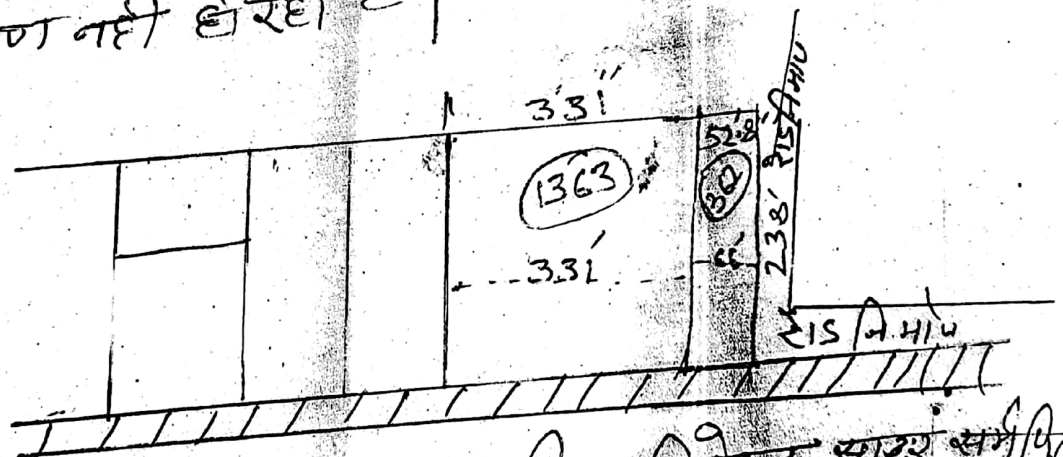

अतः श्रीमान को नापी प्रतिवेदन सादर समर्पित।

विश्वास भजन

रविन्द्र कुमार

अंचल अमीन वेन



सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल वेन (नालन्दा)

दिनांक 25/06/2020

राजगीर

दिनांक 25/06/2020

प्रेषक

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल वेन।

सेवा में

अचलाधिकारी
वेन (नालन्दा)

विषय:- शीर्ष MMGSY(SC) अन्तर्गत मुरावा छवीलापुर पथ से मुरावा कोईरी ढोला निर्माणधन पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विषयांकित पथ मुरावा छवीलापुर पथ से मुरावा कोईरी ढोला में जमीन विवाद उत्पन्न होने के कारण पथ का निर्माण कार्य बाधित हो गया है। इसलिए उक्त पथ के रेखांकन में आने वाली सरकारी जमीन को सिमांकन करने की आवश्यकता है।

अनुरोध है कि विषयांकित पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन हेतु सरकारी अमीन से मापी कराकर प्रतिवेदन देने की कृपा की जाये ताकि पथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासमय

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमण्डल वेन

ज्ञापक:-

425

दिनांक

24/06/2020

प्रतिलिपि:- श्री रविन्द्र कुमार, अचल अमीन को सूचनाार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त पथ का विवादित स्थल को मापी हेतु दिनांक- 29/06/2020 को तिथि निर्धारित की गयी है, निर्धारित तिथि को उक्त पथ का मापी करना सुनिश्चित करेंगे।

अचल अधिकारी

वेन।
