

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 1363 / जहानाबाद,
प्रेषक,

दिनांक: 14/09/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल146 - टी02 से छज्जोपुर पथ निर्माण कार्य की समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल146 - टी02 से छज्जोपुर (पैकेज संख्या- बीआर-14आर-373) पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसका एकरारनामा संख्या-29एसबीडी/2018-19 है एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 15.01.2020 है। पुनरीक्षित एकरारनामा एवं जमीन विवाद होने के कारण संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं कराया गया जिसके कारण दिनांक 20.09.2020 तक समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में भरकर अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है। आवंटन की अधियचना से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।
अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
14-9-2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

[Signature]
14/9/20



Ref... 21/20.....

Date... 10/08/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद ।

विषय :- PMGSY योजना अन्तर्गत TO2 से छाजोपुर पथ में संशोधित कार्य समर्पित कर
के संबंध में ।

द्वारा- उचित माध्यम

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारी फर्म द्वारा
एकरारित योजना TO2 से छाजोपुर पथ का कार्य विभिन्न कारणों जैसे पुरक एकरारनाम
अतिवृष्टि, जमीन विवाद व COVID-19 संक्रमण से ससमय पूर्ण नहीं हो सका है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की संशोधित कार्य योजना की स्वकृति प्रदान की जाय
जिससे कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जा सके । इसके लिए श्रीमान का
आभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Managing Director

Ref.....

Date.....

REVISED WORK PROGRAM

ROAD NAME – L 146 TO2 TO CHHAJOPUR

Agency Name – M/S ADITYA SHREE ENGICONS PVT.LTD.

Agreement No.- 28/SBD/2018-19

Duration in Month	Item of Work	Item of Work
15 June to 15 July	G.S.B	H.P Culvert
15 July to 20 August	G.S.B Complete	W.B.M-III Start
20 August to 10 September	W.B.M-III Complete	
10 September to 20 September	Carpeting and Road Signage	

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Managing Director



Ref.....

Date...14/12/19

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य प्रमण्डल
जहानाबाद

विषय:- PMGSY योजना के अंतर्गत LI46 T02 से
छज्जोपुर रोड में समय वृद्धि के संबंध में।
महोदय,

सूचित करते हुए कहना है की उक्त पथ के
आरंभ में निजी जमीन रहने के कारण मिट्टी कार्य
कराने में निजी जमीन रहने के कारण मिट्टी कार्य
कराने में काफी समय व्यतीत हो गया है। उक्त पथ
में बाढ़ से Sub-Grade भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया
था। इसकी सुचना प्रमण्डल को पूर्व में दे दी गई थी।

ज्ञात हो की उक्त पथ के प्राक्कलन का
पुनरीक्षण भी किया गया है जिसका पुरक एकशतांश
सितंबर माह में किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की उक्त पथ
को पूर्ण करने हेतु 30/03/2020 तक समय वृद्धि
दिया जाए। इसके लिए आपका आभारी रहूंगा।

विश्वासभाजन
M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Ranjit Ranja
Managing

वरिपुत्री
बज्जो ७८

स्वामे,

अधिका अधिवारी मंडीका
मरुभूमि

विषय - मौला-दरिगारी दीया दल्लोपुर भागा १०-१८ के अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के
दल्लोपुर लु अर्थात् मं वन रहे सुरु का मापी के बंधे का मं
प्रमाण - भवदीन फाते ८२७ दिनांक ११/०५/१३

महाराज,

१८५२ विषय के संबंध में अधिका अधिवारी मरुभूमि के आदेशानुसार
मौला-दरिगारी के दल्लोपुर लु वन रहे सुरु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के
दल्लोपुर लु अधिका के लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के
मौला-दरिगारी विषय गंगा। लोच के लु मं वन रहे सुरु के द्वारा
दल्लोपुर पर मिट्टी भर कर सुरु वन रहे सुरु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के
लु अर्थात् १०-१८ के दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
अर्थात् दल्लोपुर पर सुरु फाते गंगा लु अर्थात् १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
लु अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
गंगा। इन अर्थात् दल्लोपुर के दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के
दी बंधे नगरा के अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के
अर्थात् १०-१८ के दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
दी बंधे नगरा के अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के
लु अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
-दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
लु अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
का अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के दल्लोपुर १०-१८ के
गंगा। मापी के लु अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के

अर्थात् अर्थात् के अर्थात् दल्लोपुर लु अर्थात् दल्लोपुर १०-१८ के

अधिका अधिवारी
मरुभूमि

મોજા - ઘરેમારી વેસ્ટ ઇન્જોયર

સ્થાનામી -


લોર પ્રો. 1442
5918

વસ્તુવા -

જિલ્લો - બઠાનાવાડ

પ્રામા નં - 281

પ્રામા - મરજુમકુર

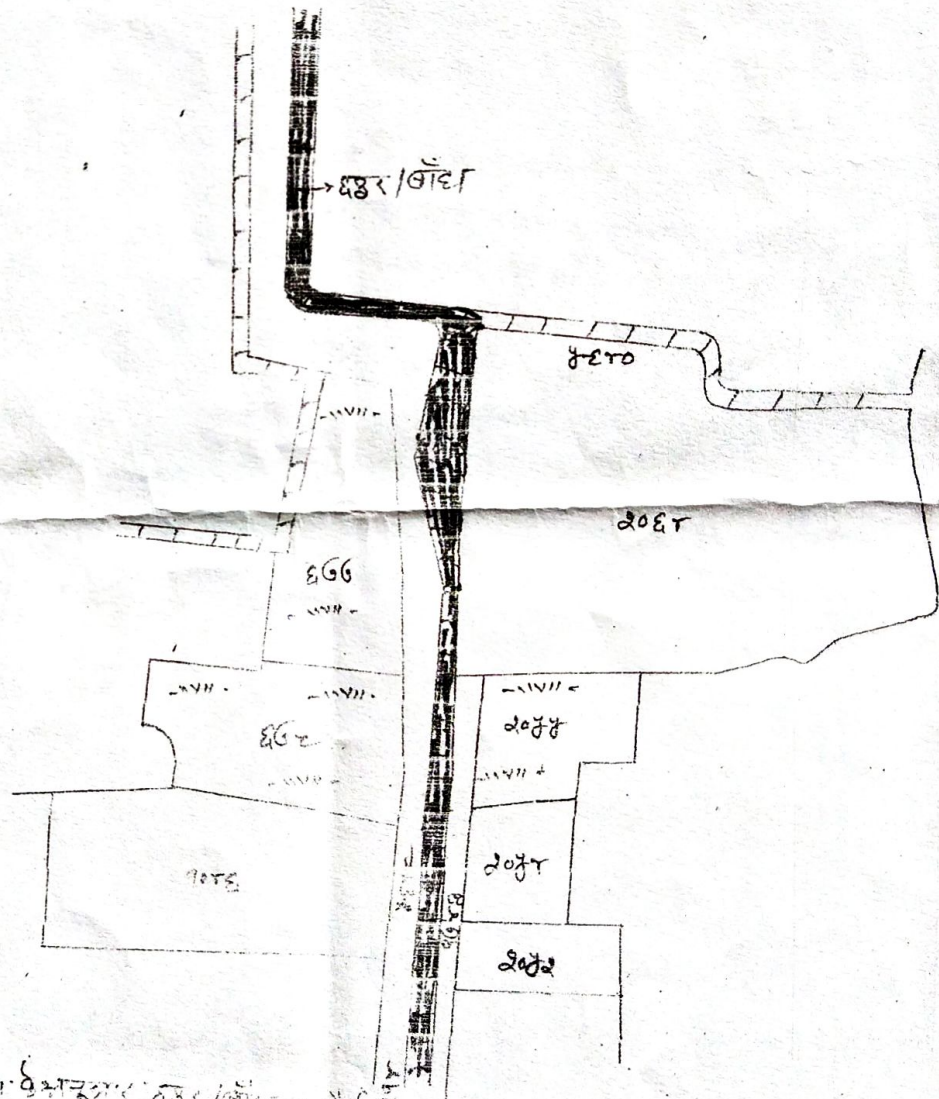

NOTE - જો નક્કામાં મરજુમકુર વેસ્ટ/લોર પ્રો. 1442 નો કોડ 3075, 4075, 5075, 6075, 7075 નો છે.

21/4/19
મરજુમકુર

अंचल अतिथि मरकटपुर अदालत

सेवा में,

अंचल अतिथि महोदय
मरकटपुर

विषय: बीजा-हरिमर्दि टोषा दण्डोपुर आना नं०-२८। फिज्जलीह नुल नं०-०१
अथवा दण्डोपुर का वर्तमान में वन एवं ग्राहक का माफी विवेक
में।

प्रमाण-अपलीक - नोट - ३३९ दिनांक - ११/०४/१९

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अंचल अतिथि मरकटपुर के आदेशानुसार
आज दिनांक - १५/०४/१९ का आवेदक अणोद कुमार बिलि आमेवर आदर
आफिन दण्डोपुर का अदरम नं० ४६ (परिमित) एवं शर्मा व अनरा
दण्डोपुर तथा आवेदक के पक्ष में अथवा अथवा गौ. सरकारी अमीन
के अतिथि ने माफी करने आगे बढ़े लड़ने किया जा रहा है।

आवेदक का हस्ताक्षर

Ashok Kumar
15/4/19

अतिथि
15/4/19
अंचल अमीन
मरकटपुर

शर्मा व अनरा का हस्ताक्षर

विनय कुमार,
रवि कुमार
गोपाल १०
मोहन कुमार

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME :-

1. Name Of Contractor: M/s Aditya shree Engicons. Pvt. Ltd.
2. Name Of Work:- Construction of road from T02 to Chhajopur
(Head Of Expenditure)
3. Agreement Number:- 29/SBD/2018-19
4. Agreement Value:- Rs 6878567.00
5. Date Of Commencement Of Work:- 16/01/2019
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 15/01/2020
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:- No
8. Work Done In %:- 100%
9. Period For Which Extension Now Applied For:- 20/09/2020
10. Reason For Extension Of Time:- Supplementary agreement, land dispute, cont-19
11. Recommendation By J.E.:- Time extension maybe granted Board No. 18/05/2020
12. Whether Programme Of Work Approved:- Yes
13. Whether Fund Available:- Yes
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The

Current Work Programme or not:-

15. Recommendation Of SDO:- Recommended for Extension of Time

16. Recommendation Of Executive Eng:-

अग्रविधि

18/8/20
AE
20.8.2020

17. Recommendation Of S.E.

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामाण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल जहाजवाट
