

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 286 अन्त

हरनौत,

दिनांक 15/2/2021

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- सालेपुर नरसण्डा P.W.D. पथ से कचलपुर भाया हब्बीबुल्लाचक तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सालेपुर नरसण्डा P.W.D. पथ से कचलपुर भाया हब्बीबुल्लाचक तक पथ निर्माण कार्य संवेदक कुन्दन कुमार, पता: कटरा बाजार, पटना सिटी को आवंटित है। उक्त पथ की एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.06.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.06.2020 थी। परन्तु उक्त पथ के 345 मीटर चैनेज पर मंदिर का वाउण्ड्री तथा ग्रामीणों द्वारा H.P. Culvert देने एवं गली में 50 मीटर आगे बढ़ाने तथा प्रोटेक्शन वाल बनाने का दबाव दिया जा रहा है, जिसमें कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है स्थानीय विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में करीब 7 माह का विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक-30.08.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-30.08.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु०-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 3 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।

विश्वासभाजन

[Signature]
15-02-2021

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

[Signature]
13/2/21

FROM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- 1) Name of Work :- *Highway P.W.D. work at Chaudhary Nagar*
- 2) Name of Contractor :- *Om-Dev Construction*
- 3) No. of agreement order :- *02/SBD/2019-20*
- 4) Date of commencement of work :- *15.06.2019*
- 5) Contractor's date of completion of work :- *14.06.2020*
- 6) Date of Actual Completion :-
- 7) Date of hindrance :-
- 8) Provision extension date :- *30.08.21*
- 9) Further extension date :-
- 10) Reference of contractor's application if any :-
- 11) If any defects have been found the work date :-
- 12) Region :- *Distt. Nalanda, HP District, SOAEC, Chaudhary Nagar, Prayagraj*
- 13) Proportion of work date up to completion of time :-
- 14) Proportion of up date work done :-
- 15) Recommendation of J.E. :- *1/19/2020 का कथन सत्य है। समय वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।*
- 16) Recommendation of A.E. :- *13-2-21 A.E.*
- 17) Final order or recommendation of the E.E. :-

Om-Dev Construction
Signature of Contractor

15.02.2021
EXECUTIVE ENGINEER
R.W. & WORK DIVISION
HARNAUT (NALANDA)
Signature of
EXECUTIVE ENGINEER
R.W. & WORK DIVISION
HARNAUT (NALANDA)
Executive Engineer

सेवा - श्री

कार्यपालक अधिकारी -
ग्रामिण कार्य-आयोग -
कार्य प्रसंग - हलवाई

विषय - पथ का नाम - हावेसपुर - 111-51 P.W.D पथ

के कचहड़ा - माया हलवाई - 30.08.2021

संपर्क का समय
समय वृद्धि की अनुमति - समय वृद्धि देने के लक्ष्य -
की जाती है - 14.21.21

10/02/2021
J.E
13-2-21
A.E

उपरोक्त विषय के लक्ष्य - श्री कदर है की m.m.s.s
श्रीमान श्रीमान पथ - हावेसपुर - 111-51 P.W.D पथ के
कचहड़ा - माया हलवाई - 30.08.2021 के अंतर्गत लक्ष्य -
पुर्ण - नहीं है।

- (1) इस भी - श्रीमान - पथ - 111-51 के अंतर्गत लक्ष्य -
कार्य करने के लक्ष्य - है।
- (2) इस भी - श्रीमान - पथ - 111-51 के अंतर्गत लक्ष्य -
है।
- (3) इस भी - श्रीमान - पथ - 111-51 के अंतर्गत लक्ष्य -
है।
- (4) इस भी - श्रीमान - पथ - 111-51 के अंतर्गत लक्ष्य -
है।

आ. - श्रीमान - पथ - 30.08.2021 के
लक्ष्य - देने के लक्ष्य -

11.02.21
11.02.21

No. 767 Date 8/02/2022



बिहार BIHAR म सख्या 22207 तिथि 8/2/2022 मूल्य 100 सीट संख्या AC 404466
पता का नाम और पता 30/14W 30/14W
सिद्धनाथ गुप्ता
ब्रांक विक्रेता, समाहरनालय, पटना
ला० नं०-56/90

mt...
onent's Signature/L.V.f
ified by
Advocate, Solemnly affirmed and
eclared before me.
ARUN KUMAR
NOTARY, PATNA



नोटरी पब्लिक पटना सदर ।

शपथ - पत्र

कुन्दन कुमार, प्रो०- कुन्दन कुमार, पता- कटरा बाजार, पटना सिटी, पटना,
धाना- मालसलामी, जिला- पटना, धर्म- हिन्दु, का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक ब्यान
करता हूँ, कि :-

- यह कि मैं उपर वर्णित पते का निवासी हूँ, वो एक निर्बंधित सविदक हूँ ।
- यह कि मैं सालेपुर- परसण्डा पी.डब्लू.डी. पथ से कचलपुर भाया हबीबुल्लाहचक
तक गड़क निर्माण कार्य कर रहा हूँ ।
- यह कि 345 मीटर चैनल पर मंदिर का बाँड़ी वाल पथ में रहने के कारण कार्य
कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था ।


2.

4. यह कि ग्रामीणों द्वारा 350 मीटर चैनल पर सच. पी. ~~कट कर~~ देने के दबाव के कारण कार्य में विलम्ब हुआ ।
5. यह कि ग्रामीणों द्वारा पथ का लेथ लास्ट चैनल से 50 मीटर आगे गली में बढ़ाने का दबाव है । कारणावश कार्य में विलम्ब हुआ ।
6. यह कि ग्रामीणों द्वारा चैनल 350 से 380 मीटर तक प्रोटेक्शन वाल बनाने का दबाव दिया जा रहा है । जिससे कारण कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है ।
7. यह कि मैं उपरोक्त पथ के कार्य हेतु अवधि विस्तार हेतु आवेदन किया हूँ ।
8. यह कि मैं उपरोक्त पथ के भुगतान में नई दर तालिका हेतु भविष्य में या कभी भी कोई दावा नहीं करूँगा।
9. यह कि कार्य पूर्णता पर है ।


उपरोक्त लिखी गई सारी बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं ।



Identify the deponent's signature
...I.I. who has/have affirmed in
My Presence


Advocate

शपथकर्ता का हस्ताक्षर





मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क का नाम - सालेपुर - नरसंडा PWD पथ से कचलपुर
भाया हब्बीबुल्लाहचक ।
पथ की लम्बाई - 1.120 कि.मी. प्रा.राशि - 60,90,614/-
5 साल तक रख-रखाव की राशि - 5,01,244/
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 15.06.2019
कार्य समाप्ति की तिथि - 14.06.2020
संवेदक का नाम - कुन्दन कुमार
कार्यकारी एजेंसी - कार्य.अभि.ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संपादित


बिहार सरकार



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला - नालन्दा

सड़क का नाम-सालेपुर-नरसंझा PWD पथ से कचलपुर भाया ह०बीबुल्लाहचक।
कुल लम्बाई-1.120 कि.मी. बी.टी. सड़क-0.775 कि.मी. सीमेंट कंक्रीट सड़क-0.345 कि.मी.
पुलिया- नग

सड़क पैवमेंट का विवरण

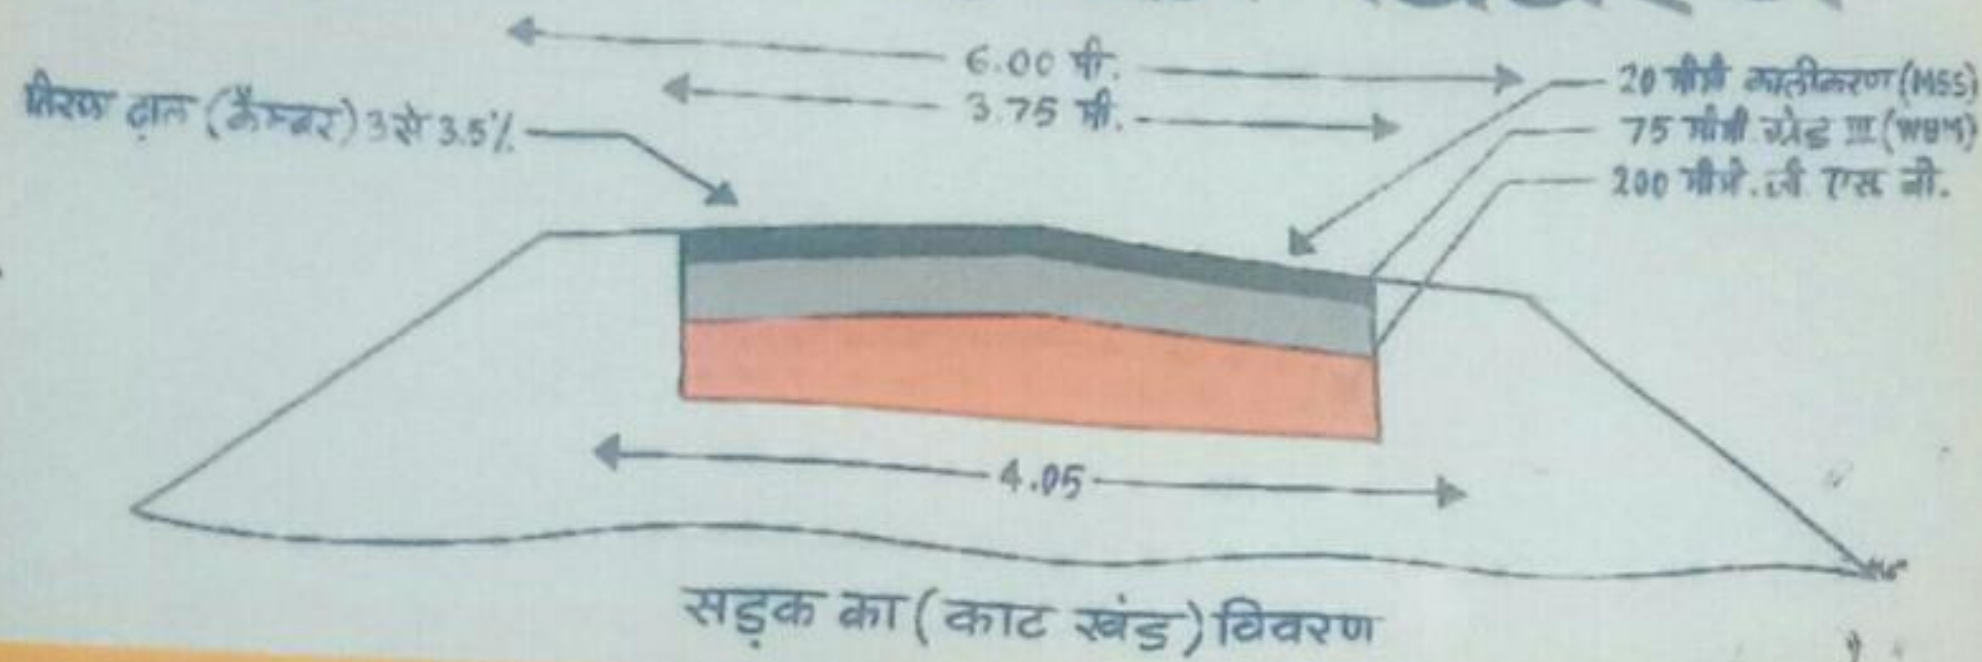

1. बंधान का मिट्टी कार्य घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
पानी डाल कर रौलर से दबाया हुआ।
2. दानेदान उप आधार घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
पानी डाल कर रौलर से दबाया हुआ।
मुरम घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
मिट्टी या नदी की रेत (ग्रेवल) घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
पत्थर का चूरा घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
3. गिट्टीकृत परत या 2 परतों में डबलू.बी.एम. (प्रत्येक परत 7.5 से. मी. मोटी)
घन मी. प्रत्येक परत अलग-अलग निर्मित की जायेगी
पत्थर का चूरा/मुरम घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
गिट्टी सुखी गिट्टी रौलर से दबाई जायेगी, पत्थर का चूरा या मुरम डाली जायेगी,
पुनः रौलर से दबाई जायेगी, पानी डाल कर रौलर से दबाई जायेगी।
4. डामरीकृत परत
प्रायमर कोट प्रायमर टेक कोट इमलश
पूर्व से मिश्रित कारपेट 20 मिमी. मोटाई में। कुल मिश्रण
गिट्टी घन मी. (ट्रक के समतुल्य)
(ट्रक के समतुल्य)
बिंदुमन (ट्रक के समतुल्य)

