

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक

हरनौत,

दिनांक/...../2021

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,

अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत (नवार्ड) ^{Bridge} High Level Birdge Over Shashi River in Noorsarai Bara Bigha To Pandaychak Path में पुल निर्माण कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत (नवार्ड) ^{Bridge} High Level Birdge Over Shashi River in Noorsarai Bara Bigha To Pandaychak Path पुल निर्माण कार्य संवेदक श्री राकेश कुमार, ग्राम+पोस्ट-डोईया, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा को आवंटित है। उक्त पथ की एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-27.06.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-28.06.2020 थी। परन्तु उक्त पथ में स्थानीय जमीन विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में करीब 17 माह का विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक-30.11.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-30.11.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु०-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 14 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।
- (4) संवेदक का पत्र 1 अदद।
- (5) अंचल अधिकारी, नूरसराय का पत्र 1 अदद।

विश्वासभाषित


01.06.2021

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of Contractor:- Rakesh kumar
2. Name of Work:- Construction of High Level Birdge Over Ghaghi River in Noorrai Bara high to Pandi thak Road.
3. Agreement No. & Date:- 07/300/2019-20, 27.06.2019
4. Agreement Value:- - 1,76,87,708.00
5. Date Of Commencement:- 27-06-2019
6. Actual Date Of Completion:- 26-06-2020
7. Extension On Previously Given On:- NO
8. Extension Applied For:- 30-11-2021
9. Reason For Hindrance:- Land distribution (भूमि वितरण) in approach
10. Percentage Of Work Done:- 98% has been work done.
11. Recommendation BY The J.E. :- Time of extension may be given
28/05/2021
12. Recommendation By The S.D.O. :- Time extension may be given
28-5-21
A-E
13. Recommendation By The Executive Engineer:- forwarded with recommendation
for
01.06.2021
SE
14. Recommendation BY The S.E. :-
15. Final Order Of The C.E. :-

Signature of the Contractor

Rakesh Kumar

अनुमति के लिए प्रार्थना

Rakesh Kumar

कार्यालय अंचल अधिकारी नूरसराय (नालन्दा)

पत्रांक: ५५८

दिनांक ०६.०५.२१

अंचल अधिकारी,
नूरसराय।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल (हरनौत)।

विषय : H.L.R.C. बारा विगहा पुल के सम्पर्क पथ के निर्माण के संबंध में।

महाशय,



उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि H.L.R.C. पुल निर्माण का कार्य प्रमण्डल हरनौत के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें बारा विगहा ग्राम के तरफ जाने वाले रास्ते में ग्रामीणों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसके कारण कार्य बाधित हो गया था। विवाद को मुखिया के अध्यक्षता में ग्रामीणों द्वारा आपस में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया तथा वर्तमान में किसी प्रकार का विवाद कार्यालय के सज्ञान में नहीं है।

अतः निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।

सादर सूचनार्थ।

विश्वसिभाजन

०६/०५/२१
अंचल अधिकारी,
नूरसराय।



शपथ-पत्र Affidavit

N.B.A. SEP 2020 SL No. 18273

Who has been identified by Sr. Advocate solemnly affirmed and declared before me the facts stated in the affidavit are true.

NOTARY PUBLIC
BIHAR SHARIF
(Nalanda)

समक्ष,

नोटरी पब्लिक,
बिहार शरीफ, नालन्दा।

Affidavit No. 142313
Authorized U/S (1) of Notaries
Act, 1952 and U/Rule 11 (4) (8)
Not. Notaries Rule 125

शपथ-पत्र

मैं, राकेश कुमार पिता स्व० झुलन प्रसाद, ग्राम + पोस्ट- डोईया, थाना- नूरसराय, जिला- नालन्दा

- यह कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हरनौत के अधीन नवार्ड योजना अन्तर्गत नूरसराय बाजार से बारा बिगहा पाण्डेचक रोड में सासी नदी पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पूल निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या- 07/एफ०बी०डी० 2019-20 है।
- यह कि मेरा विभाग के पास अवधि विस्तार भुगतान के अलावा कोई बकाया नहीं है।
- यह कि यह कार्य एकरारनामा के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण एवं संतोष पूर्ण कार्य कर रहा हूँ।
- यह कि नदी में पानी रहने एवं पहुँच पथ में/विवादित जमीन के कारण समय पर कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है।
- यह कि उपरोक्त निर्माण कार्य में छः माह की अवधि विस्तार करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बातों को पढ़कर समझ लिया और सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।



शपथकर्ता

I identify the signature/L.T.I. of Deponent Rakesh Kumar Who has put his/her Signature or L.T.I. in my Presence.

Advocate

En. No. 126/89


Mob. No.


नालन्दा जिला अधिवक्ता राँघ, बिहारशरीफ।



Latitude: 25.261698
Longitude: 85.437292
Elevation: 32.84±111 m
Accuracy: 5.9 m
Time: 23-03-2021 12:33
Note: shashi nadi noorval me Bara birha



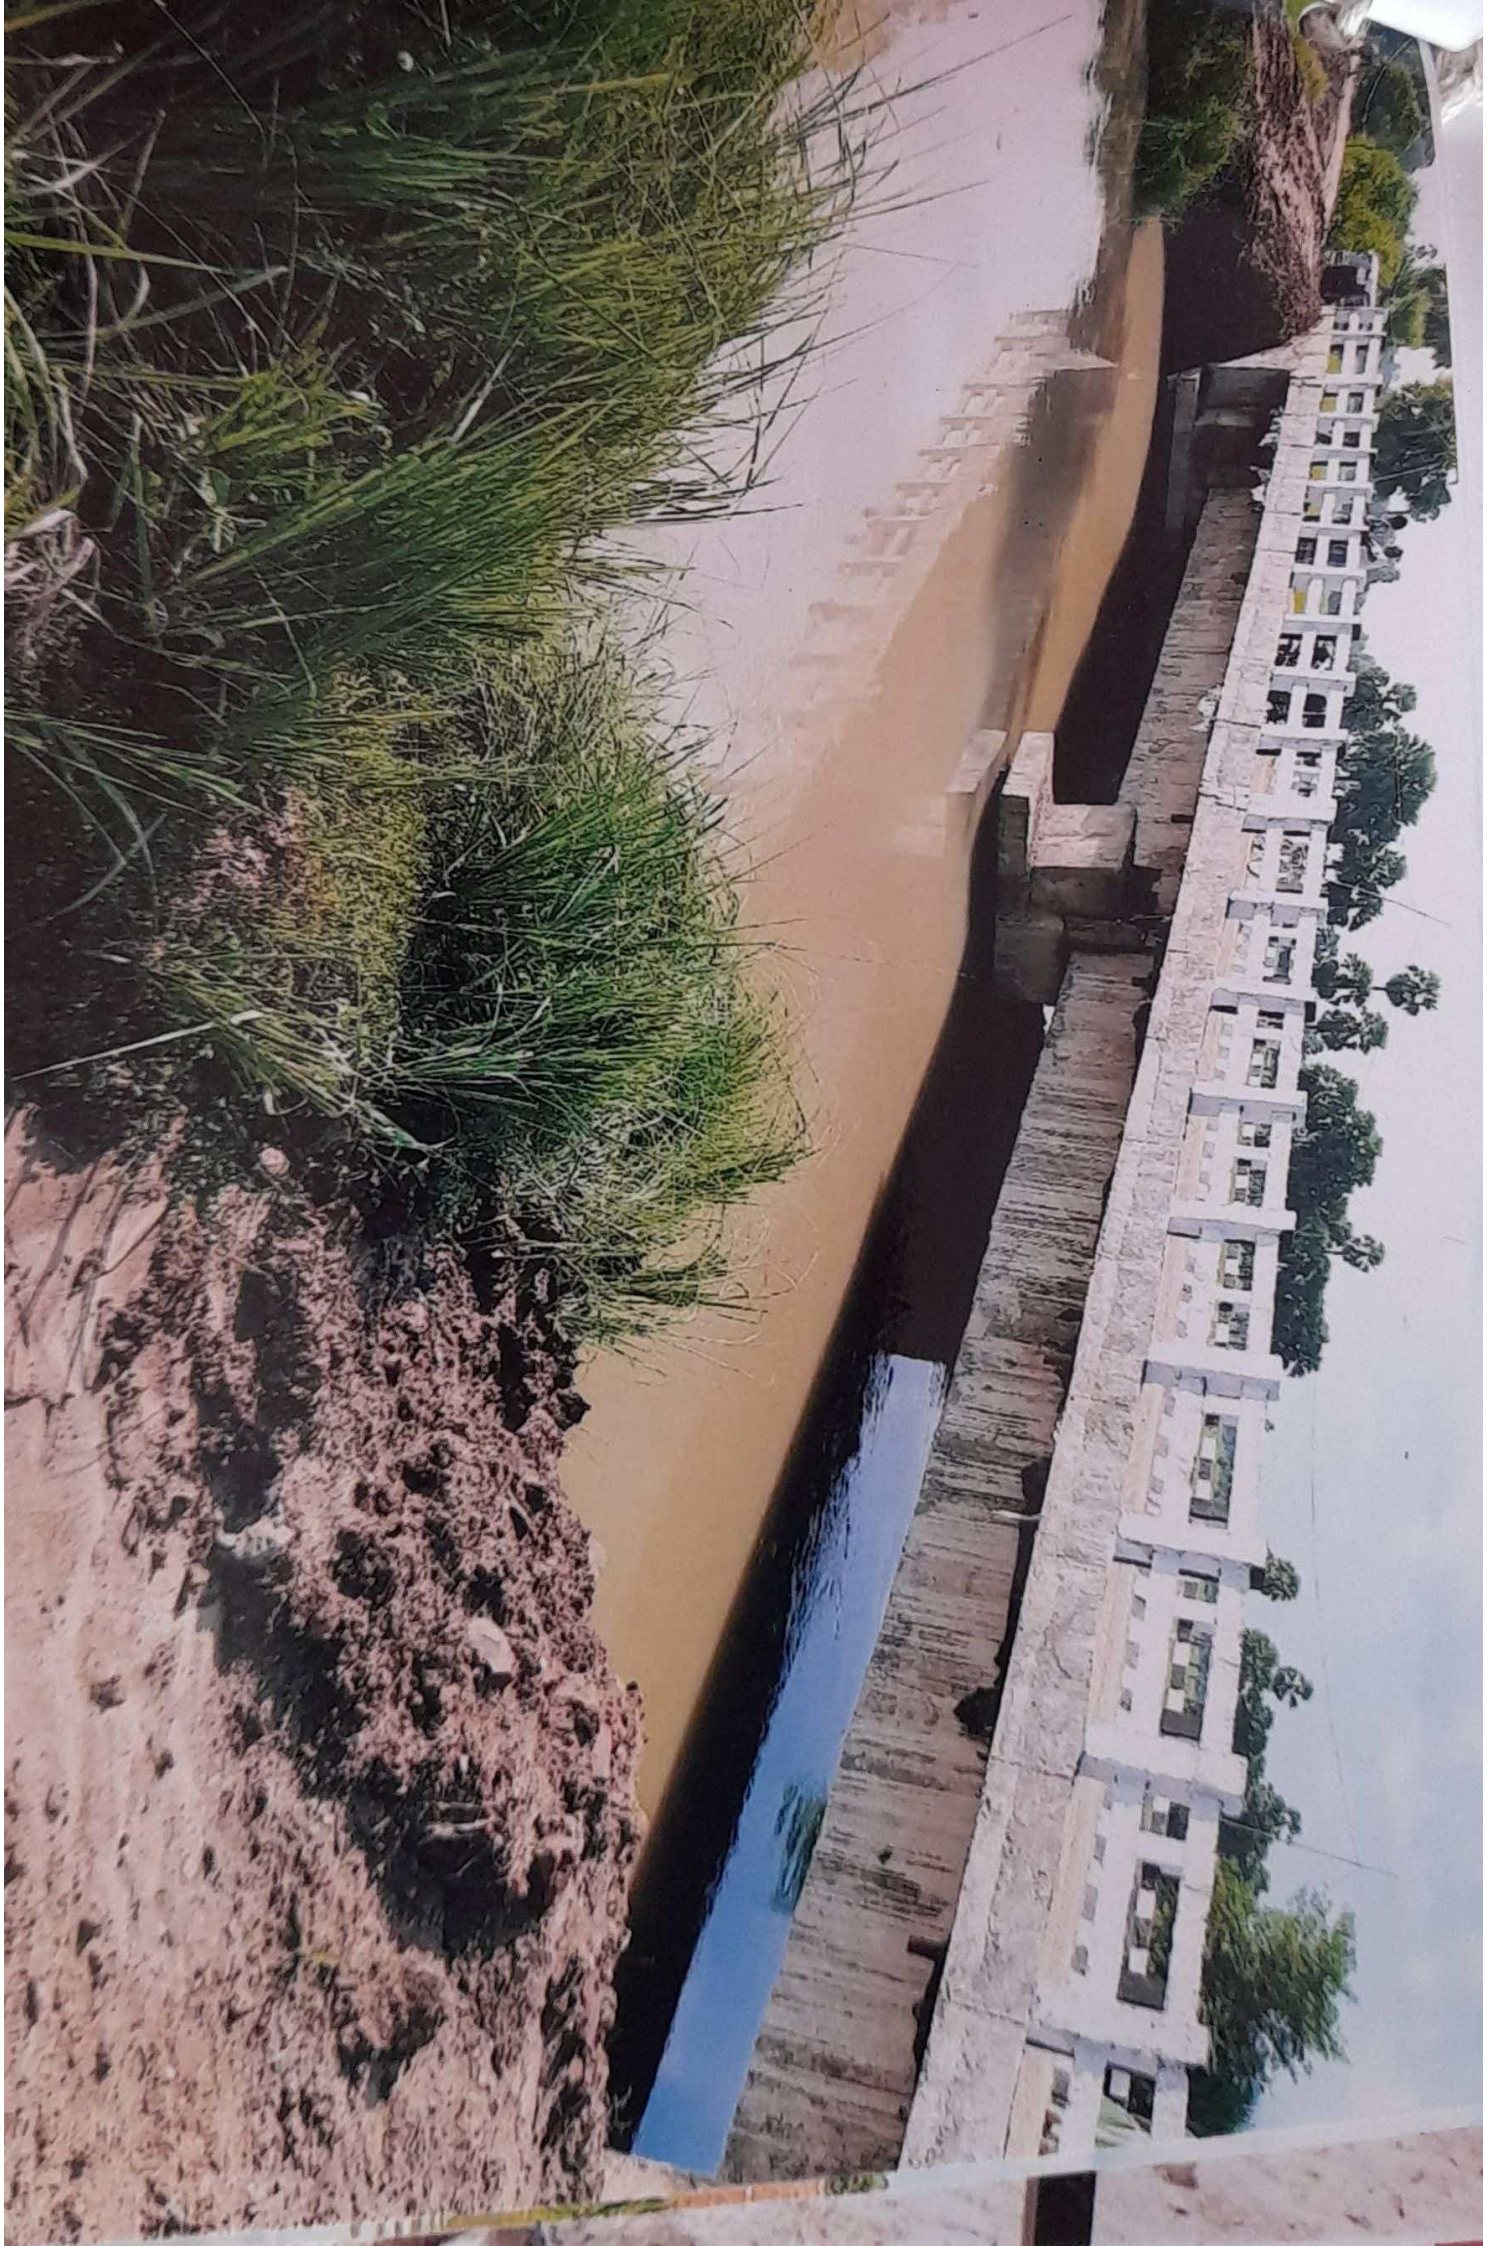

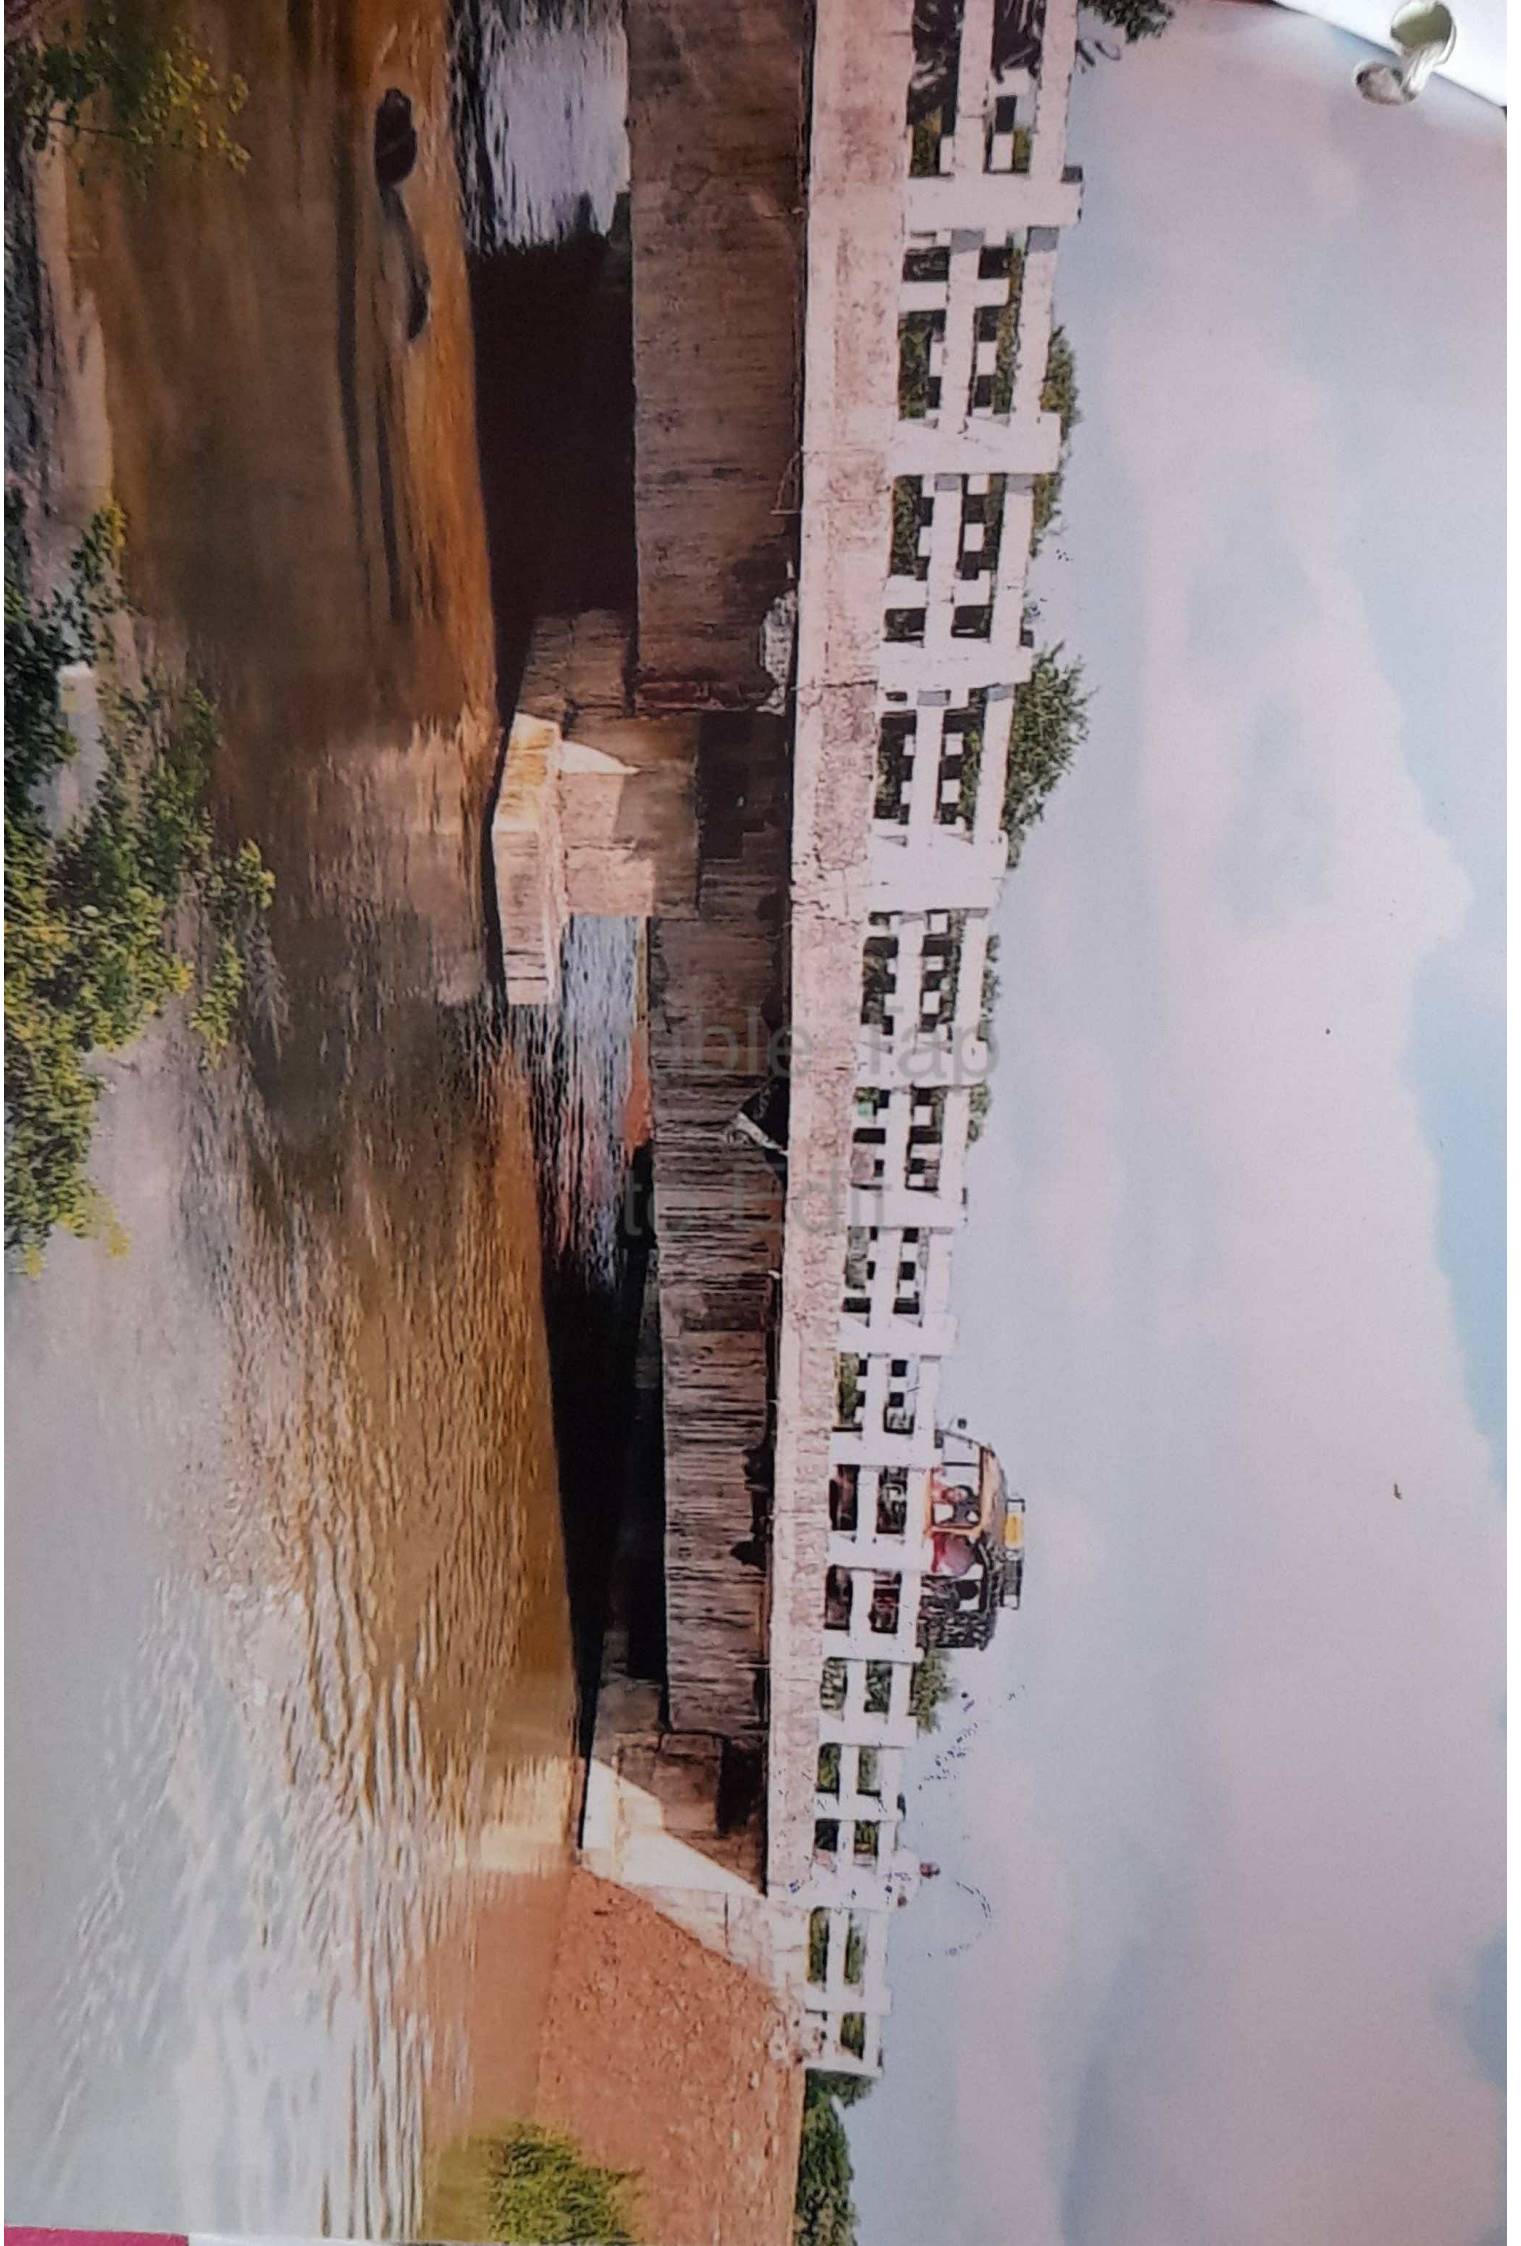

Latitude: 25.261765
Longitude: 85.438627
Elevation: 51.13±92 m
Accuracy: 5.0 m
Time: 23-03-2021 12:28
Note: shashi nadi noorrai me Bara bigha se pandeychak path



शीर्ष योजना 4515 (नोवार्ड)

पथ का नाम: शाशी नदी नूर सराय में बारा बिगहा से पाँडे चक पथ

प्राक्कलित राशि: 1.75.69,882.00 लाख पैकेज सं: 07/580/2019-20

पाँच वर्षीय रख-रखाव की राशि: 1.17.820.00 लाख

कार्य प्रारंभ की तिथि: 27-06-2019 कार्य समाप्ति की तिथि: 26-06-2020

संवेदक का नाम: राकेश कुमार

कार्य एजेन्सी: कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल हस्नौर

Latitude: 25.261771

Longitude: 85.438624

Elevation: 37.467100 m

Accuracy: 5.5 m

Time: 23-03-2021 12:30

Note: Shashi nadi noorsari me Bara bigha se pandeychak path

NABARD

R.W.D. WORKS DIVISION, HARNAUT (NALANDA)

NAME OF WORK: CONSTRUCTION & FIVE YEAR MAINTENANCE

"SHASHI RIVER IN NOORSARI BARA BIGHA TO

PANDEYCHAK ROAD (TENDER ID-73097)

UNDER STATE SCHEME (NABARD) YEAR-18-19

NAME OF AGENCY: RAKESH KUMAR DOIYA NALANDA (BID No: 331791)

AGREEMENT No: 07.80/2019-20

ACCEPTED RATE: 10.00% BELOW OF B.O.G. RATE

CONSTRUCTION COST: 1,75,67,889.00

MAINTENANCE COST: 1,17,820.00

AGREEMENT VALUE: 1,76,87,308.00

DATE OF AGREEMENT: 27-06-2019

INTENDED DATE OF COMPLETION: 28-06-2020

SUMMARY OF 5 YEAR MAINTENANCE COST

CONSTRUCTION OF HIGH LEVEL R.C.C. BRIDGE OVER SHASHI


RIVER IN NOORSARAI BARA PANDEYCHAK ROAD UNDER

NOORSARAI BLOCK NOORSARAI DISTRICT NALANDA

PARTICULARS	QUANTITY	UNIT	5 YEAR MAINTENANCE COST	
			RATE	AMOUNT IN RS.
1ST YEAR MAINTENANCE COST	0.200	KM	37065.00	7413
2ND YEAR MAINTENANCE COST	0.200	KM	58470.00	11698
3RD YEAR MAINTENANCE COST	0.200	KM	124470.00	24892
4TH YEAR MAINTENANCE COST	0.200	KM	173625.00	35925
5TH YEAR MAINTENANCE COST	0.200	KM	254700.00	50952

GRAND TOTAL COST OF 5 YEAR MAINTENANCE COST 150910

Latitude: 25.261766
Longitude: 85.438737
Elevation: 34.08±106 m
Accuracy: 5.8 m
Time: 23-03-2021 12:31
Note: shashi nadi noor sai me Bara bigha se pandeychak

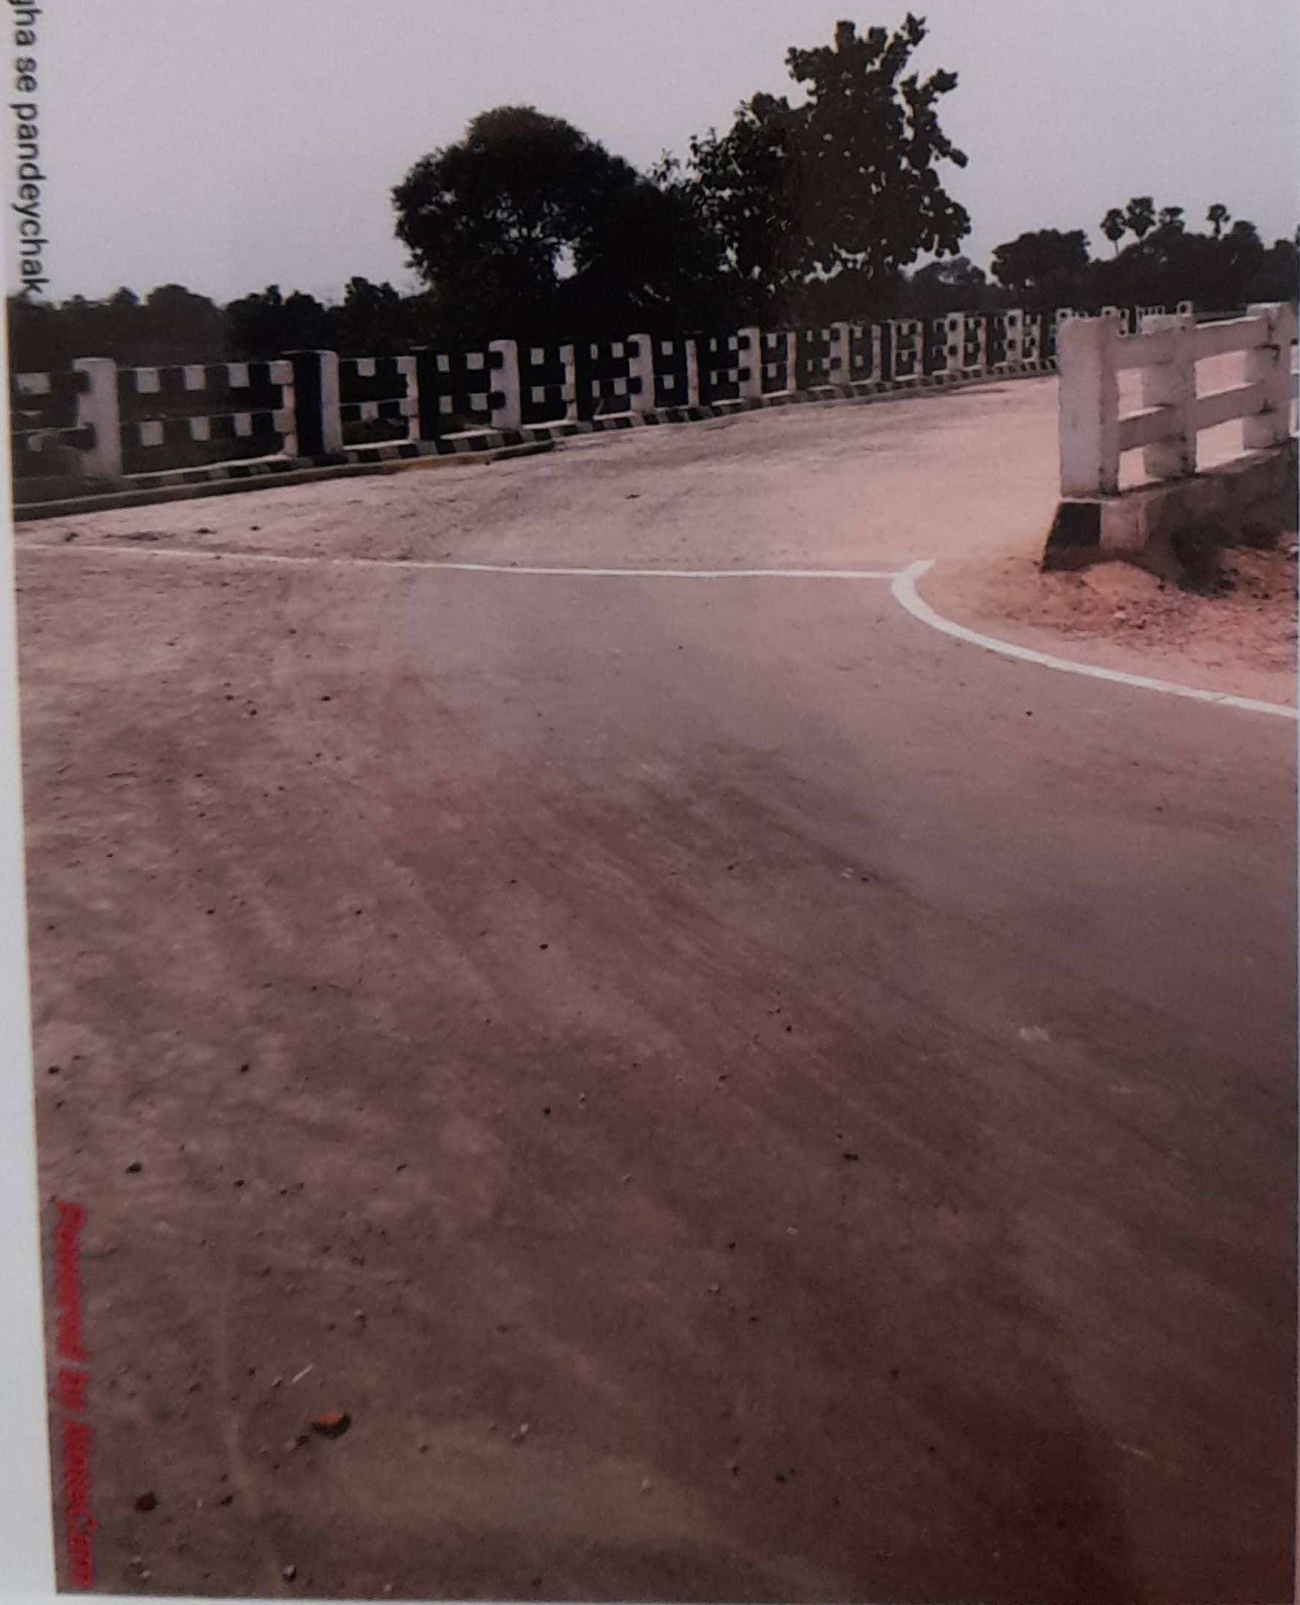

23/05/2021
OK

23-05-2021
OK

23-05-2021
OK
