

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 1196/432

हरनौत,

दिनांक 27/7/2021

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- शीर्ष-नबार्ड योजनान्तर्गत पचौरा NH-31 के खरूआरा ग्राम से गोसाई विगहा जाने वाली पथ में मुहाने नदी पर RCC पुल के निर्माण कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष-नबार्ड योजनान्तर्गत पचौरा NH-31 के खरूआरा ग्राम से गोसाई विगहा जाने वाली पथ में मुहाने नदी पर RCC पुल के निर्माण कार्य संवेदक श्री उदय सिंह, पता-गेट नं.-28 राजापुर, पो.-जी.पी.ओ. थाना-श्रीकृष्णापुरी (पटना) को आवंटित है। उक्त पथ की एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-14.11.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-13.11.2016 थी। परन्तु उक्त पथ में स्थानीय विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक-31.12.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-31.12.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु0-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 06 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।
- (4) संवेदक का पत्र 1 अदद।
- (5) Work Programme

विश्वासभाजक
27.07.2021

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

UDAY SINGH

Gate No- 28, Rajapur, Patna-800001
Govt. Contractor & General Order Suppliers

Ref:.....

Date: 15/7/2021

सौ. प्रो.

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य-प्रमण्डल, हरनौत
नालन्दा

विषय:- NH-31 के खरनआरा ग्राम से जो साई किंगदा जाने वाली पथ के
भुदाने नीचे पर RCC पुल के निर्माण कार्य के समयवृद्धि देने के
सम्बन्ध में। अम.नं. 70/UBD/2015-16

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि उपरोक्त कार्य में
94-96% तक कार्य कर चुका है, केवल पश्चिमी पहुँच पथ का
जमीन निजी होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था, परन्तु
फिलहाल अभी जून 2021 में दोनों भागों में सहमती हो जाने
के कारण निजी जमीन विभाग के हस्तांतरित हो चुका है, कि
कार्य को किया जा सकता है, वरिष्ठ पदाधीनकारी से भी रिक्त
वार्ता के बाद बचे हुआ कार्य को अस्मात् के बाद करने का रहा
जाया है।

असम्मान से नम्र निवेदन है कि बचे हुए कार्य को करने
के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक समयवृद्धि देने की रुपा
की जाय।

सहजानक:-

- ① समयवृद्धि का आवेदन-पत्र, भुल प्रति
- ② शपथ-पत्र की भुल प्रति
- ③ कार्य-प्रमाण का चरया-पत्र 6 अंश
- ④ work-programme.

विश्वासभाजन

Uday Singh



IT0000450586

100/-

संख्या

दिनांक


लेख्य प्रमाणक, सदर पटना

शपथ पत्र

मैं उदय सिंह बलद स्व० राणा प्रताप सिंह, पता- गेट नं०- 28, राजापुर, पो०- जी०पी०ओ०, थाना- श्रीकृष्णापुरी, जिला- पटना (बिहार) का रहने वाला हूँ, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह कि शीर्ष 4515, राज्य संपोषित योजनान्तर्गत ग्राम खरूआरा (एन०एच०- 31) से गोसाई बिगहा जाने वाली पथ में मुहाने नदी पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कर रहा हूँ।
2. यह कि कार्य का एकरारनामा संख्या- 70/ एस०बी०डी०/ 2015-16 दिनांक 14.11.2015 है तथा एकरारनामा की राशि रु० 23805468.00 है।
3. यह कि कार्य प्रशासनिक कारणों से विभाग द्वारा स्थगित रखा गया था।
4. यह कि दिनांक 14.10.2017 को तीसरी बार कार्यारम्भ करने का अदेश प्राप्त हुआ था।
5. यह कि कार्य स्थल पर निजी जमीन का विवाद एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बाधा के कारण विलम्ब हुआ।
6. यह कि प्राक्कलन का पुनरीक्षित होने के कारण विलम्ब हुआ।
7. यह कि पुल के पश्चिमी पहुँच पथ की निजी जमीन अभी फिलहाल दिनांक 03.06.2021 को सहायक अभियंता श्री मुकेश कुमार ने मोबाईल द्वारा मुझे सूचित किया कि निजी जमीन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है एवं मुझे पश्चिमी पहुँच पथ में कार्य करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के द्वारा लिखित रूप से दिया गया है।
8. यह कि फिलहाल मौनसून के कारण नदी में पानी भरा हुआ है, इसलिए दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक समय वृद्धि दिया जाय।
9. यह कि इस समय वृद्धि की स्वीकृति के उपरान्त भविष्य में एकरारनामा के शर्तों के विरुद्ध कोई वित्तीय दावा नहीं करूँगा।

10. यह कि उपर लिखी सारी बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है।



on/Smt. Uday Singh
who is identified by Advocate
Advocate Solemnly affirmed
declared before me

DHARMIVR PD
Govt. of India


Uday Singh
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identify the deponent's Signature
L.T.I. who has/have affirmed in
My Presence
Advocate

CHIEF

IT 00000450586

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

05-JUL-2021 09:14:02

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT, PATNA


e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0506G2111J275

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 95

(Rupees Ninety-Five Only)



BRCT0506G2111J275



BIHAR COURT FEE
BRCT0246410G2113M
02-JUL-2021

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shc details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

GOVT. OF BIHAR

TENTATIVE WORK PROGRAMME

Name of Work :- C/o High Level RCC Bridge over Muhane River NH-31 Kharu Village Gosaibigha Road,
Harnaut, Nalanda

Agreement No.- 70/SBD/2015-16

BAR CHART

Sl. No.	Particulars	June. 2021	July. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Oct. 2021	Nov. 2021	Dec. 2021
1	Approach Road GSB, WBM Gr.- II & III							
2	Premix Carpeting							
3	Protection work of Boulder Apron Pitching etc.							

Yours

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक:- 11/प्र0-04-395/2019 1008

पटना, दिनांक:- 24/2/2020

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय-शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत खरूआरा (एन0एच0-31) से गोसाई विगहा जाने वाली पथ में मोहाने नदी पर 2x18.75 मीटर आकार का पुल निर्माण कार्य के समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग-आपका पत्रांक 225 अनु0 दिनांक 13.02.2020

महाशय,

प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन खरूआरा (एन0एच0-31) से गोसाई विगहा जाने वाली पथ में मोहाने नदी पर 2x18.75 मीटर आकार का पुल निर्माण कार्य जिसकी एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 14.11.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 13.11.2016 निर्धारित थी। लेकिन संवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य को दिनांक-15.04.2020 को पूर्ण कर लिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता नालन्दा अपने पत्रांक-225 अनु0, दिनांक-13.02.2020 द्वारा समयवृद्धि प्रदान करने का अनुशंसा किया गया है। संवेदक द्वारा कार्य को समय पर पूरा नहीं करने के निम्नलिखित कारण क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा बतलाते हुए अतिरिक्त समय देने की अनुशंसा की गई है:-

(i) कार्य स्थल पर पश्चिमी पहुँच पथ की जमीन निजी होने एवं दो भाइयों के विवाद होने के कारण।

आपके एवं कार्यपालक अभियंता, के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समय वृद्धि कार्य समाप्ति की तिथि 15.04.2020 तक वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, हरनौत की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी की वे सुनिश्चित करें की कार्य मानक एवं एकरारनामा के अनुसार हुआ है।

1. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें की मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल द्वारा कोई भी प्रतिकूल जॉच प्रतिवेदन अंकित नहीं की गई है एवं अगर की गई है तो उसका अनुपालन कर लिया गया है इस योजना से संबंधित कोई भी ए0टी0आर0 (ATR) लंबित नहीं है।
2. उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत अपना प्रतिवेदन आपको समर्पित करेंगे एवं आप उनके स्थल निरीक्षण के पश्चात् पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को भेजेगे। अतः इसका अनुश्रवण व्यक्तिगत रूप से करें।
3. समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि भविष्य में किसी भी मद का प्राइस इसकालेशन (Price Escalation) एवं अन्य कोई भी अतिरिक्त दावा संवेदक का मान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।



राज्य योजनान्तर्गत शीर्ष - नार्बाड

सड़क का नाम - हरनौत प्रखंड अन्तर्गत N.H.-31 से (खरकपुरा) ग्राम से गोसाईं विगहा
जाने वाली पथ में मुहाने नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण

पुल का लम्बाई - 38.72 मी.

आ. राशि - 239.90 लाख

5 साल तक रख-रखाव की राशि -

कार्य प्रारम्भ की तिथि - 14.11.2013

कार्य समाप्ति की तिथि - 13.11.2016

संवेदक का नाम - उदय सिंह

कार्यकारी एजेन्सी - कार्य. अभि. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत
ग्रामाण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित

अन्तर्गत अन्तर्गत - NH-31 २०२०-२०२१ वित्त वर्ष के लिए
 विवरण के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत - अन्तर्गत
 के (२०१८-१९) अन्तर्गत विवरण के अनुसार
 अन्तर्गत - १० | २०१५-१६

११/१२/२०२१
 अन्तर्गत
 १२-१-२१
 अन्तर्गत

बिहार सरकार




राज्य योजनान्तर्गत शीर्ष-नार्बड

जिला - नालन्दा

प्रखंड - हरनौत

सड़क का नाम - हरनौत प्रखंड अन्तर्गत N.H.- 31 के (सरुआरा) ग्राम से मोसाई बिगहा जाने वाली पथ में मुहाने नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण
पहुँच पथ की लम्बाई - 0.600 कि.मी.
पुल की लम्बाई - 2x18.75 मीटर

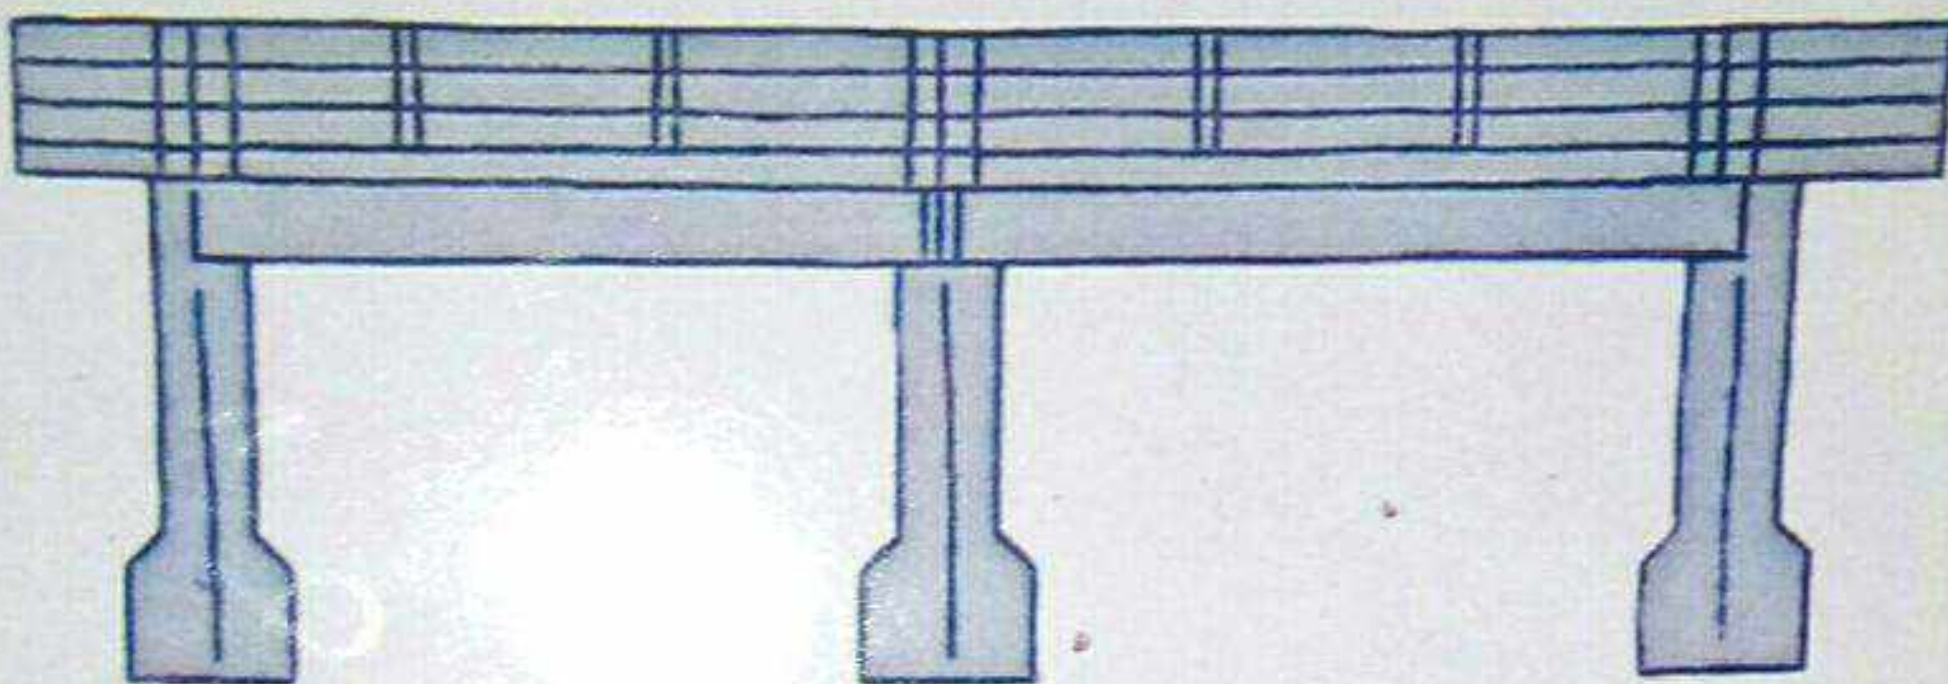

पुल का खंडवार विवरण

पहुँच पथ के पेवमेंट का विवरण

1. बंधन का मिट्टी कार्य 4863.3 घन मी. (द्रुक के समतुल्य)

पानी हाल कर रौलर से दबाया हुआ।

2. दलनेदार उप आधार 1215.82 घन मी. (द्रुक के समतुल्य)

पानी हाल कर रौलर से दबाया हुआ।

मुरम 192 घन मी. (द्रुक के समतुल्य)

मिट्टी का तटी की रेस (सेक्स) 86 घन मी. (द्रुक के समतुल्य)

परधर का चूरा 150 घन मी. (द्रुक के समतुल्य)

3. मिट्टीकृत परत या 2 परतों में डबलू.बी.एम. (प्रत्येक परत 7.5 से.मी. मोटी)

202.5 घन मी. प्रत्येक परत अलग अलग निर्मित की जायेगी

मिट्टी 405 घन मी. (द्रुक के समतुल्य)

परधर का चूरा/मुरम 45 घन मी. (द्रुक के समतुल्य)

मिट्टी सुकी मिट्टी रौलर से दबाई जायेगी, परधर का चूरा वा मुरम डबलू.बी.एम. जायेगी, पुनः रौलर से दबाई जायेगी, पानी हाल कर रौलर से दबाई जायेगी।

डबलू.बी.एम. परत

डबलू.बी.एम. 1485

डबलू.बी.एम. 495

पुल के निर्माण कार्य 20 मि.मी. मोटी में पुल निर्माण

(द्रुक के समतुल्य)

कुल 5.296 Mt.


(द्रुक के समतुल्य)

नोट: उपरोक्त कार्य निर्माण के बाद पुल के चारों ओर डबलू.बी.एम. परत डाली जायेगी।

[illegible]


$$\frac{91712021}{7.3.}$$

$$\frac{12-7-21}{Ar}$$

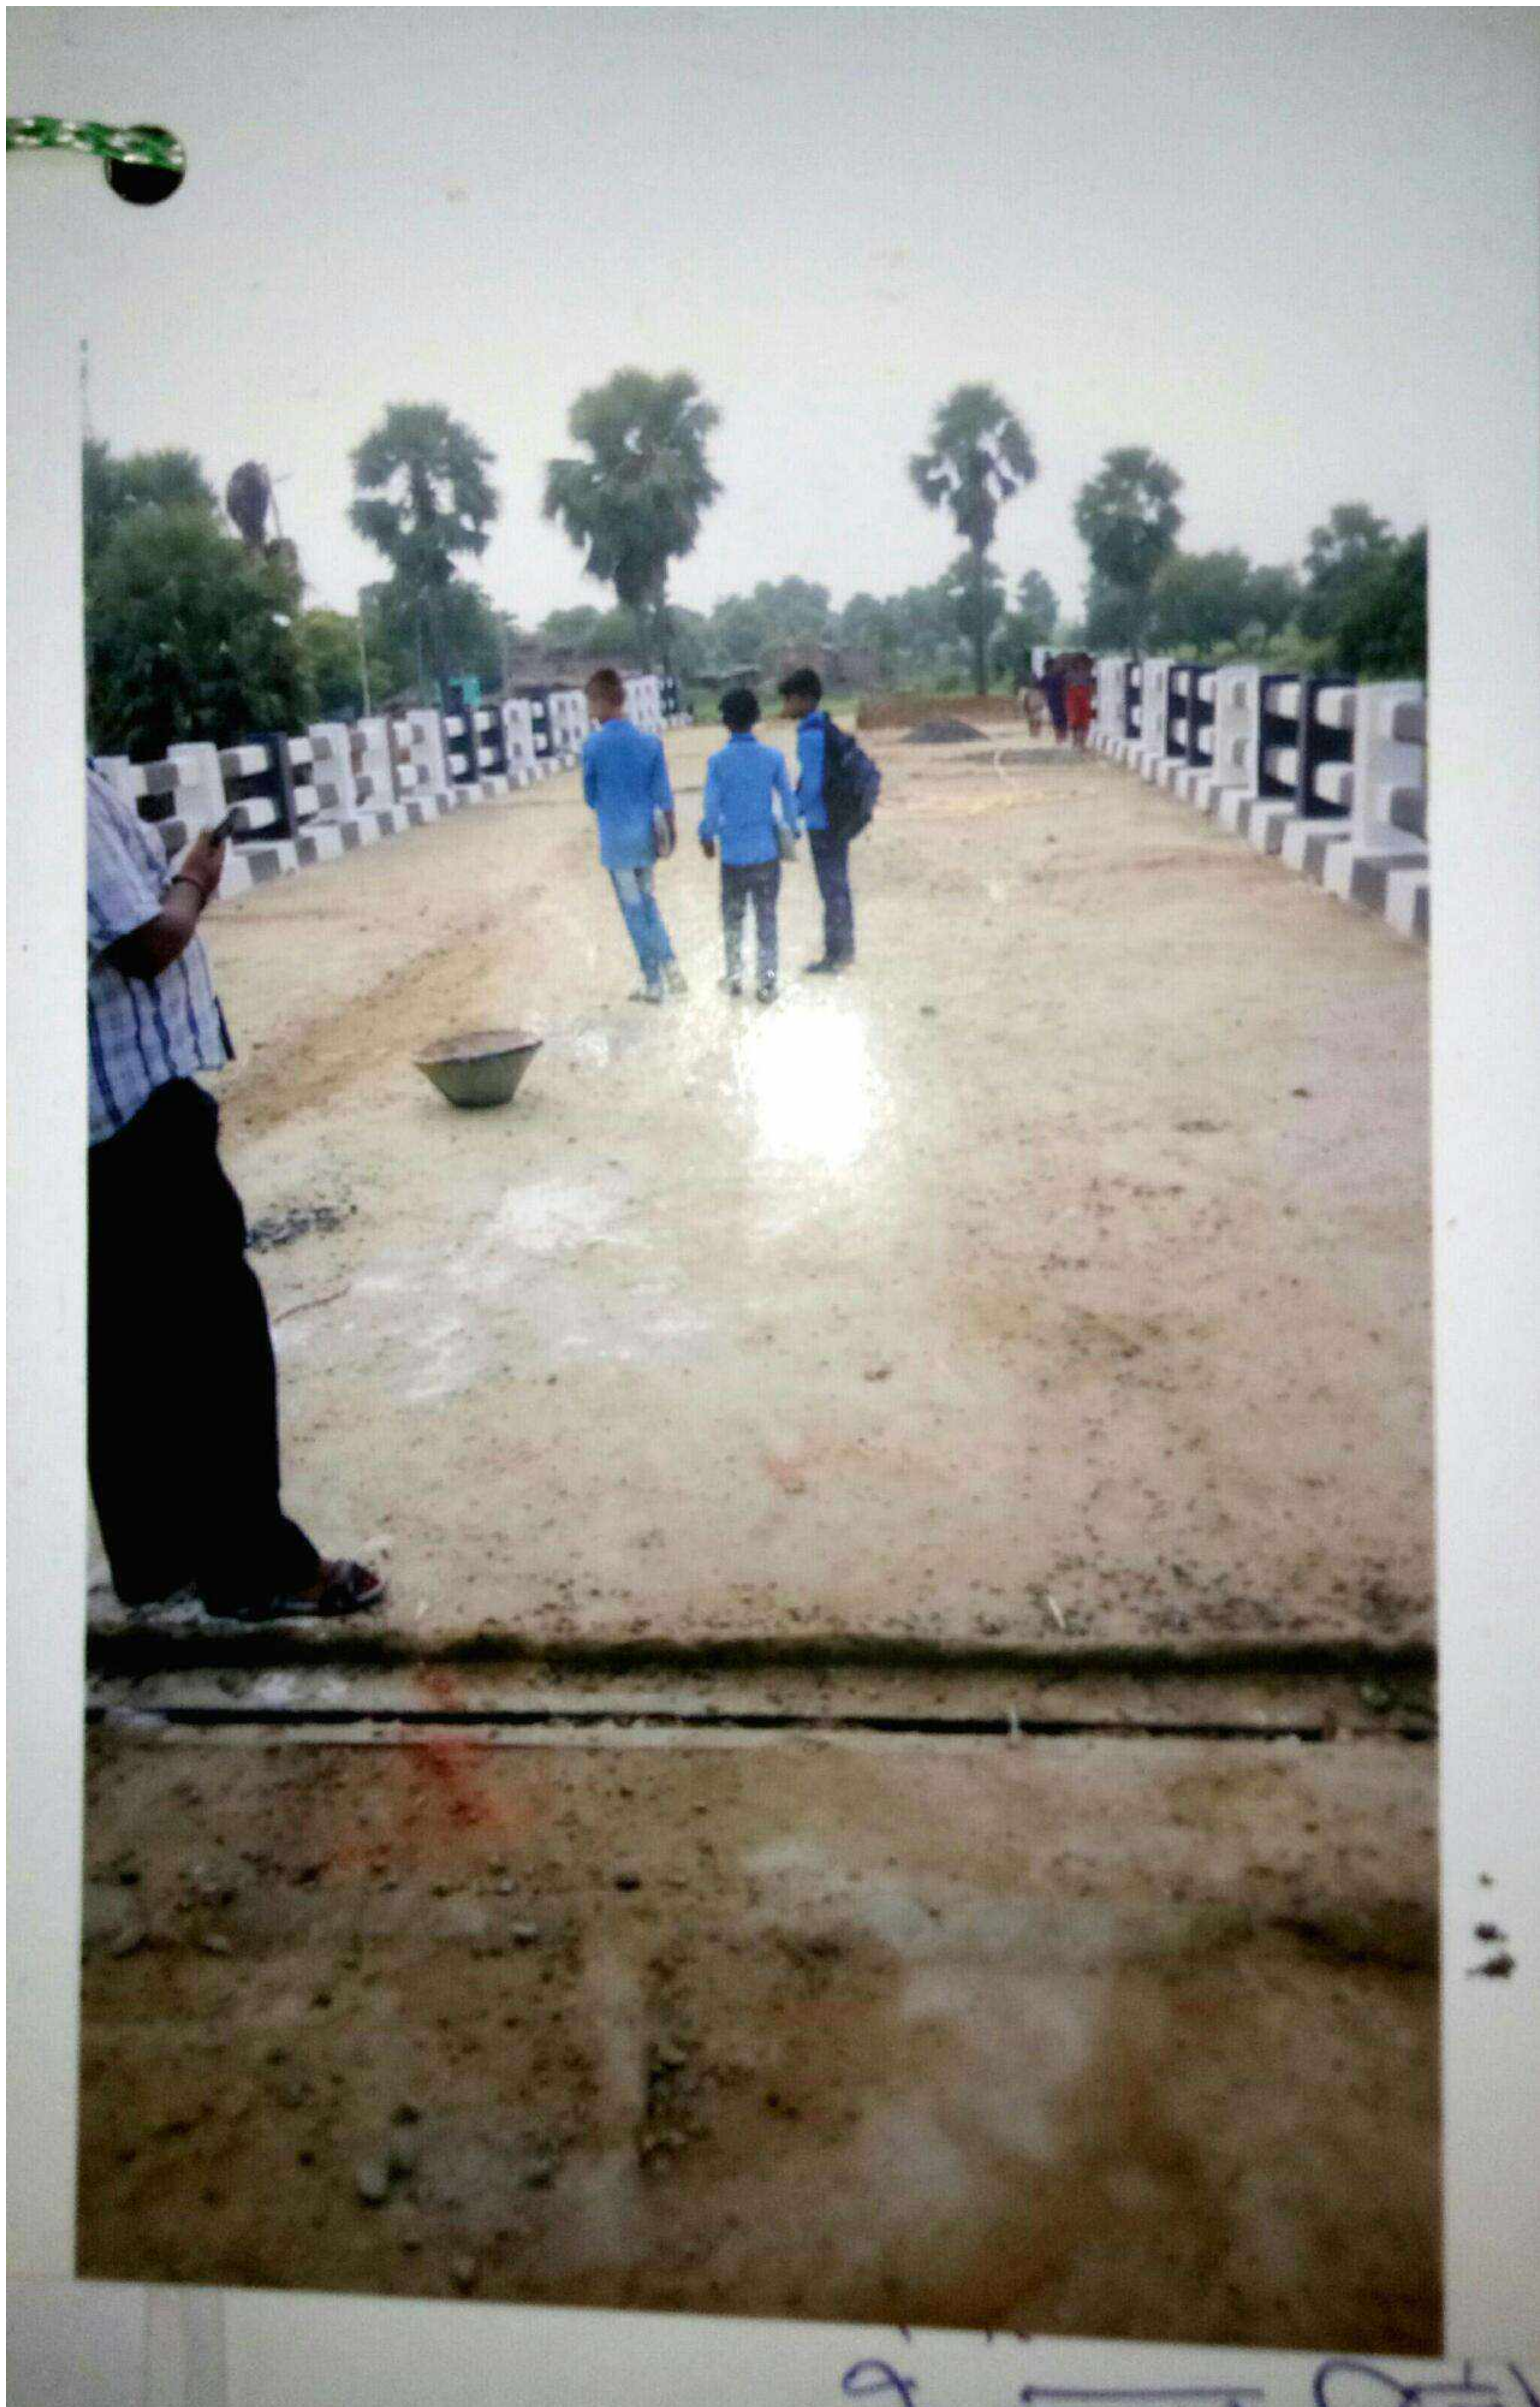

महाराष्ट्र-गिरा:- KPH-31 के राजस्थान 21 गीतों के गीतकार (किशोर)
जैसे गीतों पर मैं मुझे नहीं पता पर 400
(2018.75 मते.) मुझे का (निकाल कर)।
KPH. K. - 70/5BD/2015-16

9/12/2021
11/12/2021

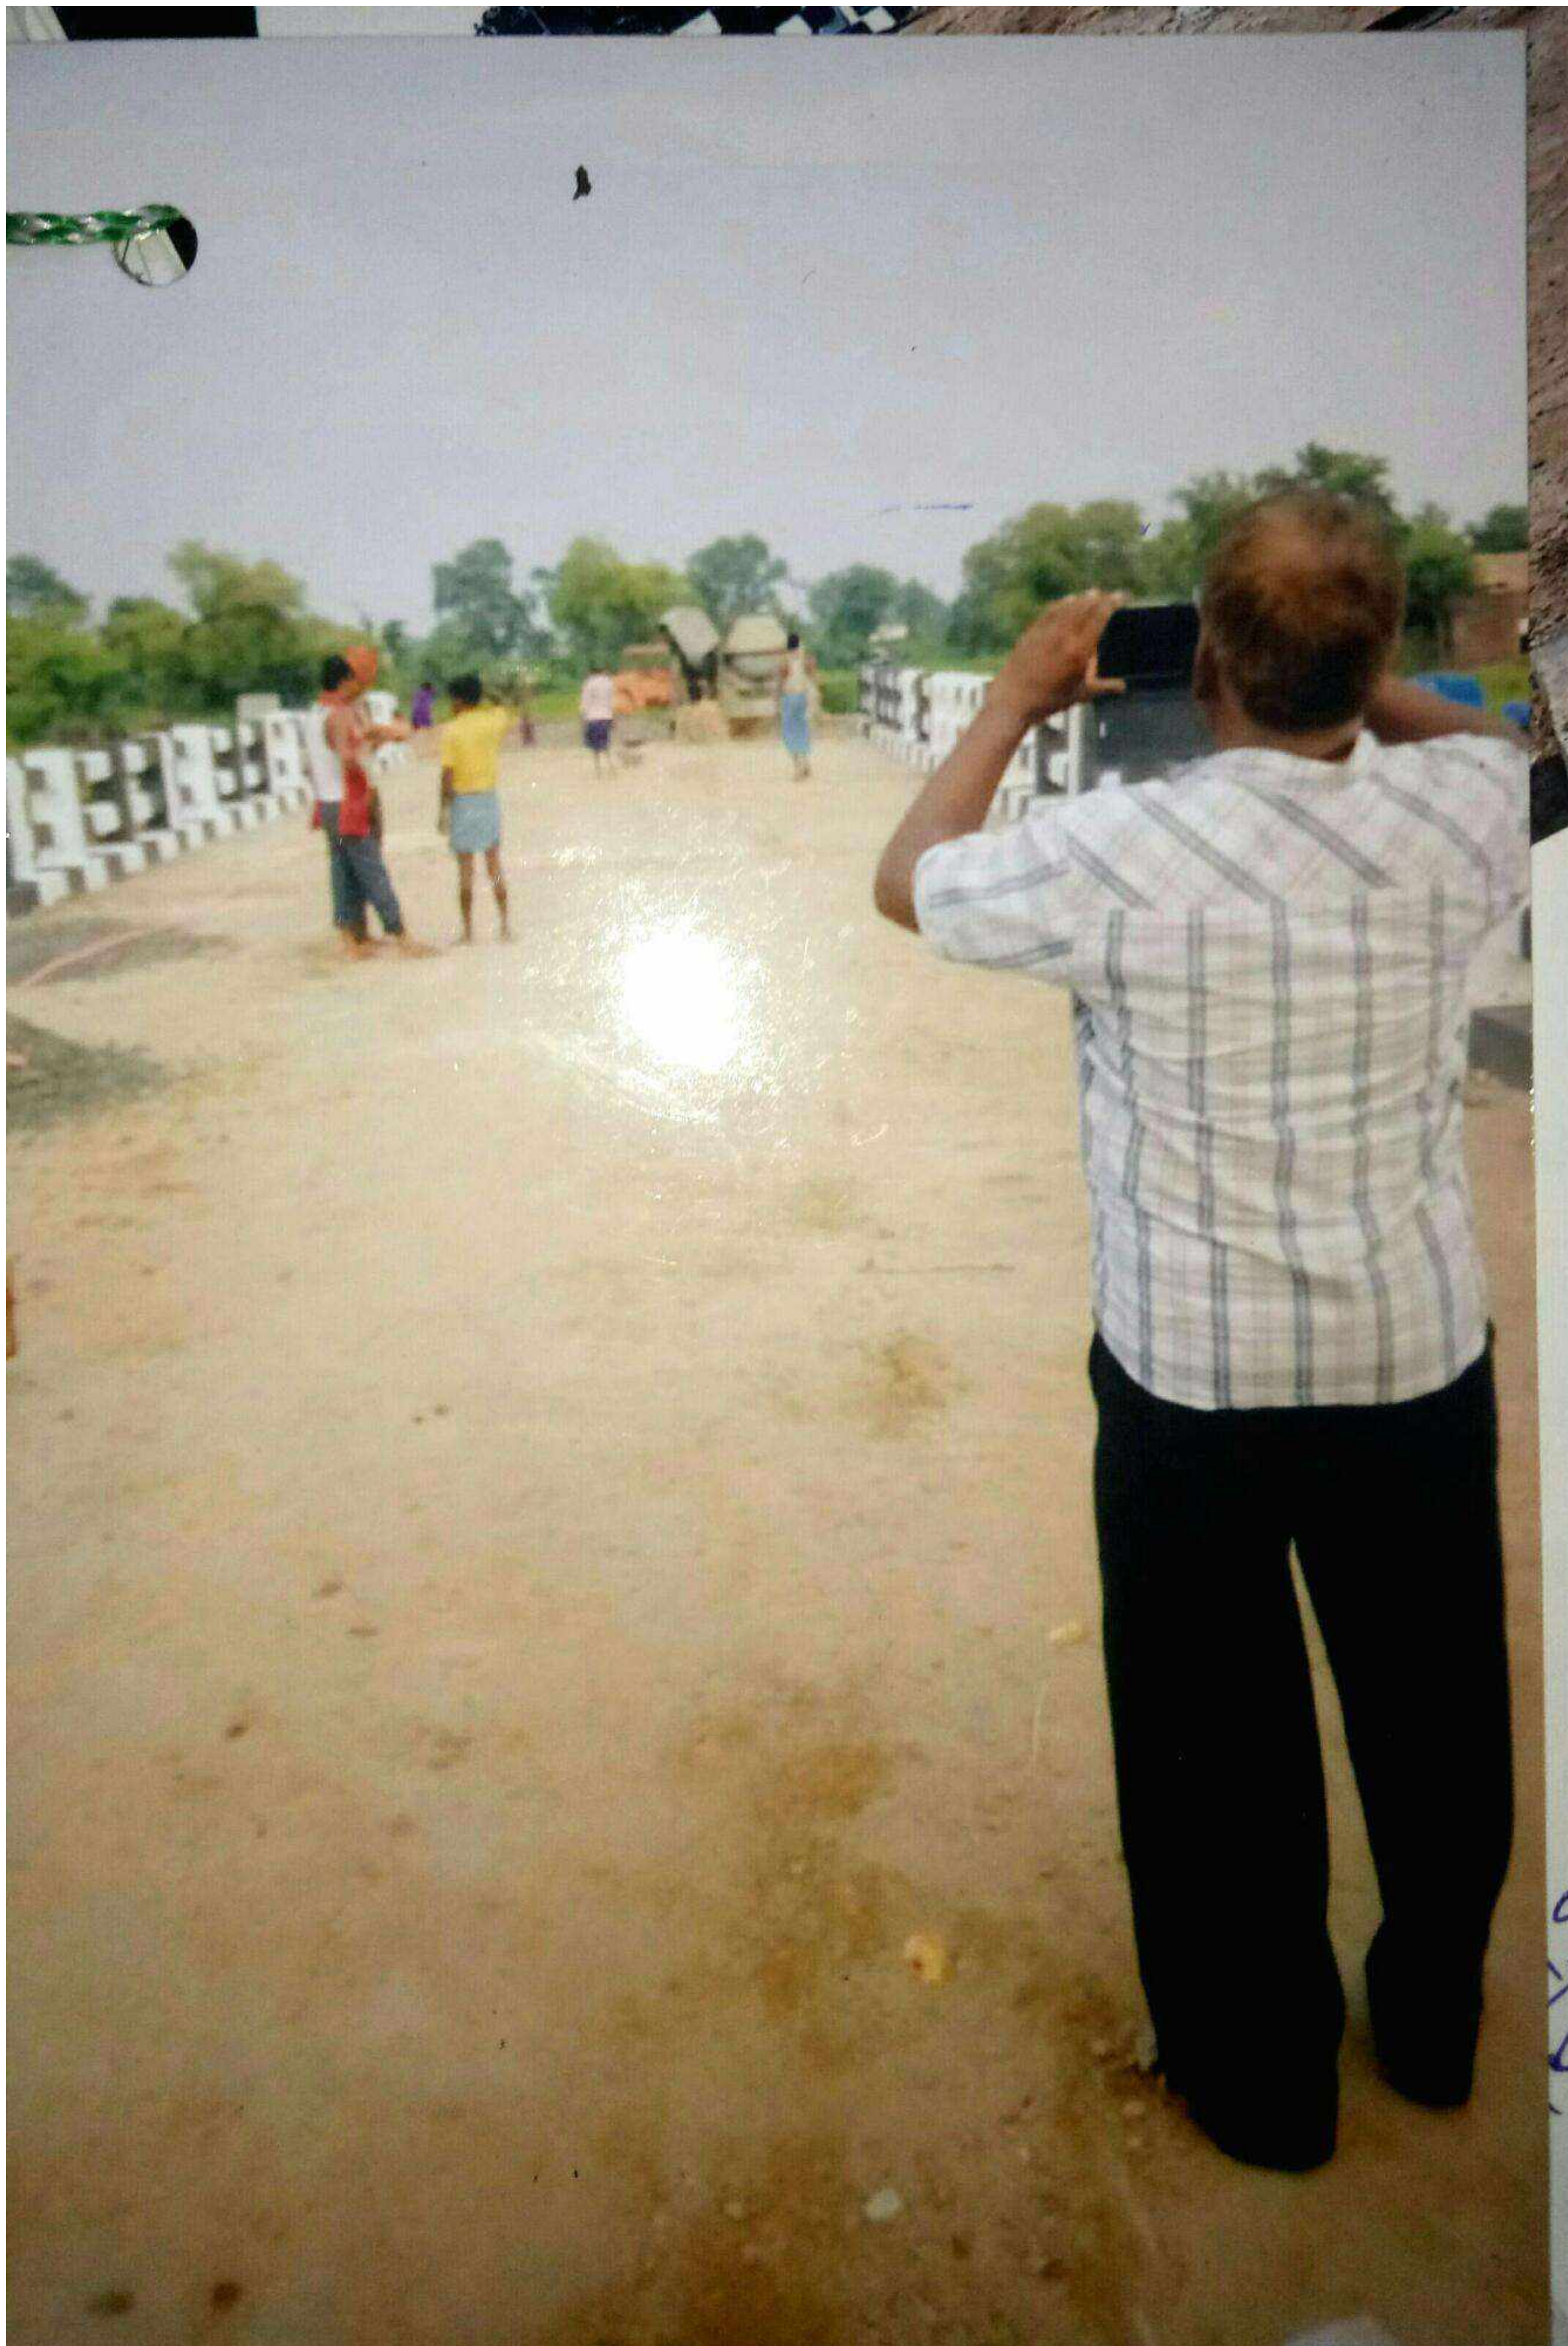

20/6/19

18th. Feb. - 70/537 / 2015-16



12


मार्क का नाम :- 111-31 के 292-312, 311 के 512-513 के
आवृत्ति का नाम के मुहाने मछि घर RCR
(2-18.75 mtr.) कुल आवृत्ति का नाम
Agth. No. - 70/SBD/2015-16

)

12/12/2021
3-1

12-7-21
11/11

6/12/19
12

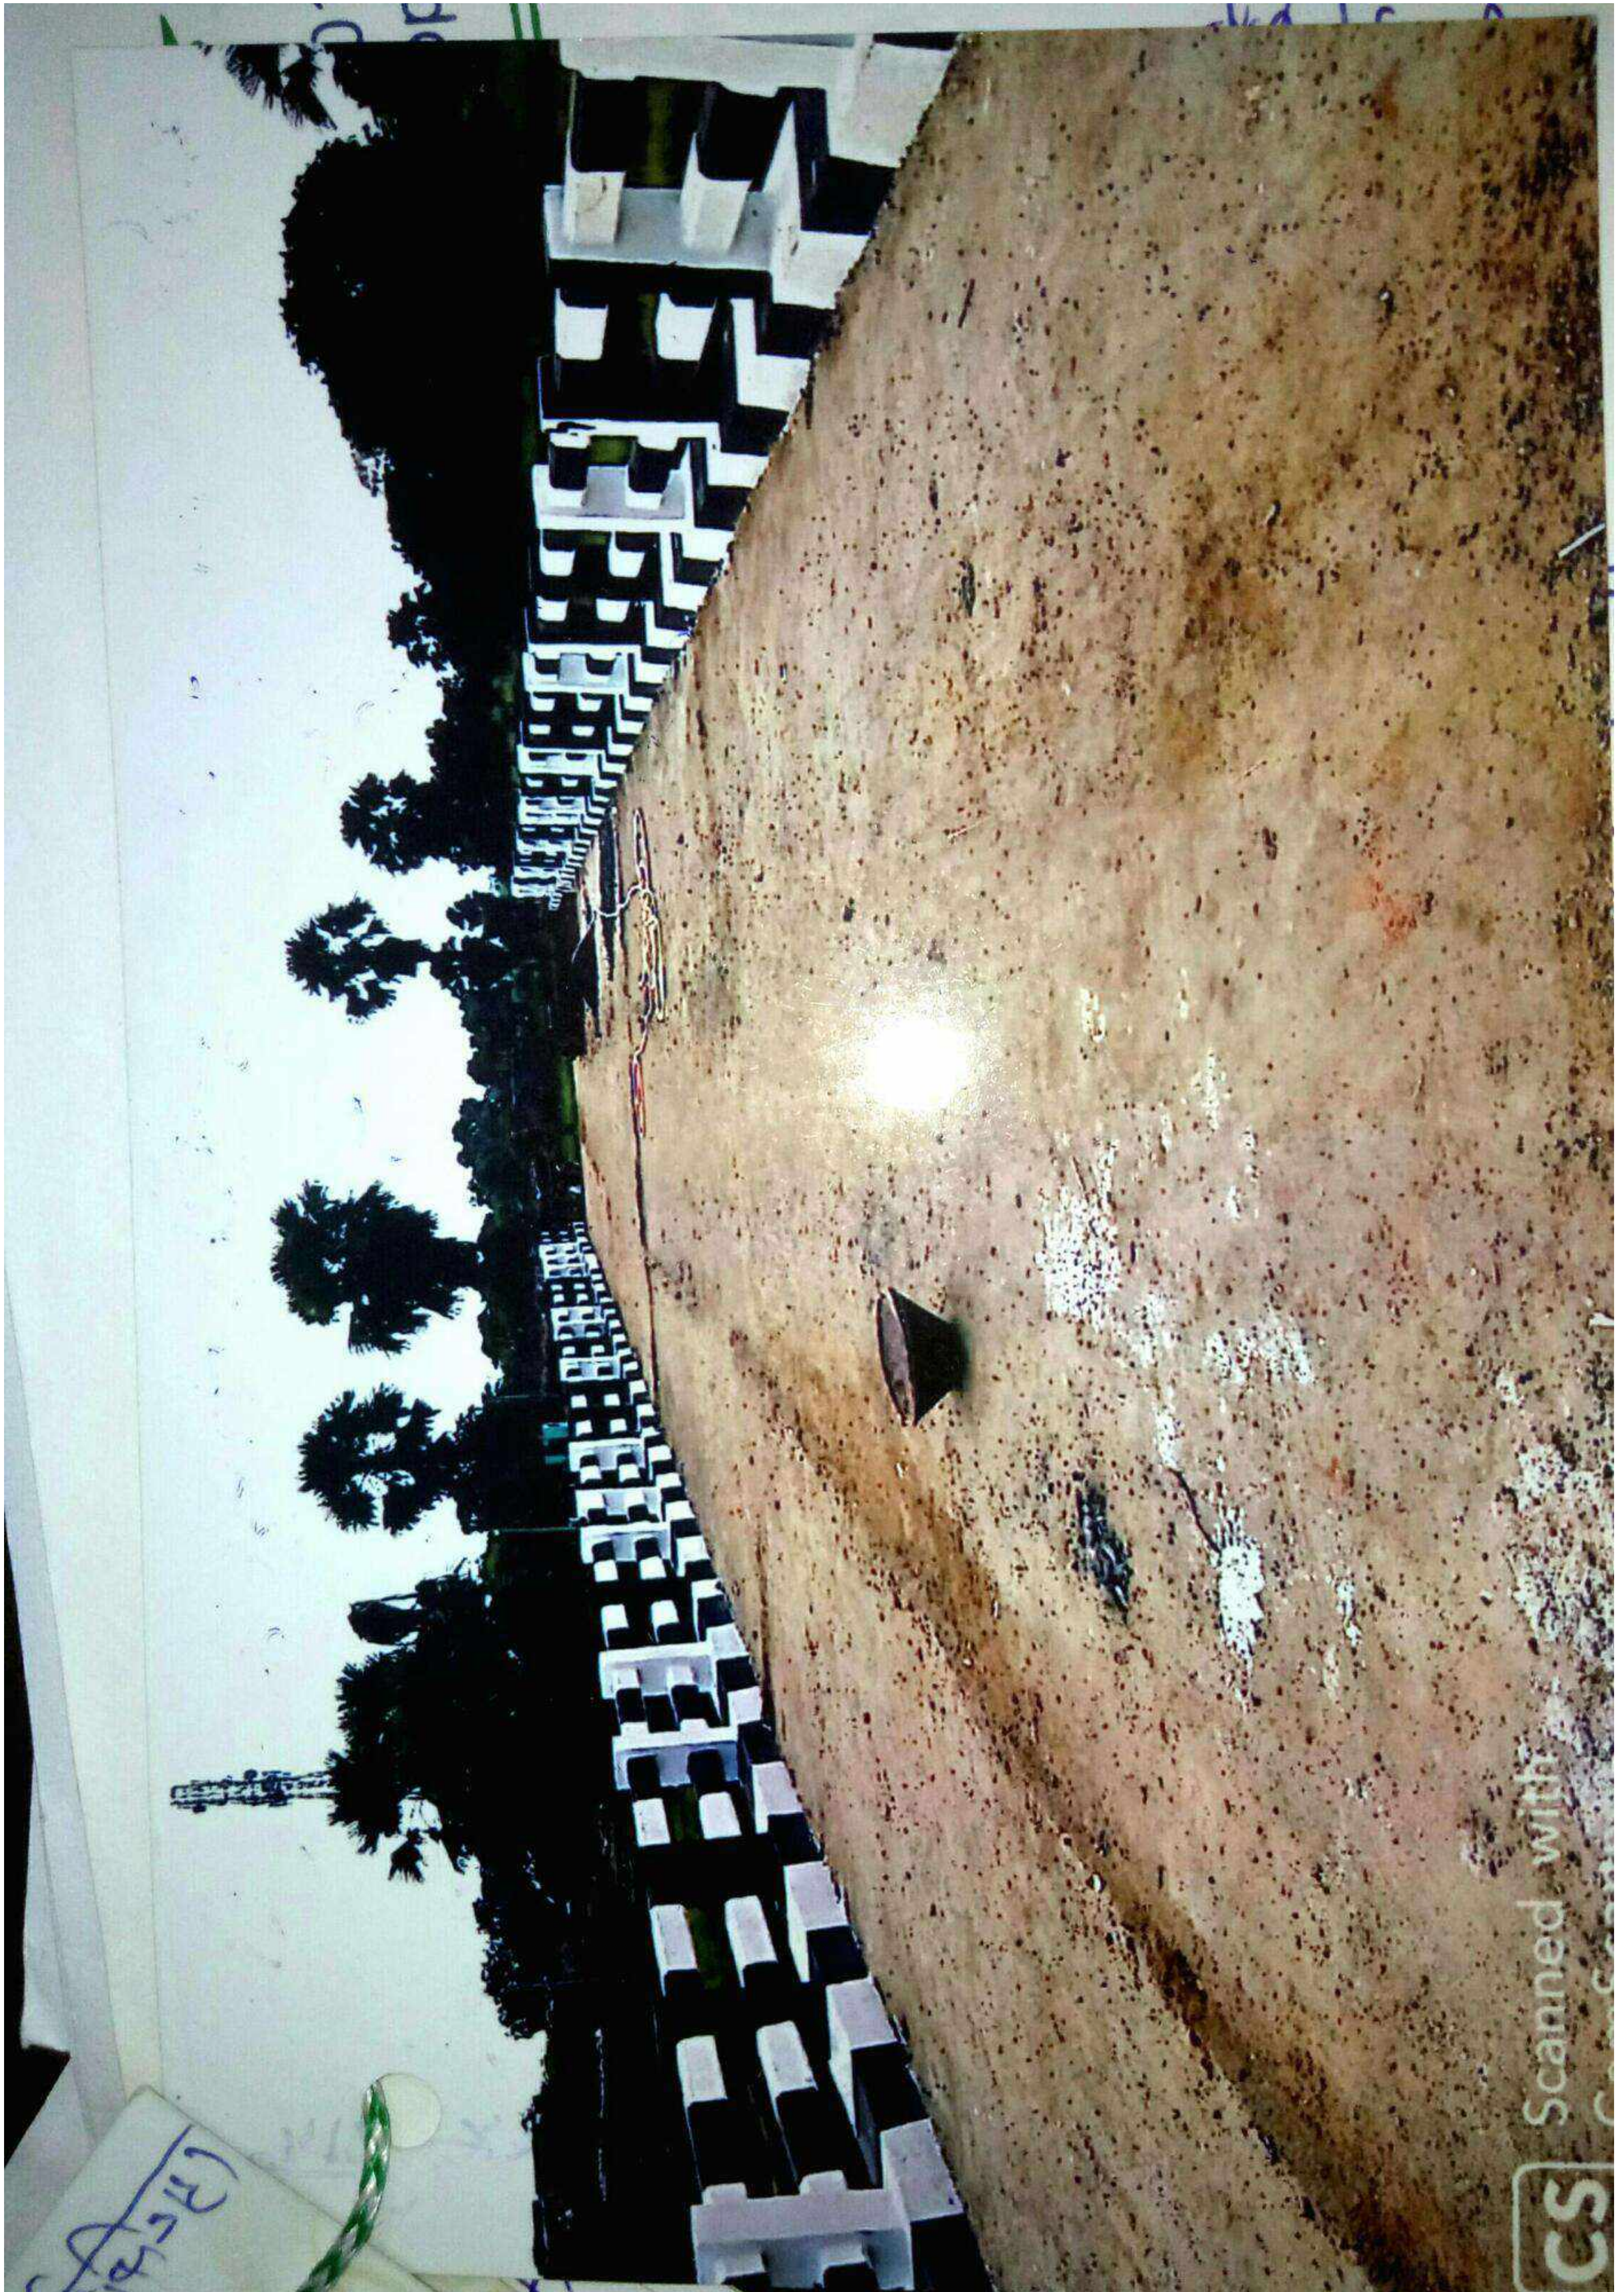

3125 का - 100 :- 711-31 292-34121 2112 2-115-
 किताबें, जहाँ बालों पर 292-34121 2112 2-115-
 RCC (2018.75 mtr.) 292-34121 2112 2-115-
 Agt. No. 70/2BD/2015-16

✓

2-1
12-7-21

2-1
12-7-21

2-1
12-7-21

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of Contractor:- UDAY SINGH
2. Name of Work:- Const. of High Level RCC Bridge over Mitane River on Road from NH-31 (Kharuara) to village Gadal - bighe Road.
3. Agreement No. & Date:- 70/SBD/2015-16
4. Agreement Value:- 238054682.00
5. Date Of Commencement:- 14/11/2015
6. Date of Completion:- 13/11/2016
7. Actual Date Of Completion:-
8. Extension On Previously Given On:- 15/4/2020
9. Extension Applied For:- 31/12/2021
10. Reason For Hindrance:- कार्य स्थल पर पानी की परेशानी पहुँचा गया की जमीन निजी होने लगे होने आइये के बिना के कारण बिलम्ब हुआ, फिलहाल समस्या है जारी है।
11. Percentage Of Work Done:- 94% (Ninety four percent)
12. Recommendation BY The J.E. :- कार्य स्थल पर पानी की समस्या के चलते समय पर पूर्ण नहीं हो पाया। अब यदि उपलब्ध हो गया है अतः समय सीमा दी जा सकती है।
NCS
12-7-21
13. Recommendation By The S.D.O. :-
7/7/2021
J.E.
Harshat.
14. Recommendation By The Executive Engineer:-
27.07.2021
15. Recommendation BY The S.E. :-
16. Final Order Of The C.E. :-

Uday Singh
Signature of the Contractor
