

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

पत्रांक.....2247 अनु. / दिनांक 16.10.2020
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय :- **MMGSY योजनान्तर्गत L 026 to Mahmood Nagar पथ निर्माण कार्य के समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग:- भवदीय ज्ञापांक 1348 अनु0 दिनांक 28.08.2020
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा के क्रम में कार्य विलम्ब के साक्ष्य के रूप में संबंधित अंचलाधिकारी का पत्र, MIS की प्रति, संवेदक का एकरारनामा समाप्ति के पूर्व की तिथि का समयवृद्धि हेतु आवेदन एवं Work Programme पर अधोहस्ताक्षरी का अनुशंसा सहित पुनः समयवृद्धि का आवेदन प्रपत्र में अनुशंसा एवं अन्य संलग्नको सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है। संवेदक द्वारा कार्य स्थल का फोटोग्राफ एवं समयवृद्धि की स्वीकृति के उपरान्त किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करने का शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है।

सादर।

अनु0-यथोक्त:-

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

16-10-2020

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल-मोतिहारी

समयवृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1	अभिकर्ता का नाम	M/S HONEST CONSTRUCTION COMPANY
2	कार्य का नाम	Near - Urdu Library Road, AMLA PATTI - LO 26 TO MAHMOOD NAGAR MOTIHARI
3	एकशरनामा संख्या	07 - SBD OF 2016-17
4	एकशरनामा अन्तर्गत कार्य का मूल्य (लाख में)	54,45,402=00
5	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :-	61.819
6	एकशरनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ	07-06-2016
7	एकशरनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	06-06-2017
8	और अधिक समय जो माँग की जा रही है।	30-12-2020
9	कार्य विलम्ब का कारण	जमीनी अतीशय एवं विवाद
10	तिथि एवं समय जिसमें कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ	17-11-2017
11	आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात	25% प्रशिक्षित
12	क्या पूर्व में समय वृद्धि की गई थी यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें।	No
13	पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी	M/S HONEST CONSTRUCTION COMPANY
14	अभिकर्ता का हस्ताक्षर	M. Jaffar Mahmood Managing Partner
15	अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति	GSB Work Completed.
16	कनीय अभियंता की अनुशंसा	Time extension may be grant due to land dispute and flood.
17	अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित	As per conversation with J.G. at that time delay in completion of work due to land dispute and flood, hence F.E may be granted.
18	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित अपने लिखावट में	कार्य एवं कर्म का स्थिति स्पष्ट है। अनु विलम्ब अवधि तक EOT दी जा रही है। 5/9/20
19	अधीक्षक अभियंता की अनुशंसा	अनुशंसा

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी

3310 दिनांक 01/01/20



मुजफ्फर महमूद
जिनके पहचानकर्ता

अधिवक्ता है।

आज मेरे समक्ष उपस्थित होकर इस शपथ

पत्र में उल्लिखित सभी बिन्दुओं को शपथ

लेकर पुष्टि करते हैं।

लेख्य प्रमाणक,
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण ।

शपथ-पत्र

मैं मुजफ्फर महमूद, पिता- स्व० महमुदुल अमीन, C/o- M/s Honest Construction Company, उम्र- 48 वर्ष, साकिन- अमलापट्टी, वार्ड नं०- 10, पो०+थाना- सदर मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण सच-सच शपथ करता हूँ कि:-

1. यह कि, मैं मुजफ्फर महमूद C/o- M/s Honest Construction Company, Motihari का Managing Partner हूँ।
 2. यह कि, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी द्वारा MMGSY योजना मद के अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी के अधीन, सड़क का नाम- एल026 से महमूद नगर का सड़क निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा संख्या- 07-SBD वर्ष 2016-17 और कार्य आरंभ करने की तिथि- 07.06.2016 और पूर्ण कराने की तिथि- 06.06.2017 थी।
 3. यह कि, उक्त कार्य को दिनांक- 30.12.2020 के अन्दर पूर्ण कर दिया जायेगा।
 4. यह कि, यदि इस कार्य की समय वृद्धि स्वीकृति दी जाती है तो मैं किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा (Price Escalation) नहीं करूँगा।
- यह कि, शपथ-पत्र की सारी बातें मेरी जानकारी में सही एवं दुरुस्त है।

अतः यह शपथ-पत्र है।

Muzaffer Mahmood.
शपथकर्ता

सत्यापन:- मैं मुजफ्फर महमूद पुनः सच-सच ब्यान करता हूँ कि उपर वर्णित सारी बातें मेरी जानकारी में सही एवं दुरुस्त है।

Muzaffer Mahmood.

पहचानकर्ता

शपथकर्ता

मदन प्रसाद

अधिवक्ता

01/01/20



GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

HS 0000136394



DATE & TIME :

20-JUN-2020 09:32:57

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

MOTHARI EAST CHAMPARAN

NAME OF LITIGANT :

MUZAFFAR MAHMOOD

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT2039F2023J020

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 100

(Rupees One Hundred Only)



BRCT2039F2023J020

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

**/S HONEST CONSTRUCTION COMPANY****(GOVT. CONTRACTOR & SUPPLIERS)**

Registration No:-2150663, Class-2, Dated 18.05.2015
URDU LIBRARY ROAD, AMLAPATTI, MOTIHARI- 845401
EAST CHAMPARAN (BIHAR)

Ref No:-

Date 17/4/2017

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, मोतिहारी ।

विषय- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत एल 026 से महमूदनगर पथ निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होने के सम्बंध में ।

महाराज,

निवेदन पूर्वक अनुरोध करते हुए कहना है कि पथ का नाम- एल 026 से महमूदनगर है, पथ निर्माण कार्य का जिम्मा विभाग द्वारा मुझे दिया गया है जिसका एकरारनामा दिनांक- 07.06.2016 को किया गया, और कार्य समाप्ति की तिथि- 06.06.2017 है । किन्तु पथ में अतिक्रमण और जमीनी विवाद के कारण कार्य ससमय पूर्ण हो पाये ऐसा प्रतीत नहीं लगता है । जबकि उक्त पथ का रेखाकन (मापी) अंचल अमीन के द्वारा कराया भी गया है ।

अतः विभाग को अवगत कराना आवश्यक समझा ।

आपका विश्वासी

(मुहम्मद महमूद)

Date - 17/4/2017

MONTHLY PROGRESS ROAD/PHYSICAL PROGRESS

Fin Year: All

Scheme: [MGSV1 Gen]

Name of Road/English: 1026 to Mahmood Nagar(On-going)

DPR Submitted

Amount: 61.61900

Length in KM: 0.036

Selection of Schemes

Amount: 61.61900

Length in KM: 0.036

Technical Sanction

Amount: 59.66000

Length in KM: 0.036

Technical Approval

Amount: 61.61900

Length in KM: 0.036

Tender

Administrative Sanction / Administrative Approval

Amount: 59.659540

Length in KM: 0.036

Amount: 64.87900

Length in KM: 0.036

Date

Updated Expenditure: Maintenance

Date: 6/2/2017 11:57

Amount: 0.000

Agreement

Mar Work Part: 52.793590

Maintenance Amt: 1.600430

Length in KM: 0.036

Work Started: Yes

Expenditure in Lakhs

Upto 31/03/20: 10.044480

Upto Last Month: 0.000000

During This Month: 0

Total: 0.000000 Grand Total: 10.044480

Sub Base in KM

Upto 31/03/20: 0.836

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000 Grand Total: 0.836

Base in KM

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000 Grand Total: 0.000

Surface in KM

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.000

During This Month: 0

Total: 0.000 Grand Total: 0.000

Project Status: On-going

No of Habitations: 1

Connected Head Stations: 0

Remarks

अंचल कार्यालय, मोतिहारी

पत्रांक-.....582..... दिनांक- 10/01/2017

प्रेषक:- अंचलाधिकारी, मोतिहारी,
पूर्वी चम्पारण ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी ।


प्रसंग- शीर्ष एम०एम०जी०एम०वाई योजना अन्तर्गत एल०026 से महमूद नगर पथ में
पैमाइस के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- शून्य, दिनांक- 27.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्र के आलोक में एल0 026 से महमूद नगर पथ की पैमाइश
अंचल अमीन से कराई गई । खेसरा नं०- 66, 711, 695, 385, 994 में ग्राम महमूद नगर के
आम सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है । अब कोई अतिक्रमण नहीं है ।
अग्रेतर कारवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन


10.01.17

M/s Honest Construction Company

(GOVT. CONTRACTOR & SUPPLIERS)

R.W.D. Registration No:- 2190757, Class-2, Dated 13-07-2019

URDU LIBRARY ROAD, AMLAPATTI, MOTIHARI- 845401
EAST CHAMPARAN (BIHAR)

Ref No:-

Date 4/09/2020.....

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, मोतिहारी ।

विषय- समय वृद्धि की स्वीकृति देने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे नाम से सिर्फ एक पथ निर्माण कार्य आपके विभाग में लंबित है । मैं उक्त कार्य को पूर्ण कराना चाहता हूँ । कार्य का नाम- एल 026 से महमूदनगर है, जो MMGSY योजना अन्तर्गत है जिसका कार्य आरंभ करने की तिथि- 07.06.2016 और कार्य पूर्ण कराने की तिथि- 06.06.2017 थी भूमि अतिक्रमण और फिर भिषण बाढ़ के कारण कार्य पूर्ण कराने में विलंब हो रहा है, यदि मुझे दिनांक- 30.12.2020 तक समय वृद्धि दी जाती है तो मैं समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कर दूँगा ।

अतः श्रीमान् से निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए दिनांक- 30.12.2020 तक का समय दिया जाए । साथ ही साथ मैं किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा (Price Escalation) नहीं करूँगा । इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

Muzaffar Mahmood

(मुजफ्फर महमूद)

10AAFFH0769Q1Z6
o.-AAFFH0769Q



Mob:- 9431638833
9162871786

/s Honest Construction Company

(GOVT. CONTRACTOR & SUPPLIERS)

R.W.D. Registration No:- 2190757, Class-2, Dated 13-07-2019

URDU LIBRARY ROAD, AMLAPATTI, MOTIHARI- 845401
EAST CHAMPARAN (BIHAR)

Ref No:-

Date 4/09/2020

Revised Work Programme

<u>SL. NO.</u>	<u>ITEM TO BE EXTENDED</u>	<u>TO BE COMPLETED BY</u>
1.	FLANK REPAIR	15-09-2020
2.	GSB REPAIR	30-09-2020
3.	CC PAVEMENT	15-11-2020
4.	HARD SHOULDERING	10-12-2020
5.	ROAD FURNITURES KM-STONES	20-12-2020
6.	TRAFFIC & DIRECTION SIGN	30-12-2020

विश्वासभाजन

Muhammad Hameed,
(मुजफ्फर महमूद)

Attested
for signing
16/9/20

सहायक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, अवर प्रमंडल, मोतिहारी

पत्रांक 22022.....

दिनांक 22/11/2016.....

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल अवर, मोतिहारी

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण ।

विषय- एल. 026 से महमूद नगर पथ के मापी के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि उक्त पथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पथ का रेखांकन (मापी) अंचल अमीन से कराने की कृपा करेंगे ताकि उक्त पथ का कार्य कराया जा सके ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित ।

विश्वासभाजन
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल अवर, मोतिहारी

शेखा में,

श्रीमान आंचलाधिकारी मधुदत्त
गोहाटरी ।

विषय :- मापी प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में ।

महोदय,

निवेदनपूर्वक कहना है शकिय ज्ञापक 316 दिनांक 04.01.17 के अधीन
में मौजा मधुदत्तनगर धाना क०-119 अन्तर्गत ख०-026 जै मधुदत्तनगर पंच की मापी
05.01.17 एवं 06.01.17 को स्वधिय लैसो एवं हल्ला कर्मचारियों के उपस्थिति में मोहकिल
कायम कर किया । मापी का विवरण निम्न प्रकार है, खेचरा न० 66, 711, 695, 385, 994,
एवं अन्य खेचरा जै आम गडक की भूमि है, जो मधुदत्तनगर पंच अन्तर्गत पड़ता है, -
लिंगका निमांकन कर खेचरा पर मुड०-खेचरा गड़वा दिया । मापी की गडक वल्ल खेचरा
की दृश नक्शा में नीला रंग में दर्शा गया है ।

आता: आवश्यक कृपि में प्रतिवेदन सादर समर्पित ।

उनु० ० एक एक प्रसिद्ध नक्शा ।


विश्वासभाजन

उमिल कुमार भारती

आंचल अमीन

दिनांक :- 09.01.17

ग. गदूर नाम - मधुवनगर
 थाना - मोहिधरी
 चालानं - 119
 अंचल - मोहिधरी
 जिला - पूर्वी चम्पारण
 पैमाना १ इंच = १ मील

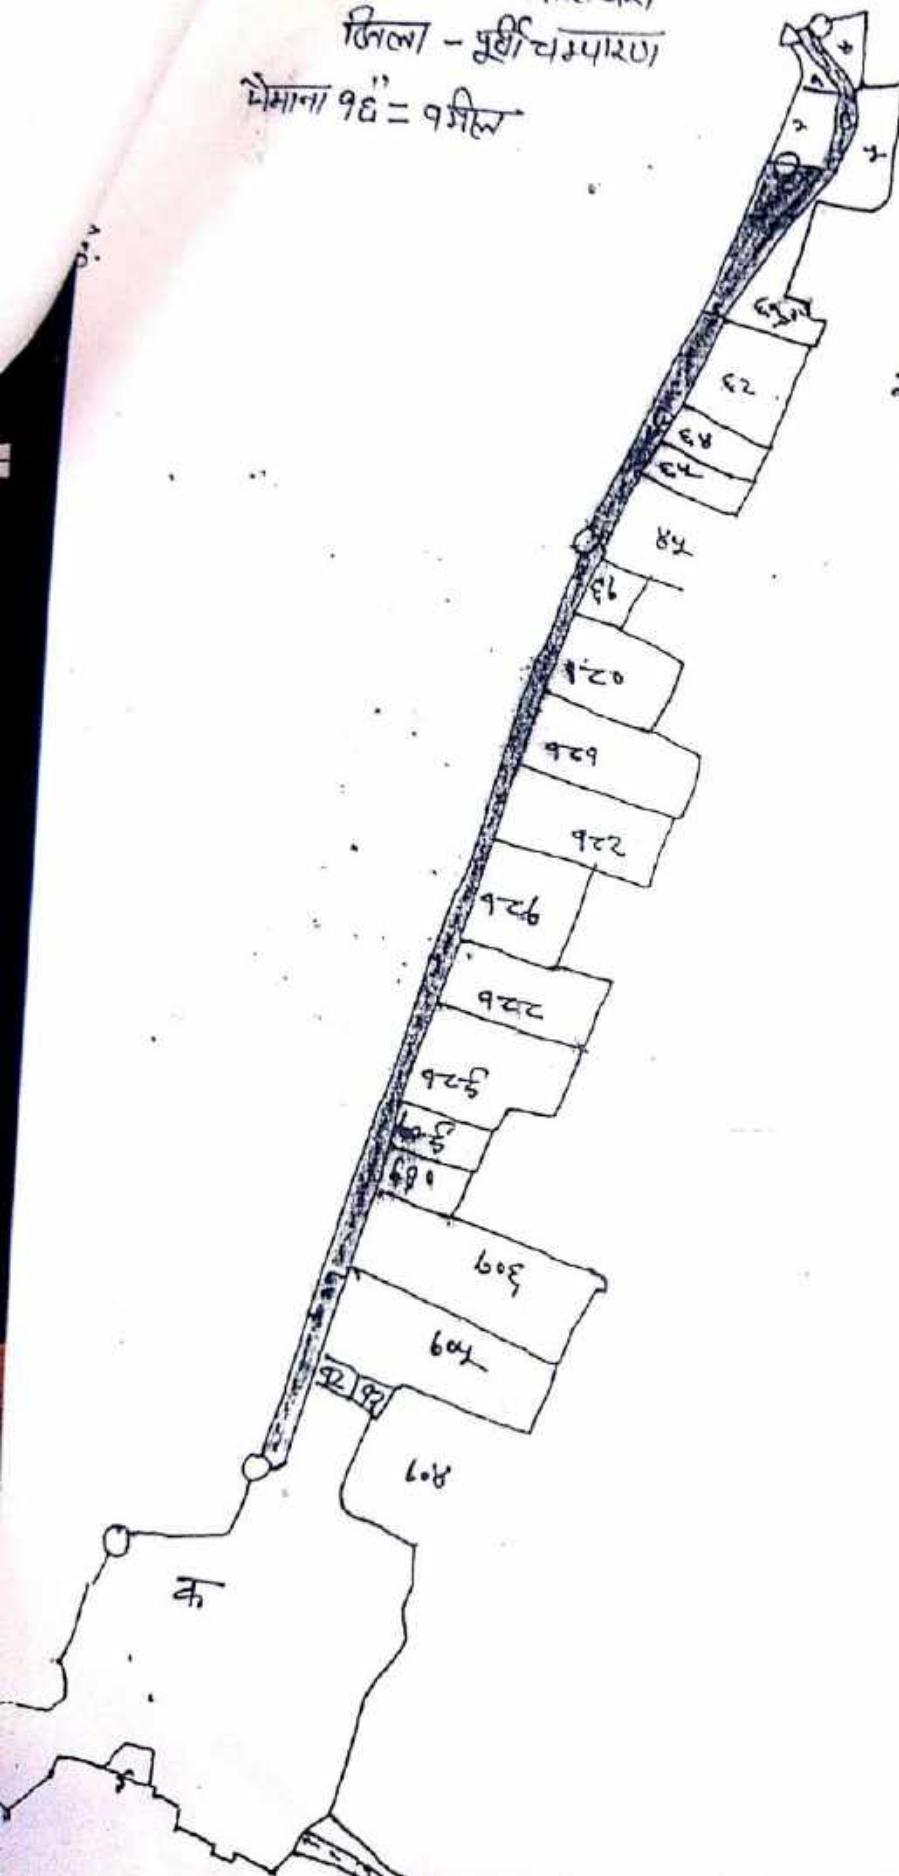

संकेत :- मापी गयी मड़क, वाला रैबर
 का रंग दीला (-)

अनिल कुमार गारसी
 अंचल अभियान
 दिनांक :- 09/01/17

मशहूर नाम - गहमूदनगर


प्लान नं० - 119

प्लान - भासिधरी

अंचल - भासिधरी

पैमाना
1 इंच = 9 मील

नोट :- सापी की बगल वाली रेखा
का रेखा नीला (-)

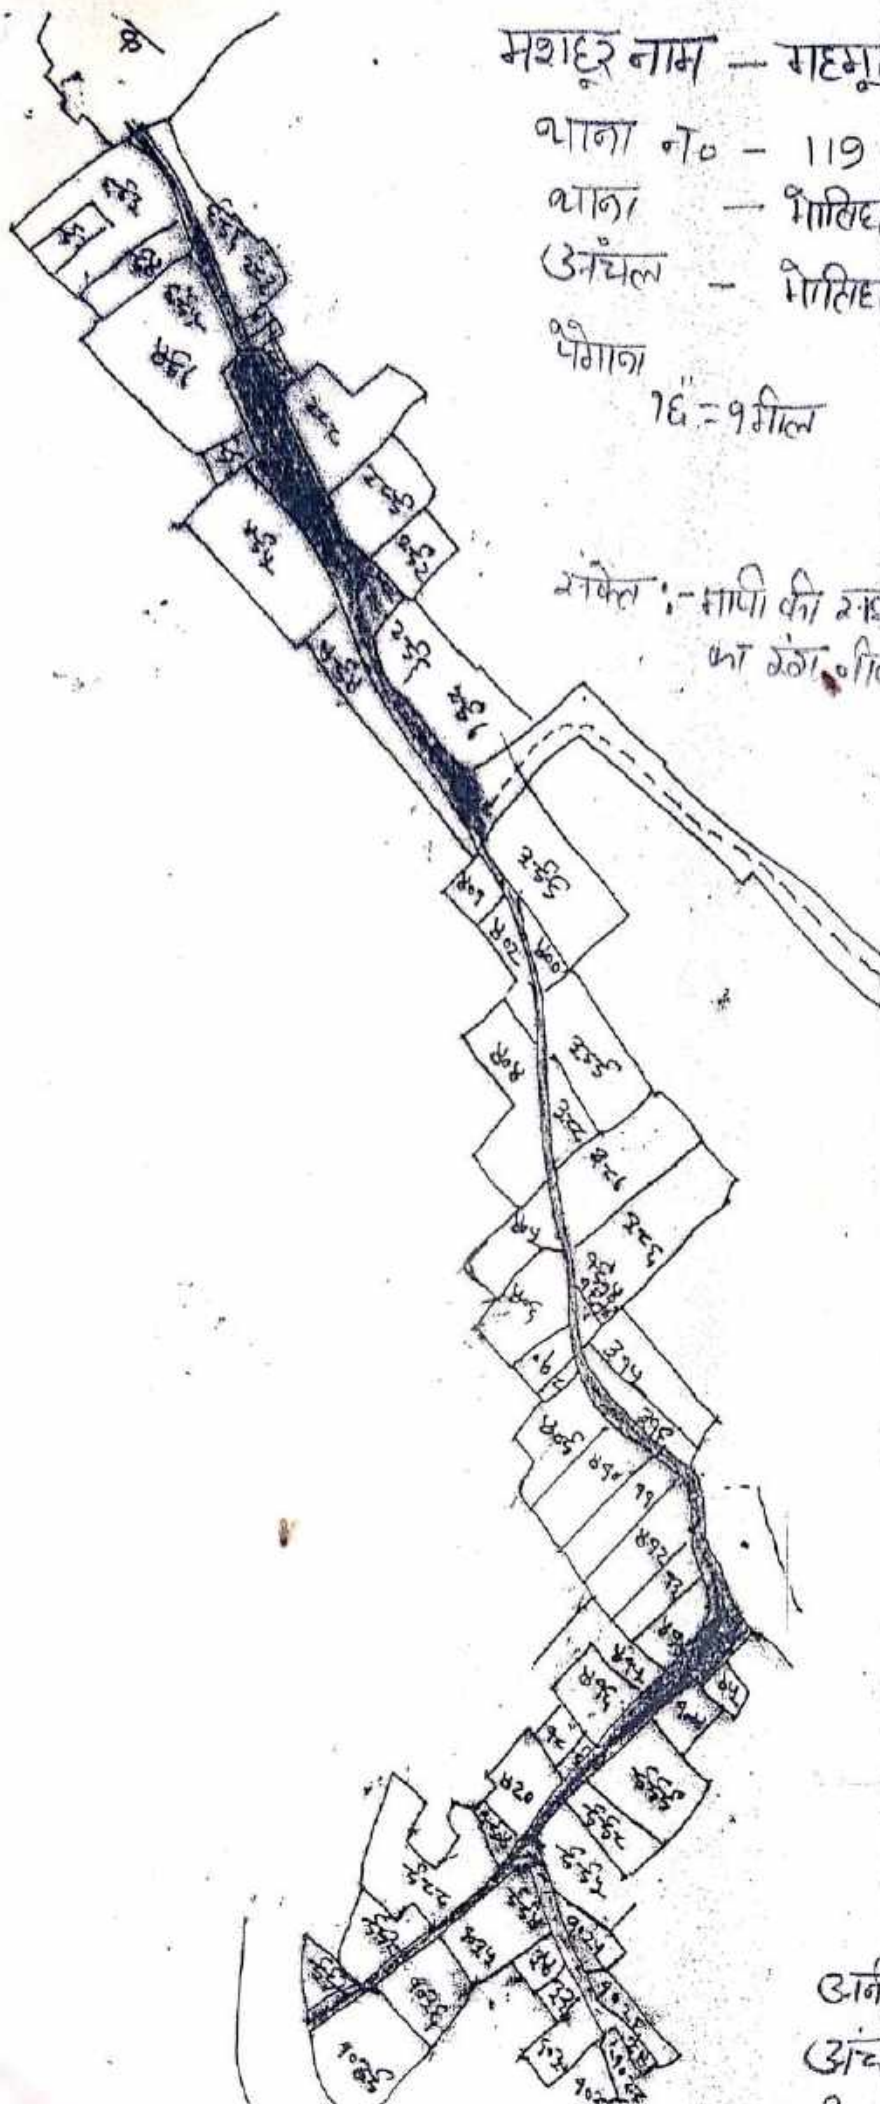

अंचल कुठाई गांव

अंचल अंगीक

दिनांक - 09/01/17

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी
 पत्रांक 783 दिनांक 13.6.2018 मोतिहारी, दिनांक 13.6.2018

60

अधीक्षण अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य अंचल, मोतिहारी।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-4
 ग्रामीण कार्य विभाग
 बिहार पटना।

विषय :- कार्य प्रगटल मोतिहारी के अधीन वर्ष-2017 के भयंकर अतिवृष्टी एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का एकसंरभामा के अधीन पथों के पुनर्स्थापन हेतु FDR योजना अन्तर्गत डी0पी0आर0 तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित करने के सम्बन्ध में।

प्रति :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगटल, मोतिहारी के पत्रांक-1163 अनु० दिनांक-11.06.2018 एवं विभागीय पत्रांक-पु0310-4(पु0)विधि(कार्य)-23-116/2017 1319 पटना दिनांक-10.04.2018

गयासय,

उपरोक्त विषयक प्रशासनिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रगटल मोतिहारी के अधीन वर्ष-2017 के भयंकर अतिवृष्टी एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का एकसंरभामा के अधीन पथों के पुनर्स्थापन हेतु FDR योजना अन्तर्गत डी0पी0आर0 तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित किया जाता है।

क्र. सं.	पथ का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुमान की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	Sanchira Baba Mandir to L029	0.850	53.624	2.819	56.443
2	Darghama to Bhaudha Road (L026)	0.700	50.271	2.053	52.327
3	L026 to Bharauliya	0.780	53.722	1.502	55.224
4	Sekh Dukhari to House of Prabhu Singh	0.920	48.026	1.712	49.738
5	L026 to Mahmood Nagar	0.838	53.840	1.660	55.500

अनु०- यथोक्त।

कुल 5 अदर डी0पी0आर0

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक 783 दिनांक 13.6.2018

प्रतिनिधि - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगटल मोतिहारी को उनके पत्रांक-1163 दिनांक-11.06.2018 के आशोक में सूचनाएं प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य अंचल, मोतिहारी

दिनांक - 19/01/2017



मोतिहारी शहर के बाईं नंबर एक के महबूब नगर में शुक्रवार को नाव के सहारे आते-जाते लोग। । • हिन्दुस्तान

पोइतों के बीच एरियल ड्रापिंग किया गया। बगहा नगर में विद्युत आपूर्ति शुरू हो गयी है। गोरखपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर ठप पड़ी ट्रेन परिचालन शुक्रवार से गोरखपुर से बगहा तक डेम्प ट्रेन से शुरू की गयी। गंडक पार के दूटे

हुए पोपी तटबंध को दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर गंडक बराज से 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ गया। बिहार व नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कमजोर पड़ने कोसी, सोमांचल, चंपाण और

सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर फिलहाल थम गया है। लेकिन सड़के जहां-तहां कटी हैं इसलिए लोगों का आना-जाना मुश्किल है। सुबे में पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या 26 हो गई है।

संबंधित खबरें पेज 03,04,08

मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना

6 से महमूद नगर तक।

0.836 किमी.

अनु. लागत :- 5445402

लाख रु.

सामान्य अनुरक्षण की लागत :- 1.66043

लाख रु.

आरंभ

पूर्ण

07.06.2016

06.06.2017

पाँच वर्ष

नाम :- मे.ओ.नेष्ट कन्स्ट्रक्शन अंड्रोलइवरी रोड अमलापट्टी, मोतिहारी

द्वारा :- ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, बिहार सरकार



L 026 TO MAHMOOD NAGAR



5/9/20

5/9/20

5/9/20



5/9/20

5/9/20

5/9/20

LO26 TO MAHMOOD NAGAR



Handwritten signature and date: 5/9/10

Handwritten signature and date: 5/9/10

Handwritten signature and date: 5/9/10



Handwritten signature and date: 5/9/10

Handwritten signature and date: 5/9/10

Handwritten signature and date: 5/9/10
