

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 1169 3430/

जहानाबाद, दिनांक: 14-8-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय :- ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत पथ की समय सीमा वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नीरज कुमार, ग्राम+पो0- कल्पा, जहानाबाद के द्वारा गैस गोदाम से बड़ी बिगहा पथ निर्माण कार्य करने का एकरारनामा संख्या 02/SBD//2017-18 के तहत कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.07.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.10.2017 है इस कार्य का एकरारनामा की राशि रुपये 23.60227 Lakh है। कार्य की प्रगति के समय जमीन विवाद होने के कारण (लोक शिकायत नि0पदा0की अनन्य संख्या 999960114041804984) इस कार्य को पूर्ण कराने में विलम्ब हुआ है। यह कार्य वास्तविक रूप से 18.11.2018 को पूर्ण करा दिया गया है। इसकी समय सीमा वृद्धि हेतु संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 18.11.2018 तक अनुशंसा प्राप्त है। पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है।

अतः सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विहित प्रपत्र में आवेदन मूल में, शपथ पत्र मूल में, मापी पुस्तिका संख्या 2521 पृष्ठ सं0 1 से 19 तक की छायाप्रति अभिप्रमाणित कराये गये कार्य का फोटो एवं सी0डी0 अनुशंसा के साथ दिनांक 18.11.2018 तक समय सीमा वृद्धि की अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जाती है।

- अनु0- (1) आवेदन मूल में
(2) शपथ पत्र मूल में
(3) मापी पुस्तिका सं0 2521 पृष्ठ सं0 1 से 19 तक की छायाप्रति।
(4) कार्य का फोटोग्राफ
(5) I/E का जॉच प्रतिवेदन।
(6) जमीन विवाद से संबंधित प्रतिवेदन।
(7) लोक शि0 नि0पदा0 की अनन्य सं0-
999960114041804984

विश्वासभाजन

14-8-2020

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

14/8/20

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME :-

1. Name Of Contractor : Niral Kumar Vill + Post - Kalpa.
2. Name Of Work:- P.S. + Dist - Teharabad.
(Head Of Expenditure) Const. of Road from Gas Godown
to Bashi Digha under G.T.S.N.Y.
3. Agreement Number:- 2 / SBD / 2017-18.
4. Agreement Value:- Rs 23602272.
5. Date Of Commencement Of Work:- 13-07-17
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 12-10-17
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:-
8. Work Done In %:- 100%.
9. Period For Which Extension Now Applied For:- 10-01-2020.
10. Reason For Extension Of Time:- जमीन विवाद के कारण कार्य विस्तार हो गया है।
10.01.2020
11. Recommendation By J.E.:- जमीन विवाद के कारण कार्य विस्तार हो गया है।
10.01.2020
12. Whether Programme Of Work Approved:-
13. Whether Fund Available:-
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The
Current Work Programme or not:-
15. Recommendation Of SDO:- जमीन विवाद के कारण कार्य विस्तार हो गया है।
10.01.2020
16. Recommendation Of Executive Eng:- A.E.
17. Recommendation Of S.E.

नील कुमार

GR

GR 0003218040

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

22-JAN-2020 14:52:26

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE

LOCATION :

CIVIL COURT JEHANA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT2235A2049O943


e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)



BRCT2235A2049O943




Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

शपथ पत्र

मैं नीरज कुमार पिता - स्व ० छोटन नारायण सिंह ग्राम + पोस्ट - कल्पा थाना + जिला - जहानाबाद उम्र लगभग 38 वर्ष राज्य बिहार धर्म हिन्दू नागरिकता भारतीय शपथ पूर्वक निम्नलिखित बातों को सत्य घोषित करता हूँ कि :-

- 1 यह कि मैं एक निबंधित सवेदक हूँ
- 2 यह कि मैं गैस गोदाम से बड़ीबिगहा तक G.T.S.N.Y सड़क निर्माण कार्य किया हूँ I
- 3 यह कि मैं इस कार्य का समय वृद्धि विभाग से मिलने के बाद वस्तु दर वृद्धि संबंधी किसी तरह का दावा पेश नहीं करूंगा I
- 4 यह कि उपयुक्त शपथ पत्र में लिखी गई सारी बातें सत्य व सही है असत्य पाये जाने पर मेरे ऊपर संबंधित विभाग कानूनी कारवाई करने को स्वतंत्र है I



Authorised by
The Notaries Act, VIII of 1953

अधिवक्ता

Sachin Kumar
22/1/2020

22/1/2020
शपथकर्ता
NOTARY
JAHANABAD

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
घोषी (जहानाबाद)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

दिनांक 24 वीं जुलाई, 2019

विषय :- जी0टी0एस0एन0वाई0 अंतर्गत गैस गोदाम से बढ़ी विगहा पथ का जमीन मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।


प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 1031/सा0, दिनांक 16.07.2019
महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के आलोक में गैस गोदाम से बढ़ी विगहा पथ का जमीन का मापी प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


अंचल अधिकारी,
घोषी।

1/1/2019/256/2019
संलग्नक
दिनांक
24/7/19

631
24/07/19

सेवा में
श्री आनू अंचल अधिकारी महोदय धौबी
अष्टा नवाद

विषय - श्री आ - धौबी टोला बड़ई बिगहा थाना
568 चदर नं० 2 खाना नं० 437 591 ब्लॉक नं०
1596
प्रसंग - शापांक 293 सापोंवाद सं० 37/2018
दिनांक 13-03-2019 के आलोक में सापों (मिथी
15-03-2019

महाशय
सादर प्रतिवेदन करता है कि श्री आनू के
शापांक 293 सापोंवाद सं० 37/2018 दिनांक
13-03-2019 के प्राप्त आदेश के अनुपालन
में से दिनांक 15-03-2019 को श्री आ

नमि र
यु तिरु

03.06


श्री धौबी टोला बड़ई बिगहा थाना नं० 568 चदर
नं० 2 खाना नं० 591 ब्लॉक नं० 1596 में बस
रहे रोड जो उस जोदसा के बगल से टोला
बड़ई बिगहा जाता है, जो बगल वाले सुमि
मालिक श्री शंकर शर्मा पिता चतुरा शर्मा के
सुबोध सुमार तथा प्राइवेट मसाले महेश
सिंह के उपस्थिति में सापों कर चिन्हित
किया गया।

सर्वेक्षक सा एवं स्थल सुमायना के
उपरान्त शान्त हुआ कि श्री आ धौबी टोला
बड़ई बिगहा संपर्क पथ खाना नं० 591
ब्लॉक नं० 1596 परिन है, जिस पर संपर्क
पथ बनाया जा रहा है, जिसे सापों
कर चिन्हित किया गया। जो आस गर
अजरता है।

P. T. D.

पथम सुखत कालि जानिव उतर ललौ ललौ
27 55, 27 25, 27 26 के सिमेड से या तीन
मेड से ललौ ललौ 15 96 का उतर मेड
1045 कड़ी है,

जारापठा पौधरी
अंचल उसील
धोषी




સૌજા - દોષી દોના બદલે બિગદા

થાના નં 568

રવાના નં 591

લોટ નં 1596

અસોન કા કિરમ - પડેન મામ ગરમાજરમા

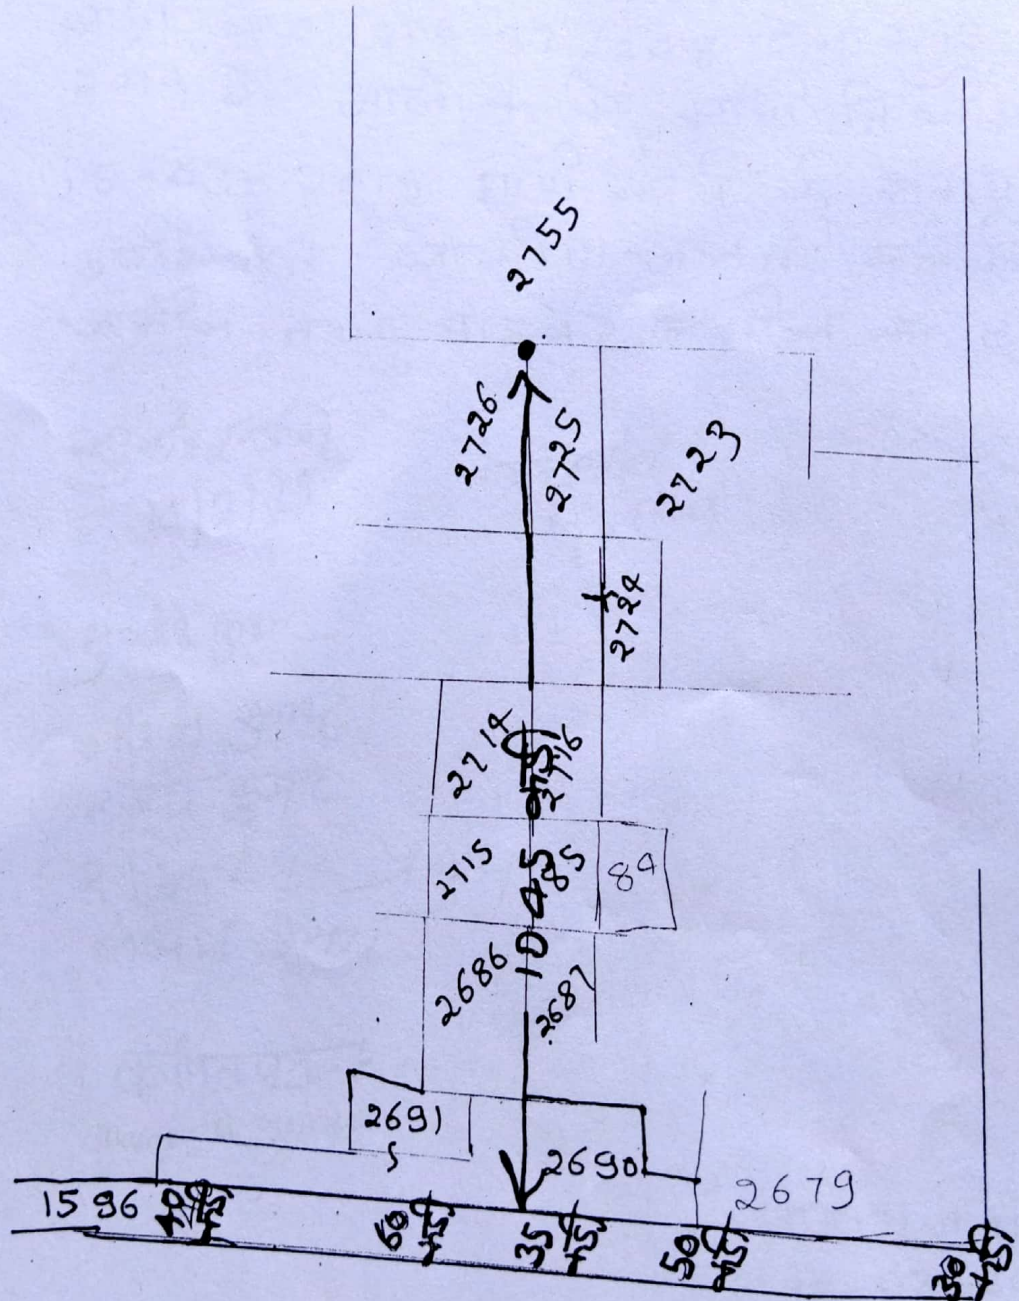

મારા પાંચોદી
અંચલ ઠાસી
દોષી

आज दिनांक 15-03-2019 को मौजा
 घोषी थाना नं० 568 चादर नं० 2
 खाना नं० 437 लोटे नं० 2691 खाना
 नं० 457 लोटे नं० 2679 बैंगरह सड़क
 पड़ने पर बना हुआ है जिसका खाना
 नं० 591 लोटे नं० 1596 शापाक 293
 सापे बाद नं० 37/2018 दिनांक 13-03-
 2019 के आलेख में सापे निधि नं०
 15-03-2019 सापे कार्य के समर्थ
 उपस्थित नगरीय जनता एवं निजी
 जमान तथा प्राइवेट जमान का हस्तक्षेप

सुनील कुमार
 15/3/19

महेन्द्र
 15.3.19

सुनील कुमार

नीरज कुमार

रंजीत कुमार

रामेश्वर प्रसाद

संगम कुमार

कपिल कुमार
 Kapil Kumar

नारायण चौधरी
 15-03-2019
 संचल मजदूर
 घोषी

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 237 /

जहानाबाद, दिनांक: 8-2-19 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
घोषी।

विषय :- जी0टी0एस0एन0वाई0 अन्तर्गत गैस गोदाम से बड़ी बिगहा पथ का मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 2455 दिनांक 25.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा G.T.S.N.Y. अन्तर्गत गैस गोदाम से बड़ी बिगहा पथ के निर्माण हेतु जमीन की मापी करा कर जमीन से संबंधित मापी प्रतिवेदन की माँग की गई थी परन्तु उक्त प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। मापी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उक्त योजना का निर्माण कार्य बाधित है।

अतः उक्त संबंध में पुनः अनुरोध है कि उक्त कार्य से संबंधित जमीन की मापी कराकर मापी प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उक्त पथ का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

8.2.19
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।
8.2.19

1/c

पतांक
प्रेषक...

27 (अ३३) / दिनांक 16.07.2019

सहायक - अभियंता
ग्रामिण कार्य अवर प्रमंडल
दोषी।

लेखा में;

कारिपालक अभियंता
ग्रामिण कार्य - विभाग
कार्य प्रमंडल जहानाबाद।


विषय :- दोषी प्रबंध के अन्तर्गत जैसा मोहदा से कर ही किंग
पथ का प्रावकलन पुनरीक्षित करने के संभव में।

प्रसंग :- अभिकर्ता मेरवी नीरज कुमार का पतांक 0 दिनांक 28.06
महाजम।

उपरोक्त प्रांशिक विभाग के सौंदर्य में कहना है कि विभाग
पथ का माफी अंशाल अंगीन दोषी द्वारा माफी प्रतिवेदन दिया गया। वर्तमान
पथ आरेखणा रेगनी जमीन में दिखाना गया है तथा पथ आरेखणा के
काल में आश जैरमजुलुओं जमीन दिखाना गया है। प्राप्ति प्रतिवेदन की
दामा - प्रति इन कामालम के पतांक 17 दिनांक 6.6.19 के द्वारा मेजा गीता

पथ के पुराने आरेखणा में B.E.S. Soling के उपर C.C.
निर्माण कराने जाने का प्रावधान है। आरेखणा बदल जाने
कारण 200 मीटर समतल जमीन के उपर मिट्टी भराने पथ निर्माण
कराना जायेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रावकलन के पुनरीक्षित करने
का आवश्यकता है। आरेखणा बदल जाने के कारण उन पथ में एक 2.00
x 2.00 मीटर का नया R.C.C. Culvert निर्माण का आवश्यकता हो गई

पुनः माफी प्रतिवेदन का दामा - प्रति सौंदर्य कर
आवश्यक करवाई है।
अनुमोदनक - 0 मजोपरि।

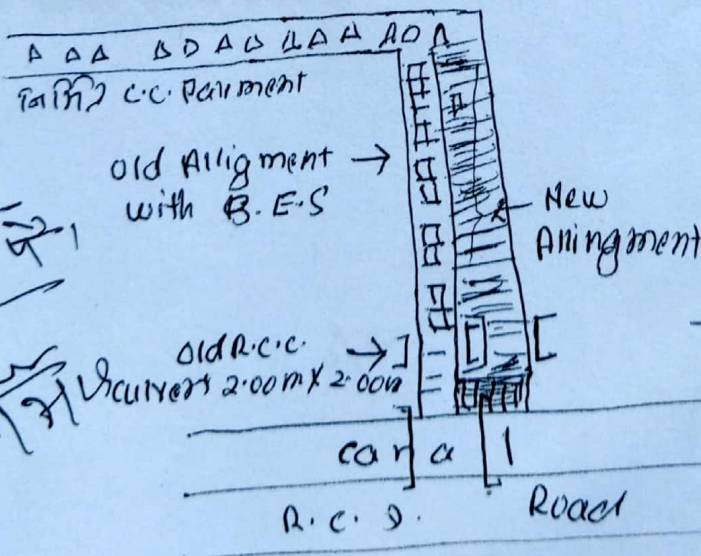

विभागाध्यक्ष
16.07.19

सहायक - अभियंता
ग्रामिण कार्य - विभाग
कार्य अवर प्रमंडल
दोषी।

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 237 /

जहानाबाद, दिनांक: 8-2-19 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
घोषी।

विषय :- जी०टी०एस०एन०वाई० अन्तर्गत गैस गोदाम से बड़ी बिगहा पथ का मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 2455 दिनांक 25.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा G.T.S.N.Y. अन्तर्गत गैस गोदाम से बड़ी बिगहा पथ के निर्माण हेतु जमीन की मापी करा कर जमीन से संबंधित मापी प्रतिवेदन की माँग की गई थी परन्तु उक्त प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। मापी प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उक्त योजना का निर्माण कार्य बाधित है।

अतः उक्त संबंध में पुनः अनुरोध है कि उक्त कार्य से संबंधित जमीन की मापी कराकर मापी प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उक्त पथ का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

8.2.19
