

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)।

पत्रांक:- 271/...../फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:- 13/02/2021

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल दरभंगा।

विषय:-

GTSNY योजना अंतर्गत पथ PMGSY Kalripatti to Jhanjhpathi
Doman Yadav Tol Kalripatti का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध
में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या- 50 SBD/ 2018-19 के द्वारा विषयांकित पथ का निर्माण कार्य हेतु दिनांक- 09.03.2019 को एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक-08.12.2019 को समाप्त करना था। संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार संवेदक का मृत्यु हो जाने के कारण एवं संवेदक का मृत्योपरांत अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक- 6537 दिनांक- 16.12.2019 के आलोक में विधिक उत्तराधिकारी नसीम आरा से शेष कार्य पूर्ण करवाने हेतु आदेश (छायाप्रति संलग्न) के कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका। उक्त कार्य में संवेदक दोषी नहीं है। वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य 04 अगस्त 2020 तक पूर्ण करा लिया गया है। वर्णित पथ में कोई ATR लंबित नहीं है और ना ही संवेदक को डिबार सूचि एवं काली सूचि में डालने कि अनुशंसा नहीं की गई है।

अतः उक्त कार्य में दिनांक- 04.08.2020 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

2036

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम:- PMJAY क्लरिफिकेशन ऑफ़ काकपट्टी डीमंड ग्रांट ट्रीप क्लरिफिकेशन
2. संवेदक का नाम:- नसीम आरा
3. एकरारनामा संख्या:- SDSBD/2018-19
4. एकरारनामा की राशि:- ₹ 88941 = 00
5. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि:- 9/03/2019
6. कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि:- 08/12/2019
7. संविदा तिथि तक किये गये कार्य की राशि:-
8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण:- नहीं
9. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित:-
10. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि:- डिजिटल 12.04.2019 को लगे हुए मीटर अडिस्टमेंट की वजह से 1537 डिजिटल मीटरों का अडिस्टमेंट 08.12.2019 तक नहीं हो पाया है।
11. संवेदक का हस्ताक्षर:- नसीम आरा 08.12.2019
12. प्रशाखा पदाधिकारी की अनुशंसा:- समय वृद्धि दी जा सकती है। 11.12.2019 JE
13. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा:- Time Extension may be granted upto expiry of the Contractor's work completed in all respect as per specification. 11/12/19
14. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:- The statement is correct. Recommended for the time-extension to be granted. 13/12/19 RK

NASIM ARA

GOVT.CONTRACTOR

Nasim Ara
House No-66, Khutauna Bazar
Dist-Madhubani-847227

Mob:-8986313786
6200957401

Ref No: -

Date: - .../.../...

सेवा में

कार्यपालक आगियेता
जाम्नीन काम विभाग
कार्ड उर कुलपराय

विषय : समय हद तक त्वरित करने के संबंध में

महोदय

समयपालक आगियेता
जाम्नीन काम विभाग
कार्ड उर कुलपराय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहा है कि जाम्नीन काम
निर्माण कार्य के अंतर्गत 1921 का खर्च के
प्रमाण पत्र पर कार्य कर रहे हैं।
आप को 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र
के अंतर्गत 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र
के अंतर्गत 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र

जाम्नीन काम विभाग
कार्ड उर कुलपराय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहा है कि जाम्नीन काम
निर्माण कार्य के अंतर्गत 1921 का खर्च के
प्रमाण पत्र पर कार्य कर रहे हैं।
आप को 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र
के अंतर्गत 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र
के अंतर्गत 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र

6537 दिनांक 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र
के अंतर्गत 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र
के अंतर्गत 18.12.19 को कार्य के प्रमाण पत्र

आपका विश्वासपूर्ण
नसीम आरा

उत्तर
12/12/19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



BIHAR

प्रयोग

1000 रु. का नोट
58444

09/03/2019
08/12/2019

(A) STANDARD FORM AGREEMENT

The Agreement should incorporate any correction on modification to the Bid resulting from correction of errors

(Instructions to Bidders, clause 26)

Standard Form: Agreement

Agreement no. 50 SBD/2018-19

This agreement made the
BetweenEE RWD, Work Division-phulparas.....[Name & Address of employer]
(hereinafter called "the Employer") of the one part, and. Mohamad Abul Hasnat.Address-
,Khutana,Madhubani.(Name and address of contractor,) hereinafter called "the contractor"
of the other part). Whereas the employer is desirous that the contractor,
Construction of the road & CD Works Laulaha PMGSY Kalripatti To Janjhaopatti
Doman To Yadav Tol Kalripatti (Under GTSNY) [name and identification number of contract]
(hereinafter called "the works") and the employer has accepted the Bid by the contractor for
the execution and completion of such works and the remedy of any defects therein at a cost
of Rs. =.70,38,941.00 (Seventy lakh eighty eight thousand nine hundred forty one only.

signed copy

Executive Engineer
Rural Works Department
Phulparas

Executive Engineer
RWD (W) Division, phulparas

Att.
3035
13144

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक - गु0अ0-4 (गु0) GTSNY-36-09/2019-6537 (2/3)

पटना, दिनांक 6/12/19

प्रेषक,

श्री0 प्रवीण कुमार ठाकुर,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

विषय-

संवेदक की मृत्यु के पश्चात् अवशेष कार्य को उनके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल, फुलपरास के अधीन GTSNY योजनान्तर्गत दो पथों गोठ खुटौना से खुटौना शंकरपुर एवं एवं पी0एम0जी0एव0वाई0 कलरीपट्टी से झांझपट्टी डोमन यादव टोल कलरीपट्टी पथ निर्माण कार्य, जिसका एकरारनामा स्टेट एस0बी0डी0 आधारित था, के संवेदक मो0 अब्दुल हसनात की मृत्यु के पश्चात् पथ कार्य को उनके विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती नसीम आरा से एस0बी0डी0 की कंडिका 37 के आलोक में पूर्ण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

At.
335
12/12/19

विश्वासभाजन

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

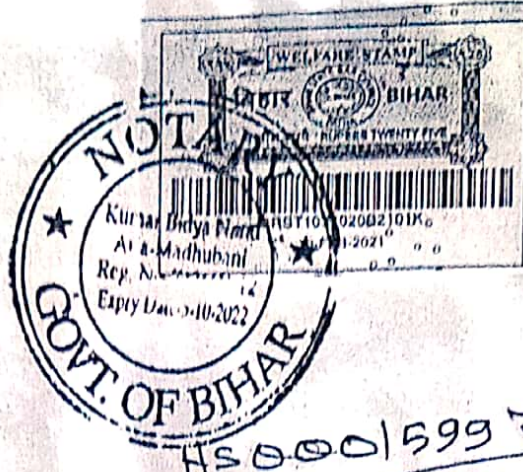

समक्ष,

लेखा प्रमाणक,
मधुबनी।

HS 0001599746
100-00

शपथ-पत्र

325/21 यह कि नसीम आरा, पति मो० अबुल हसनात, ग्राम + पोस्ट - खुटौना,
थाना - खुटौना, जिला - मधुबनी, बिहार का निवासी हूँ।
11/04/21

1. यह कि उपरोक्त पता सत्य है।

2. यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा खुटौना प्रखंड के अन्तर्गत

पी०एम०जी०एस०वाई कलरीपट्टी से झांझपट्टी डोमन यादव टोल

कलरीपट्टी सड़क निर्माण एकरारनामा सं० - 50SBD 2018-19

ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत मेरे पति को कार्य

कुशल निष्पन्न किया गया था।

3. यह कि एकरारनामा के अनुसार मुझे समाप्ति की तिथि 18.12.2019

थी। परन्तु मेरे पति के मृत्यु के उपरान्त अभियंता प्रमुख के पत्रांक

6537 दिनांक 16.12.2019 को यह कार्य पूर्ण करने का आदेश प्राप्त

हुआ।

4. यह कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण विभाग द्वारा समयवृद्धि के रूप में दस प्रतिशत की कटौति कर ली गई है।

5. यह कि कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार पथ का दिनांक

12.08.2020 को पूर्ण कर लिया गया है एवं अनुरक्षण कार्य भी जारी

है।

6. यह कि उक्त पथ में समयवृद्धि के एवज में दस प्रतिशत के हिसाब

से भुगतान से पैसा काट लिया गया है। जिसके लिए मैं राशि की

चापसी हेतु उचित माध्यम के द्वारा विभाग को सभी कागजात

समर्पित कर चुकी हूँ।

7. यह कि पथ में समयवृद्धि के राशि के अलावा भविष्य में किसी भी

राशि का दावा पेश नहीं करूँगी।

उक्त कथन मेरी जानकारी सही एवं सत्य है।

शपथकर्ता ने मेरे समक्ष

अपना हस्ताक्षर बनाया।

अधिवक्ता, मधुबनी।

शपथकर्ता
नसीम आरा

₹1
BIHAR COURT FEE
BRCT0650940B21540
06-FEB-2021



HS 0001599746
GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME : 09-FEB-2021 10:45:16
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SRP INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
LOCATION : CIVIL COURT, MANDHUBANI
e-COURT RECEIPT NO : BRCT0949B2140K503
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 99

(Rupees Ninety Nine Only)
Kumar Ravi
BRCT0949B2140K503



Statutory Alert: The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified on www.shc.gov.in. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास

पत्रांक २६९.

दिनांक 13/02/2021

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत नसीम आरा, पति मो० अबुल हसनात, ग्राम + पोस्ट - खुटौना, थाना - खुटौना, जिला - मधुबनी, बिहार संवेदक द्वारा पी०एम०जी०एस०वाई कलरीपट्टी से झांझपट्टी डोमन यादव टोल कलरीपट्टी सड़क निर्माण एकराशनामा सं० - 50SBD 2018-19 के अधिन कार्य विशिष्टियों एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप 17.08.2020 को पूर्ण कर लिया गया है। इस पथ में कोई ए०टी०आर० लम्बित नहीं है।

13.02.2021
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, खुटौना।

13.02.2021
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, खुटौना।

13.02.2021
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
प्रमंडल फुलपरास।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास, (मधुबनी)

पत्रांक:- २७०...../फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:- 13/02/2021

अनुरक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संवेदक नसीम आरा, ग्राम+ पोस्ट+ थाना- खुटौना, जिला- मधुबनी के द्वारा GTSNY योजना अंतर्गत PMGSY Kalripatti to Jhanjhpatti Yadav Tol Kalripatti पथ का निर्माण कार्य कराया गया है। जिसका एकरारनामा संख्या- 50 SBD/2018-19 है। उक्त पथ का निर्माण कार्य 12.08.2020 को पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त पथ में संवेदक द्वारा अनुरक्षण/ रख रखाव का कार्य विशिष्टियों के एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप नियमित रूप से कराया जा रहा है।

13.2.2021
क0अ0

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, खुटौना।

13/02/2021
स0अ0

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, खुटौना।

13/02/2021
क0अ0
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पृ. 1
No. 1



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR
पञ्चग. और विकास विभाग
DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटाणा
PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA

प्रपत्र-6
FORM-6



मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा बिहार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया।)
(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE BIHAR REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 1999.)

यह प्रमाणित किया जाता है निम्नलिखित सुचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटाणा तहसील लाकहा जिला मधुबनी राज्य/संघ प्रदेश बिहार, भारत के रजिस्टर में उल्लिखित है।
THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA OF TAHSIL/BLOCK LAUKAHA OF DISTRICT MADHUBANI OF STATE/UNION TERRITORY BIHAR, INDIA.

मृतक का नाम / NAME OF DECEASED : MOHAMMAD ABUL HASNAT

लिंग / SEX: पुरुष / MALE

आधार नंबर / AADHAAR NO.:
XXXXXXXX0066

मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH:
13-04-2019
THIRTEENTH-APRIL-TWO THOUSAND NINETEEN

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH:
PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA

मृतक की उम्र / AGE OF DECEASED:
56 YEARS

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:
NASIM ARA

माता का नाम / NAME OF MOTHER:
NOOR JAHAN

आधार नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:
XXXXXXXX8211

आधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO.:

पिता का नाम / NAME OF FATHER:
LATE AINUL HAQUE

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH:

आधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO.:

KHUTAUNA, KHUTAUNA, KHUTAUNA,
KHUTAUNA, KHUTAUNA, LAUKAHA, MADHUBANI,
BIHAR- 847227

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED:

KHUTAUNA, KHUTAUNA, KHUTAUNA,
KHUTAUNA, KHUTAUNA, LAUKAHA, MADHUBANI,
BIHAR- 847227

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO.:
D-2019: 10-08424-000001

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION:
20-04-2019

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE:
20-04-2019

जारी करने वाला प्राधिकारी
ISSUING AUTHORITY
रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
REGISTRAR (BIRTH & DEATH)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटाणा
PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA
मधुबनी (मधुबनी)

UPDATED ON:
20-04-2019 15:15:33



THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE.
THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS
APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.
प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें / ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH



Rural Works Department, Govt. of Bihar



Welcome:-PIUPhulparas
Wing:-CE-3, Patna
Circle:-Darbhanga
Division:-Phulparas
No Of Visit:-66

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports QMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request Contractors Debar Class 1 Road Format Time Extension Contractors Black List
Maintenance Contractor Revoke Flood/Rain Damage Roads Poorak Core Network Crash Inspection Contractor Emergent Repair User Registration Maintenance Allotment Road / Bridge Allotment Maintenance Observation Offline Inspection
Left Habitation Survey

MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme

Name of Road(English) Fin Year

Selection of Schemes

Technical Approval	Amount: 71.68400	Length(In KM:) 1.000	DPR Submitted	Amount: 71.68400	Length(In KM:) 1.000
Administrative Sanction / Administrative Approva	Amount: 71.80700	Length(In KM:) 1.000	Technical Sanction	Amount: 69.49500	Length(In KM:) 1.000
Updated Expenditure (Maintenance Amt)	Amount: 0.000	Length(In KM:) 1.000	Tender	Amount: 69.616000	Length(In KM:) 1.000
Agreement			Date		
Main Work Amt: 68.704100	Maintenance Amt: 2.185310	Length(In KM:) 1.000	Date: 1/1/1900 12		
Expenditure(In Lakhs)			Work Started: Yes		
Upto 31/03/20: 0.000000	Upto Last Month: 65.523740	During This Month: 0	Total: 65.523740 Grand Total: 65.52		
Sub Base(In KM)	Upto Last Month: 1.000	During This Month: 0	Total: 1.000 Grand Total: 1.000		
Upto 31/03/20: 0.000	Upto Last Month: 0.000	During This Month: 0	Total: 0.000 Grand Total: 0.000		
Base(In KM)	Upto Last Month: 1.000	During This Month: 0	Total: 1.000 Grand Total: 1.000		
Upto 31/03/20: 0.000		During This Month: 0	Total: 1.000 Grand Total: 1.000		
Surface(In KM)		No of Habitations: 1	Connected Habitations: 1 Remarks:		
Upto 31/03/20: 0.000					
Project Status: Complete	Actual Date of Completion: 04-Aug-2020				

Environmental Social Management & FrameWork

Road Insurance

ESMF(IF any)

ESMF Remarks

Utility Sifting(IF any)

Utility Sifting
Remarks

Upload Files: No file chosen
Images: No file chosen

Documents: No file chosen

Is Time Extention Pending? ☐ No ☐ Yes
Rural Works Department, Govt. of Bihar
