



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

राज्य का नाम - तमिलनाडु सरुआ से नया टीला तक !

एकर नामा संख्या -

एकर नामा संख्या - 0.610 कि. मी. एकर नामा संख्या - 39,5,840-04 नाम

5 साल तक रेल-रेलवे की राशि - ₹. 1.56 लाख

कार्य प्रारम्भ करने की तिथि - 16-02-2019

कार्य समाप्त करने की तिथि -

सड़क का नाम / पता - मा. शाहबाज अली

कार्यकारी एजेंसी का पता - ग्रामीण कार्य विभाग, नगर प्रमुहल, मदुरै - 1

ग्रामीण विकास विभाग, नगर सड़क दारा संचालित।

निर्माण कार्य

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

राज्य का नाम - तमिलनाडु सरुआ से नया टीला तक !

एकर नामा संख्या - 0.610 कि. मी. एकर नामा संख्या - 39,5,840-04 नाम

5 साल तक रेल-रेलवे की राशि - ₹. 1.56 लाख

कार्य प्रारम्भ करने की तिथि - 16-02-2019

कार्य समाप्त करने की तिथि -


सड़क का नाम / पता - मा. शाहबाज अली

कार्यकारी एजेंसी का पता - ग्रामीण कार्य विभाग, नगर प्रमुहल, मदुरै - 1

ग्रामीण विकास विभाग, नगर सड़क दारा संचालित।

3. नगर की नाली 0 अन्य



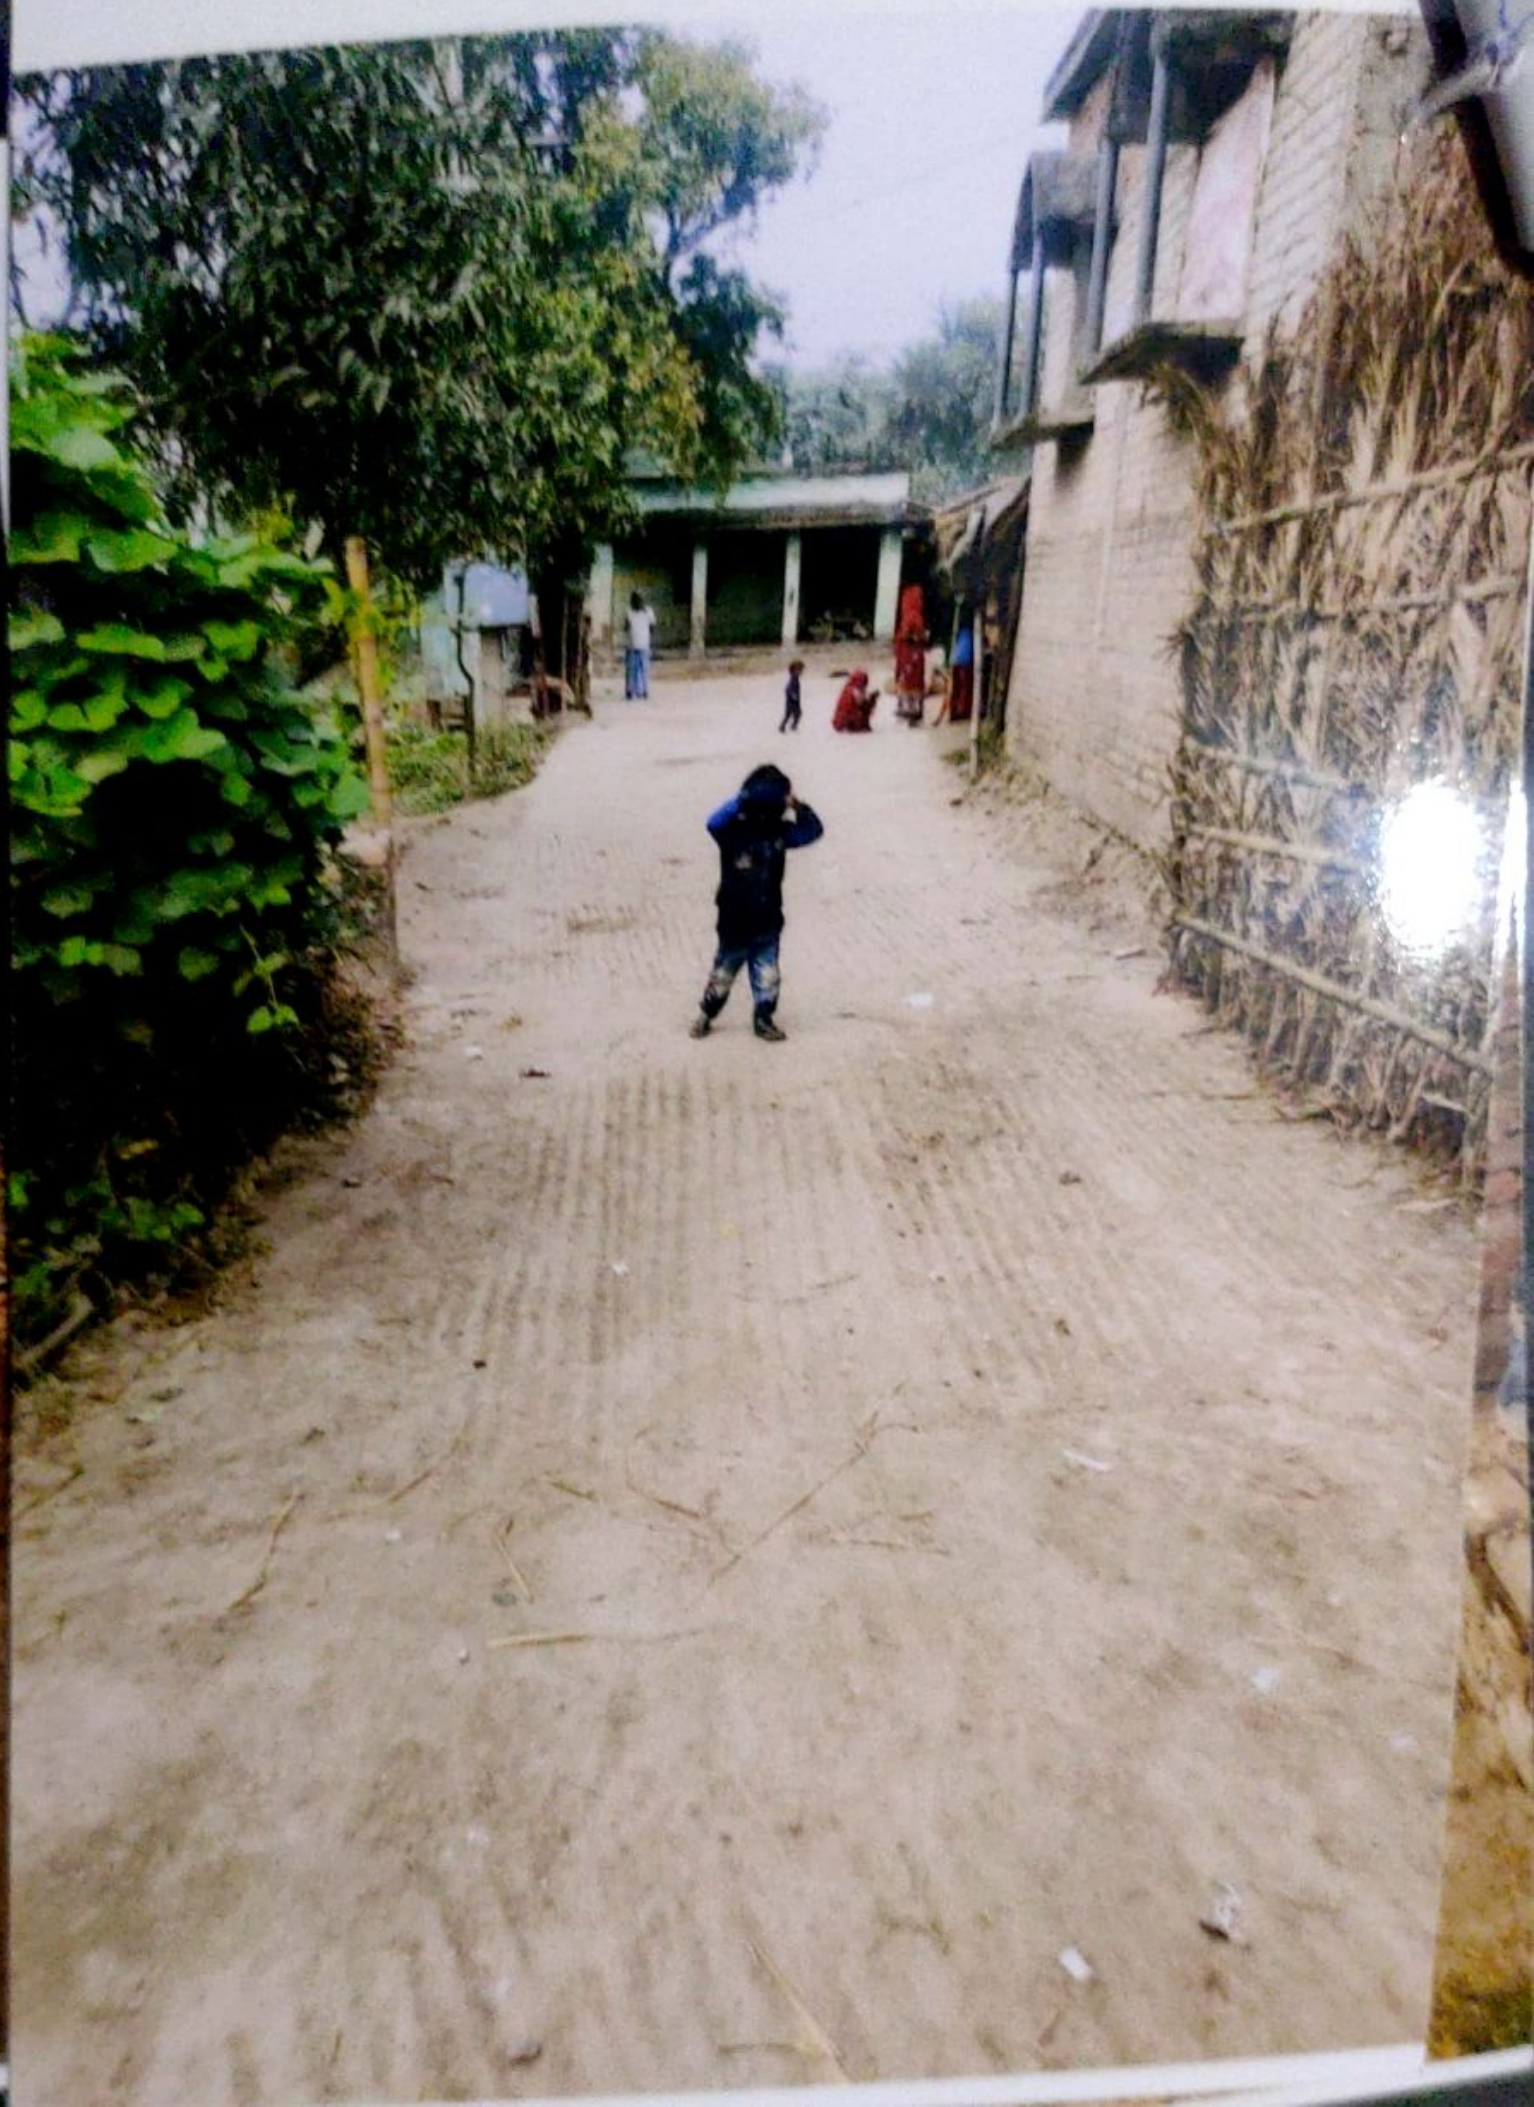





कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1

पत्रांक:- 33/2019

दिनांक:- 7/11/2019

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन लक्ष्मीपुर खरूआ से नया टोला पथ निर्माण कार्य के अग्रिम समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1 के अधीन एकरारनामा सं०- 20SBD/2019-20 MMGSY(SC)) का लक्ष्मीपुर खरूआ से नया टोला पथ निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार दिनांक-15.11.2019 को समाप्त करना था। लेकिन बीमार रहने के कारण पथ का कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।

निदेशानुसार कार्य के समय में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. समय वृद्धि हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एकरारनामा प्रावधान के तहत है।
2. समय वृद्धि के लिए अंकित कारण एकरारनामा प्रावधान के तहत मान्य है।
3. किये गये कार्य का MIS Entry प्रतिवेदन संलग्न है।
4. समय वृद्धि हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।
5. इस कार्य के विरुद्ध कोई विभागीय / निगरानी जांच लंबित नहीं है।
6. मापी पुस्तिका संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त अग्रिम समय वृद्धि पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन




कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1

समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम:- लक्ष्मीपुर खबरखा से नया टोला (MMGSY) SC
2. सवेदक का नाम:- श्री-शहवाज अली
3. एकरारनामा संख्या लागत राशि में:- 20SBD/2019-20/MMGSY(SC), 39,61,783=00
4. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि:- 16-02-2019
5. कार्य पूर्ण करने की तिथि:- 15-11-2019
6. संविदा तिथि तक कार्य की राशि:-
7. कार्य पूर्ण करने की प्रतिशत :- 55% (G.S.B, 678-III and 200Metr PCC पूर्ण हो चुका है)
8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका व्योरा :-

9. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि :- 30-05-2021
10. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित :- बीमार रहने के कारण निर्माण कार्य बाधित

11. सवेदक का हस्ताक्षर तिथि सहित :- 
12. प्रशाखा पदाधिकारी की अनुशंसा :-
~~सवेदक के कार्यप्रदर्शन प्रविष्टि की दृष्टि से कार्य पूर्ण~~
~~करने के लिए निर्माण कार्य का समय बढ़ा~~
~~दिये जा सका है।~~

13. प्रशाखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-
14. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा :- दिनांक 30/5/21 तक समय वृद्धि दिया जा सकता है।
~~निवेदन- उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर निर्माण कार्य के लक्ष्य निर्धारित समय के अंदर पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य का समय बढ़ा दिया जा रहा है।~~
~~निर्माण कार्य के अंतिम दिनांक 30/5/21 तक पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य का समय बढ़ा दिया जा रहा है।~~
~~निर्माण कार्य के अंतिम दिनांक 30/5/21 तक पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य का समय बढ़ा दिया जा रहा है।~~
15. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की हस्ताक्षर :-
16. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा :-

कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दरभंगा-1

दिनांक 30.5.2021
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
दरभंगा-1

PROP- MD SHAHWAZ ALI

AT- MOH- ISMAILGANJ, PO+PS- LAHERIASARAI, DARBHANGA BIHAR-846001
GOVT OF BIHAR RURAL WORK DEPARTMENT (REG NO- 4190134)2016TO2021
GSTIN-10AWXPA7555K2Z6

EMAIL- shahwazali.ali@gmail.com

MOB-9934336596

Ref. No

Date.....

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमोडल २ (मंडल - 1)

विषय:- समयवृद्धि स्वीकृति हेतु अनुरोध करने के संबंध में,

महोदय:-

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSB (SC) अन्तर्गत लक्ष्मीपुर खेतसा सैनपा रोला पथ निर्माण कार्य मुझे आवंटित किया गया है। एकराशनामा के अनुसार दिनांक 15.11.2019 को समाप्त करना था लेकिन बीमार रहने के कारण पथ का कार्य ससमाप्त नहीं हो सका। मेरे द्वारा कार्य स्थल पर G.S.B, Grade-III एवं 200 Meter PCC का कार्य कर दिया गया है केवल 410 Meter PCC का कार्य शेष है। उक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 30-05-2021 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

अतः श्रीमान से अनुरोध पूर्वक कहना है कि समयवृद्धि स्वीकृति हेतु अनुरोध करने की कृपया विधी जाए।

विश्वासमानजन

नाम:- मोह-शहवाज अली

पता:- इस्माइलगंज, पो+पो- लक्ष्मीसारथ

जिला- दरभंगा

(Shahwaz Ali)

08/1/21

लेख्य प्रमाणक महोदय,
शपथ पत्र दरभंगा।




शपथ पत्र

मैं Md. Shahwaz Ali, Moh.-Ismailganj, PO-Laheriasarai, PS- Laheriasarai, Dist-Darbhanga उम्र-29 वर्ष, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं MMGSY(SC) योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के अधीन पथ निर्माण कार्य आवंटित किया गया, जिसका एकारारनामा संख्या 29SBD/2019-20 है।
3. (MMGSY-SC) योजना के अंतर्गत पथ निर्माण कार्य आवंटित किया गया है।
4. उपर्युक्त पथ का निर्माण कार्य मेरे द्वारा 30.05.2021 को कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा/ गया।
5. उपरोक्त कार्य में अगर समय वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होती है तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा का मांग नहीं जाएगा।
6. यह कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे जानकारी में सत्य वो सही है।

अतः यह शपथ पत्र है।


शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

Md. Shahwaz Ali
who is identified by Mr. R. P. D.
and solemnly Affirmed and Declared
before me

Attest
Notary Public (Govt. of India)
Darbhanga

Identified by me.

Ramesh P. D.
Adv.

05.01.2021

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

Email-eerwddarbhangal@gmail.com

पत्रांक- 34.....लहेरियासराय / दिनांक- 7/1/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

विषय:- MMGSY(SC) अन्तर्गत "लक्ष्मीपुर खरूआ से नया टोला " पथ निर्माण कार्य
के समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) अन्तर्गत " लक्ष्मीपुर
खरूआ से नया टोला" पथ निर्माण कार्य के संवेदक- मो0 शहवाज अली,
रजि0 नं0-4190134 ग्राम-इस्माईलगंज, पो0-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा का नाम इस
प्रमंडल अन्तर्गत न ही काली सूची में दर्ज है और न ही डिबार सूची में दर्ज है। तथा
इसके लिए न ही अनुशंसा की गई है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ का समय वृद्धि स्वीकृत करने की कृपा की जाय।
सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

डा० संजय कुमार Dr. Sanjay Kumar

Reg. No. 35599 (BCMR Patna)
(Not for Medico Legal Purpose)

M.B.B.S., M.D., DTM&H., DNB (1)
Darbhanga Medical College & Hospital
फिलिशियन

क्लिनिक :-
बैता चौक से पश्चिम हॉस्पिटल रोड
P&P होटल के सामने वाली गली
में लहेरियासराय, दरभंगा
Mob.: 9471498298 (Clinic)
7463845071 (Clinic)

Name Mr. Shashwar Das

Age 32 Wt. 85

C/O From irregular
bleeding.

Date 27.11.2019

Dr

U 18 or less (+V)

Ad.

1) hivacin 2000
1200 x 2 for 10 days

2) Cotrimox 1500

3) 1000 x 2
for 10 days

4) Paracetamol 500
as required

1 Cap 2 times for 10 days

8/12/2019

40 From 2 weeks

U 18 or less (U 18 or less)

Ad.

1000 x 2 for 10 days
as required

1) hivacin 2000

1200 x 2 for 10 days

2) Paracetamol 500
as required

नोट :- 15 दिनों बाद फिस पुनः लगेगा। पुराना पूर्जा एवं रिपोर्ट अवश्य साथ लावे। दवा रि एक्शन करने पर बन्द कर के तुरन्त सम्पर्क करें। अथवा किसी दूसरे चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। दवा कम्पाउण्डर से अवश्य दिखा लें। दवा अपनी पसंद की दुकान से लें।
पुराना पूर्जा 12 बजे के बाद देखा जाएगा

दिल्लिज :- बैता चौक से पश्चिम हॉस्पिटल रोड, P&P होटल के सामने वाली गली में, लहेरियासराय, दरभंगा

Prevention is Better than Cure

डा० संजय कुमार Dr. Sanjay Kumar

Reg. No. 35599 (BCMR Patna)
(Not for Medico Legal Purpose)

M.B.B.S., M.D., DTM&H., DNB (1)
Darbhanga Medical College & Hospital
फिलिशियन

क्लिनिक :-
बेंता चौक से पश्चिम हॉस्पिटल रोड
P&P होटल के सामने वाली गली
में लहेरियासराय, दरभंगा
Mob.: 9471498298 (Clinic)
7463845071 (Clinic)

Name Md. Shaktiwar Das Age 32 Wt 85

C/O Leucorrhoea for 10 days
Bleeds. Pain also from
lower body last 4 days.
not a cure.

Date 3.9.219

Inv
CBC Normal.
O/A Normal - (+v)
LFT Normal
Urine Normal

Adv 1, X Monocyt - 0 (2000)
1 Lys x 2 for 5 days
2, Zentol P
3, Alex 1000 x 1
4, Cyprin 2000 x 2
5, 1000 x 2
6, 1000 x 2
7/9/19 Adv.
Monocyt (19)
Cyprin 1000 x 2
Alex 1000 x 2

PTD

नोट :- 15 दिनों बाद फिस पुनः लगेगा। पुराना पूजा एवं रिपोर्ट अवश्य साथ लावे। दवा रिक्शन करने पर बन्द कर के तुरन्त सम्पर्क करें। अथवा किसी दूसरे चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। दवा कम्पाउण्डर से अवश्य दिखा लें। दवा अपनी पसंद की दूकान से लें।
पुराना पूजा 12 बजे के बाद देखा जाएगा
क्लिनिक :- बेंता चौक से पश्चिम हॉस्पिटल रोड, P&P होटल के सामने वाली गली में, लहेरियासराय, दरभंगा
Prevention is Better than Cure

Consultant :

Dr. R.K. Singh

M.B.B.S., M.D.

Md. N. Alam

DMLT (Patho)



JUBILEE DIAGNOSTIC CENTRE

Benta Chowk, Laheriasarai, Darbhanga

Mob.: 8434047394

PATIENT NAME : MD. SHAHWAZ. ALI

AGE : 32 Y

SEX :

REF. NO. : J-10303

DATE : Thu 28-11-2019

REF. BY DR. : SANJAY KUMAR MD

WIDAL TEST

S. typhae 'O'
S. typhae 'H'
S. para typhae 'AH'
S. para typhae 'BH'

AGGLUTIN. TITRE

+ve upto 1:320

+ve upto 1:160

Negative

Negative


SIGNATURE

Your Health is Our Concern

Rural Works Department, Govt. of Bihar



Welcome: PIUDarbhanga-1
Wing:-CE-3, Patna
Circle:-Darbhanga
Division:-Darbhanga-1
No Of Visit:-28

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports OMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request Contractors Debar Class 1 Road Format Time Extension
Contractors Black List Maintenance Contractor Revoke Flood/Rain Damage Roads Poorak Core Network Crash Inspection Contractor Emergent Repair User Registration Maintenance Allotment Road / Bridge Allotment
Maintenance Observation Offline Inspection Left Habitation Survey

MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme MMGSY(SC)

Fin Year All

Name of Road(English) LAXMIPUR KHARUA to NAYA TOL(On-going)

DPR Submitted

Technical Approval Amount: 39.73300

Length(In KM:) 0.610

Amount: 39.61783

Amount: 39.73300

Length(In KM:) 0.610

Administrative Sanction / Administrative Approva

Length(In KM:) 0.610

Amount: 38.05389

Length(In KM:) 0.610

Amount: 39.73300

Length(In KM:) 0.610

Updated Expenditure (Maintenance Amt)

Amount: 0.000

Amount: 38.053890

Length(In KM:) 0.610

Date

Date: 1/1/1900 1: --

Agreement

Main Work Amt: 38.006660

Maintenance Amt: 1.561580

Expenditure(In Lakhs)

Upto 31/03/20: 0.000000

Upto Last Month: 0.000000

Sub Base(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.610

Base(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.610

Surface(In KM)

Upto 31/03/20: 0.000

Upto Last Month: 0.000

Project Status: On-going

No of Habitations: 1

Environmental Social Management & Framework

Connected Habitations: 0

Remarks: PCC in Progi

https://sqms.rwdbihar.gov.in/Entry/RoadMonthlyProgress.aspx

Signature
01/04
