

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

संचिका सं० - ५१७

पत्रांक: ५१७ म३/

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

जहानाबाद, दिनांक: २६.१२.२०२०

विषय :- राज्य योजना नाबार्ड अन्तर्गत ग्राम बन्धुच से गंगाचक रोजिया पथ निर्माण कार्य का समय वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स जय माता दी इन्टरप्राइजेज, प्रो०- श्री वेदनारायण सिंह, ग्राम- कनसारा, पो०- कोचहसा, थाना- किंजर, जिला- अरवल के द्वारा विषयांकित कार्य कराया जा रहा है जिसका एकरारनामा संख्या 35/SBD/ /2018-19 के तहत कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.03.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 06.03.2020 है। उक्त योजना के रेखांकन में नीजी जमीन होने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु इसकी समय वृद्धि हेतु संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 26.12.2020 तक समय की वृद्धि हेतु अनुशंसा प्राप्त है।

अतः सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विहित प्रपत्र में आवेदन मूल में, मापी पुस्तिका की छायाप्रति अभिप्रमाणित, कराये गये कार्य का फोटो के साथ दिनांक 26.12.2020 तक समय वृद्धि के अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर समर्पित की जाती है।

अनु०- (1) आवेदन मूल में

(2) मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(3) शपथ पत्र मूल में।

(4) कार्य का फोटोग्राफ

विश्वासभाजन

२६.१२.२०२०


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

२६.१२.२०२०




○ प्रोजेक्ट का नाम:- आठ बंधु चक से अंगा चक रेजिवा

योजना का नाम:- ग्राम बंधु चक्र से बांका चक्र रोजिया

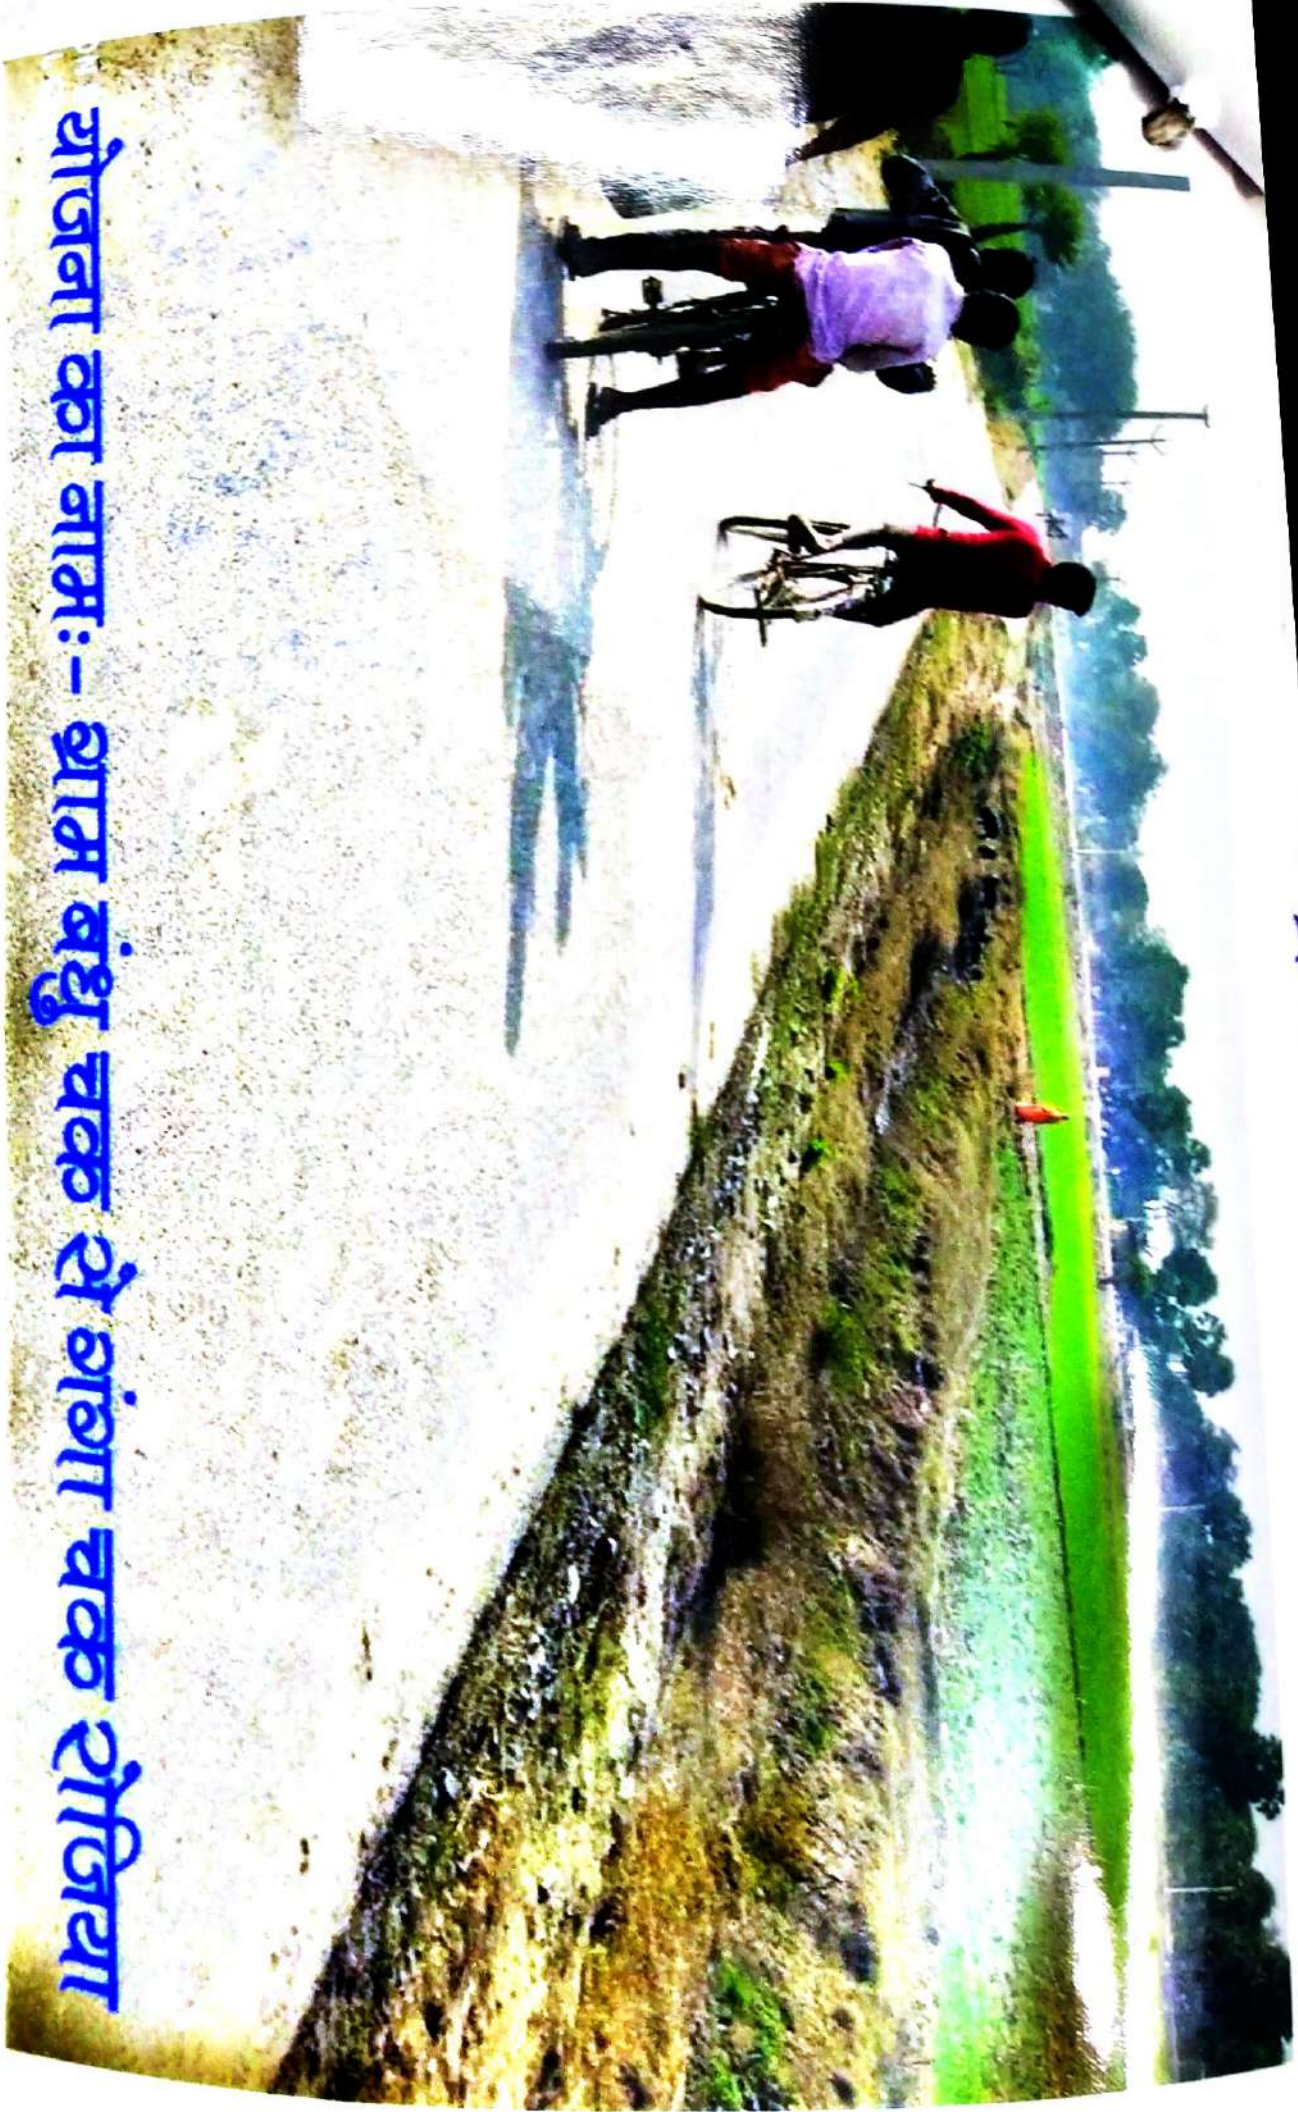

સાંચી સ્થૂપની આસપાસની સ્થિતિ

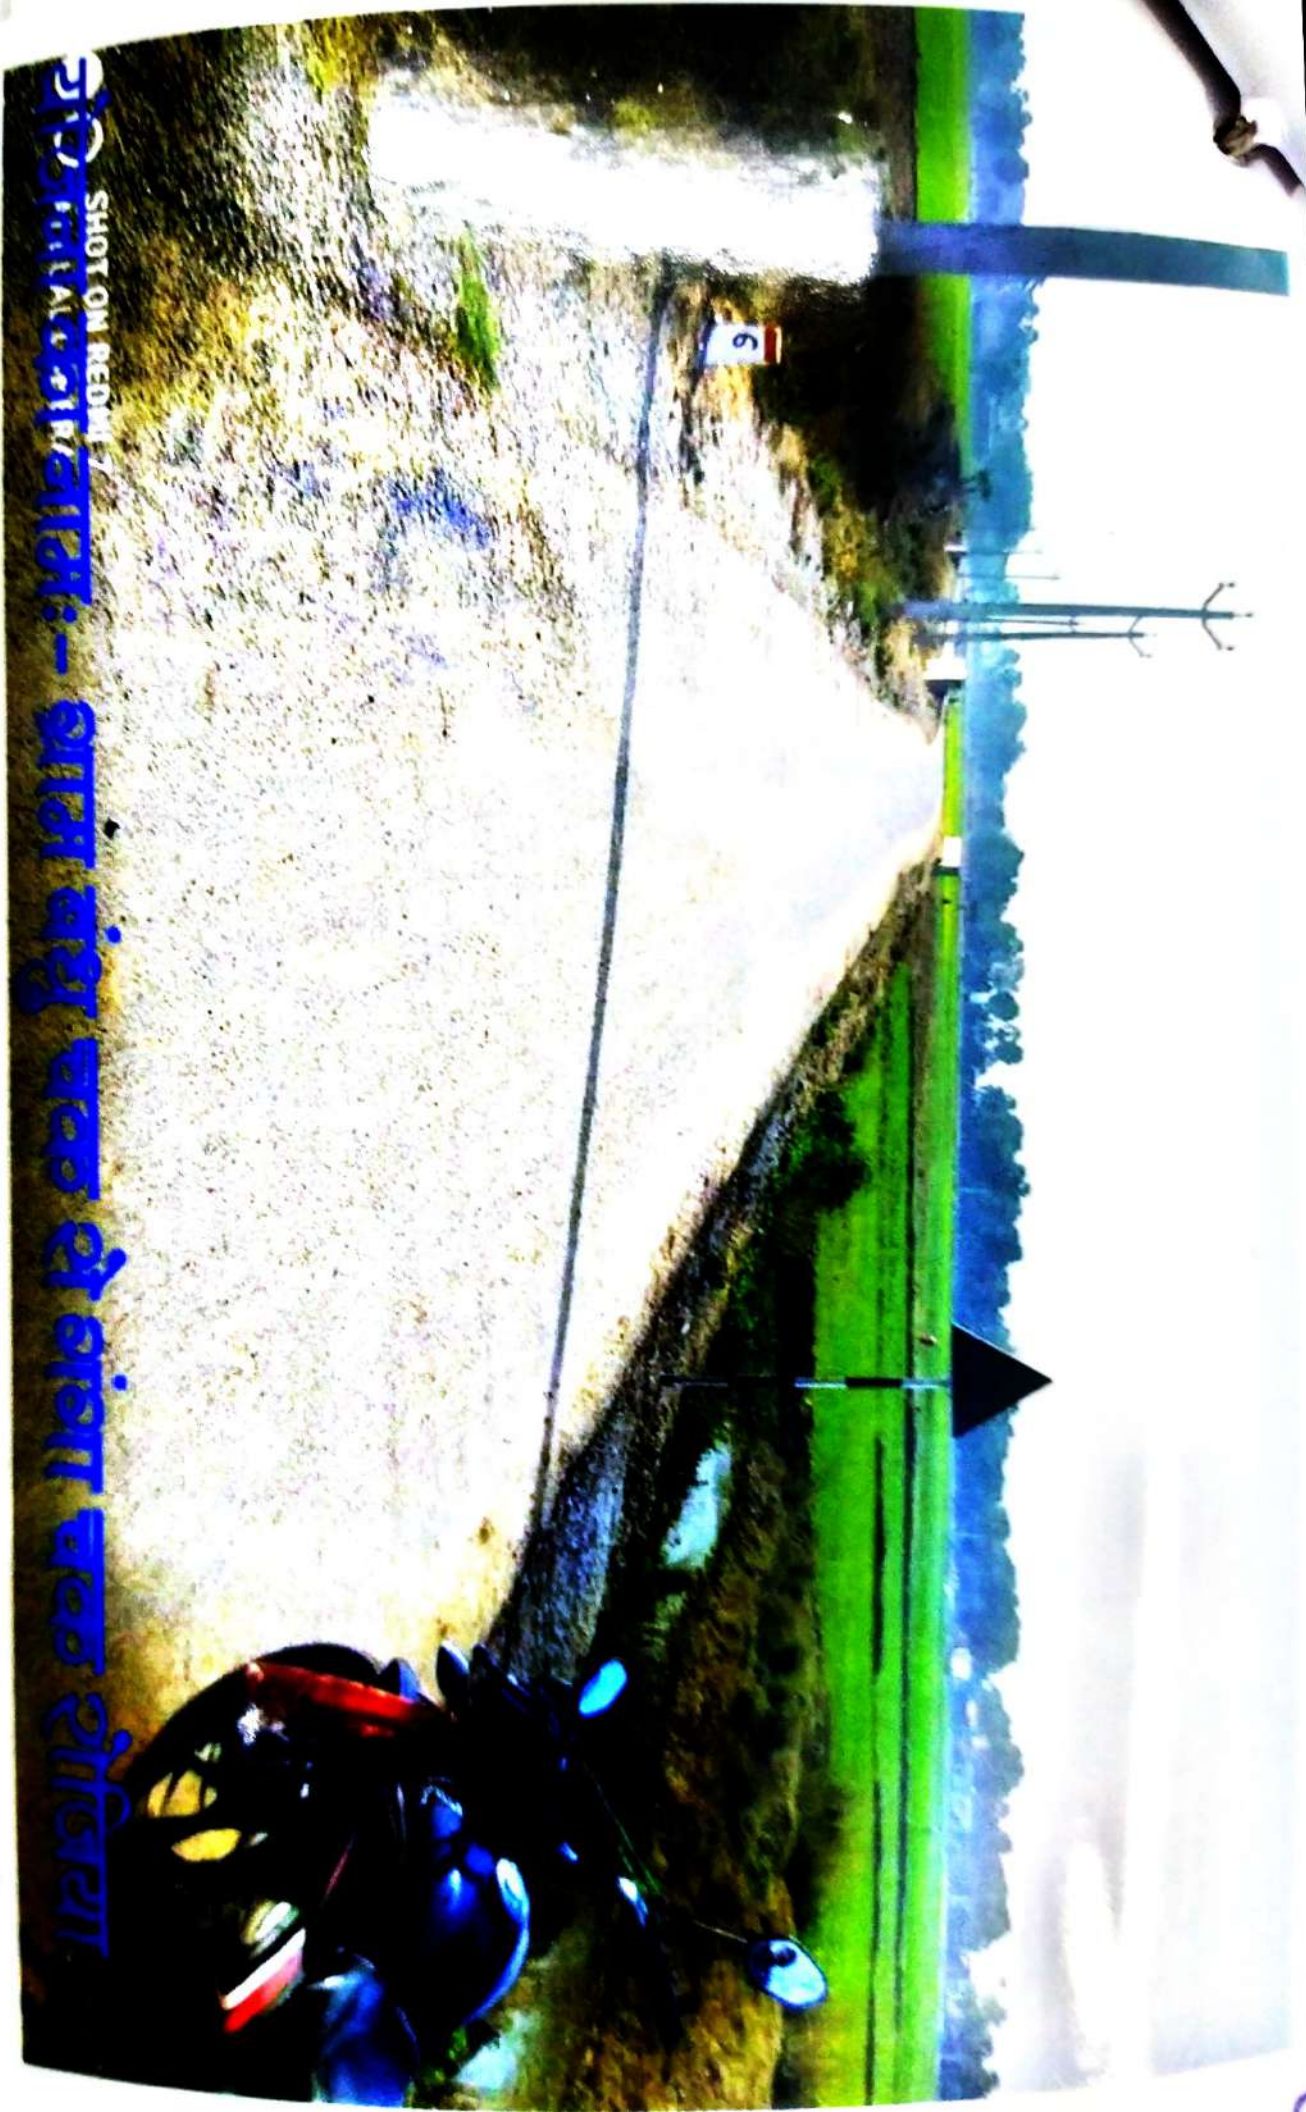

SHOT ON REDMI 7

જોડવામાં આવેલા છે:-- સાંચી સ્થૂપ તથા તેની આસપાસની સ્થિતિ

ਪੋਖਰਾ ਕਾ ਨਾਮ:- ਭਾਮ ਬੰਦੂ ਚਕ ਦੇ ਭਾਂਗਾ ਚਕ ਦੇਭਿਯਾ



योजना का नाम:- ग्राम बंधु चक्र से अंगार चक्र से लिया

યોજના કા નામ:- શ્યામ બંધુ ચક્ક રો અંગા ચક્ક રો બિયા



શ્યામ બંધુ.

SHOT
AI DU

योजना का नाम ग्राम बंधु चक रै ठांगा चक रै ठिब्या



VR

ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਮ ਬੰਦੁਚਕ ਦੇ ਲਾਂਬਾਚਕ ਦੇ ਯੋਜਨਾ



ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਨਾਮ:-ਬੰਡੂ ਚਕ ਦੇ ਭਾਂਗਾ ਚਕ ਦੇਖਿਆ



ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਨਾਮ:- ਭਾਮ ਬੰਦੂ ਚਕ ਦੇ ਾਂਗਾ ਚਕ ਦੇਹਿਵਾ



ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਨਾਮ:- ਭਾਮ ਬੰਦੂ ਚਕ ਦੇ ਅੰਬਾ ਚਕ ਦੇ ਭਿਵਾ



योजना का नाम:- ग्राम बंधु चक से गांवा चक रोडिया



2018-19



ON
le C...
श्री राजना का नाम:- ग्राम बंधु चक री अंगा चक री जिवा

પોતાના વન નામ:- શામ બંધુ ચક્ર સે અંગા ચક્ર રોડિયા



योगदान का नाम:- ग्राम बंधु चक से जंगल चक रोडिया



● ये जिन्ना का नाम:- श्याम बंधु चक से बांभा चक रोडिया



APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of contractor :- M/S Jay Mata Di Enterprises.
2. Name of work :- Village Banathy Chak to Ganga Chak Rojya.
(Head of Expenditure) (NABARD)
3. Agreement Number :- 35 SBD/2018-19
4. Agreement Value :- 93,27,870=00
5. Date of Commencement of Work :- 07/03/2019
6. Date of Completion Stipulated in The Agreement :- 06/03/2020
7. Period for Which Extension Has Been Given Previously :- NA
8. Work Done in % :- 100%.
9. Period For Which Extension Now Applied for :- 26/12/2020 to
10. Reason For Extension of Time :- dispute Land in Road Alignment and COVID 19 (MUST)
11. Recommendation By J.E :- Work suspended due to Covid-19 & Land disputed. So Time Extension may be granted.
12. Whether Programme of Work Approved :- Yes
02/02/21
13. Whether Fund Available :- NO
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Year Included in the Current

Work Programme or not :- — NIL

15. Recommendation by S.D.O work delayed due to land dispute, and work has been completed, Hence time extension may be granted.
16. Recommendation by Executive Eng :- OK
2/2/21
17. Recommendation by S.E :-

Executive Engineer
A. W. D. (W) Division
Jehanabad

M/S Jay Mata Di Enterprises
Genl Mgr
Proprietor

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र।

पत्रांक 222 / जहानाबाद, दिनांक 2/2/2021 /

वेतलस जय साता दी इन्टरप्राइजेज, प्रो०- श्री वेदनारायण सिंह, ग्राम- कनसारा,
पो०- कोवहसा, थाना- किन्जर, जिला- अरवल के द्वारा इस प्रमंडल के
अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य पूर्ण किया गया है।

क्र.	योजना का नाम	एकरास्तामा संख्या	आवकलित राशि (लाख में)	एकरास्तामा की राशि (लाख में)	कार्य समाप्ति की तिथि	अभियुक्ति।
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of road from Village Sandhuchak to Gangachak - Rqjia Under NASARD.	35/S&D/ 2018-19	98.560	93.27870	28.12.20	कार्य पूर्ण।

इनके द्वारा कराया गया कार्य पूर्ण एवं संतोषजनक है।

6/1/2021
2.2.2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।
02/02/2021



Mob:- 8864086630

MS. JAY MATA DI ENTERPRISES

Proprietor : VED NARAYAN SINGH

Reg. No- RWD-2160759

Vill- Kansara, PO-Kochhasa, Dist-Arwal

E-mail : ved90narayan@gmail.com

Ref. no

कोषाग्रे

Date: 02/02/2020

कार्पोरेट अफिशियल
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्पोरेट अफिशियल

विषय:— अर्थोपचारण ला 35580/2019-19 में समग्र वृद्धि हेतु

महोदय

सुरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जहाँसो जहाँसो

के अन्तर्गत ग्राम कल्याणक है जहाँ एक रेसिप्स पत्र का अन्तर्गत
मिथि दिनांक 6/3/20 है जहाँ के प्रारम्भिक लागू है जहाँसो 65
मिटर है जहाँसो जहाँसो है। निर्माण कार्य अर्द्ध समय-सु मजदूर के साथ
है जहाँसो जहाँसो का कार्य करी है मना किया गया। सुमरित है स्वयंसेवक
सुरोक्त कार्य को जो जहाँसो का मुकाम जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो
जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो
विमर्शित लाईट जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो

जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो

इस जहाँसो को पूर्ण करने के लिए ध. न. का समग्र वृद्धि करने की हृष्य
की जायस जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो जहाँसो

आपका विश्वासपूर्ण

Ms Jay Mata Di Enterprises

वेद नारायण सिंह
Proprietor

02/02/20



Mob:- 8864085630

M/S. JAY MATA DI ENTERPRISES

Proprietor : VED NARAYAN SINGH

Reg. No- RWD-2160759

Vill- Kansara, PO-Kochhasa, Dist-Arwal

E-mail : ved90narayan@gmail.com

Ref. ००

Date. 07/12/2019

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

ग्रा० कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल जहानाबाद

विषय:- नवार्ड योजना अन्तर्गत बन्धु चक से गंगा चक रोजिया पथ निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक 1850 दिनांक 26/11/2019

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय को सम्बन्ध में कहना है कि इस पथ का प्रारंभिक स्थान (Starting Point) बन्धुचक से प्रारंभ होता है। प्रारंभिक स्थान से 60 मीटर तक रैयती जमीन है जमीन मालिक से स्यम बात किया पर उनलोगों के द्वारा जमीन का मुआवजा कि मांग कि गई, जिसकी सुचना कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को मौखिक मेरे द्वारा दी जा चुकी है। जमीन मालिक के द्वारा गाड़ी का आवागमन भी नहीं करने दिया जा रहा है, प्रारंभिक स्थान से 60 मीटर के बाद पुरा पथ में प्राकलन के प्रावधान के अनुसार मिट्टी, सबग्रेड का कार्य तथा हुम्पपाईप पुलिया का निर्माण करा दिया गया है। इस पथ का (G.S.B) की दुलाई अन्य ग्रामीण पथों के द्वारा कराई जा रही थी तो श्रीमान् के द्वारा दिनांक 30/10/19 को मोबाईल फोन के माध्यम से (G.S.B) दुलाई का कार्य बंद करने को कहा गया।

क्या रैयती भूमि पर (जबरदस्ती) बल प्रयोग कर पथ का निर्माण कार्य करना उचित है?

अतः श्रीमान् से नम्रनिवेद है कि अपने स्तर से प्रारंभिक 60 मीटर की लम्बाई में पथ निर्माण हेतु शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जाए ताकि मैं पथ निर्माण ससमय कर सकू।

विश्वासभाजन

M/s Jay Mata Di Enterprises

VED NARAYAN SINGH
Proprietor

☎ : 8864085630 , 9262715441

M/S JAY MATA DI ENTERPRISES

Proprietor :- VEDNARAYAN SINGH

ADDRESS:- VILL- KANSARA, P.O-KOEHASA, P.S-KINIER, DIST- ARWAL, PIN -804426

Reg No:- RWD2191179 , MWRD0120C3PR1588

Email Id:- ved90narayan@gmail.com

Ref:- 02

Date:- 21.11.2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

विषय:- शीर्ष राज्य योजना अन्तर्गत ग्राम बंधुचक से गंगाचक रोजिया पथ निर्माण कार्य के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित के आलोक में सादर सूचित करना है कि ग्राम बंधुचक से गंगाचक रोजिया पथ में दिनांक 06.11.2020 को कालीकरण का कार्य चल रहा था। उक्त पथ में ग्राम बंधुचक के निकट कुछ ग्रामीणों द्वारा जबरदस्ती 5 ट्रेक्टर (पच्चीस टन) माल को 50 मीटर लंबाई में बिछा दिया गया जिससे मेरा नुकसान हो गया। मेरा लेबर मेट को गाली गलौज किया गया और धमकी दिया गया कि मेरे अनुसार कार्य नहीं करोगे तो बचा कार्य नहीं करने देंगे। वर्तमान में पथ निर्माण कार्य बंद है। इस परिस्थिति में पथ का कार्य करने के लिए पुलिस अभिरक्षा की जरूरत है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के देख-रेख हेतु उपस्थित रहने एवं पुलिस अभिरक्षा में पथ के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

VEDNARAYAN SINGH

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

संयुक्त सं०

पत्रांक: 1637/अनु०/

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
पाली, जहानाबाद।

जहानाबाद, दिनांक: 09-11-2020

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत ग्राम बंधुचक से गंगाचक रोजिया पथ निर्माण के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयांकित के आलोक में सादर सूचित करना है कि "ग्राम बंधुचक से गंगाचक रोजिया पथ" के कालीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन दिनांक 06.11.2020 को ग्रामीणों के द्वारा गलत तरीके से पथ में प्रयोग किए जाने वाले पीछ को बर्बाद कर दिया एवं उनके द्वारा प्राक्कलन से अलग हटकर कार्य करने हेतु संवेदक पर दबाव डाल रहे हैं तथा स्थल पर गाली-गलौज भी कर रहे हैं। उनके द्वारा यह भी धमकी दिया गया कि ऐसा नहीं करने पर शेष कार्य को करने नहीं दिया जायेगा। वर्तमान में संवेदक द्वारा स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ में शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु उचित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाय।

विश्वासभाजन

[Signature]
9.11.2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
जहानाबाद।

**कार्यपालक अभिर्यता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद।**

संघिका सं०

पत्रांक:

प्रेषक,

कार्यपालक अभिर्यता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद।

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
पाली, जहानाबाद।

जहानाबाद, दिनांक:

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत ग्राम बंधुचक से गंगाचक रोजिया पथ निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित के आलोक में सादर सूचित करना है कि " ग्राम बंधुचक से गंगाचक रोजिया पथ" के कालीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन दिनांक 06.11.2020 को ग्रामीणों के द्वारा गलत तरीके से पथ में प्रयोग किए जाने वाले पीछ को बर्बाद कर दिया एवं उनके द्वारा प्राक्कलन से अलग हटकर कार्य करने हेतु संवेदक पर तबाव डाल रहे हैं तथा स्थल पर गाली-गलौज भी कर रहे हैं। उनके द्वारा यह भी धमकी दिया गया कि ऐसा नहीं करने पर शेष कार्य को करने नहीं दिया जायेगा। वर्तमान में संवेदक द्वारा स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ में शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु उचित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाय।

विश्वासभाजन

20/

कार्यपालक अभिर्यता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,
जहानाबाद।

ज्ञापक 1637 आ५० /

जहानाबाद, दिनांक 09-11-2020

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

9/11/2020
कार्यपालक अभिर्यता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,
जहानाबाद।

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



HS 0001475960

DATE & TIME :

24-FEB-2021 12:02:13

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT JEHANABAD

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT2416B2149L952

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)



BRCT2416B2149L952

Statutory Alert :
details on this re
Authority. This re



1. Any discrepancy in the
ase inform the Competent

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक नोटरी

जहानाबाद।

शपथ - पत्र

मैं मेसर्स जय माता दी इन्टरप्राइजेज प्रो० - वेद नारायण सिंह ग्राम - कन्सारा, पो० - कोचहसा, थाना - किजंर, जिला - अरवल (बिहार) का स्थायी निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक सत्य व निष्ठापूर्वक उद्घोषणा करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं ग्रामीण कार्य विभाग का निबंधित संवेदक हूँ।
2. यह कि ग्राम बन्धुचक से गंगाचक रोजिया पथ निर्माण कार्य दिनांक 07.03.2019 को शुरू हुआ।
3. यह कि एक वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण करना था।
4. यह कि मैं दिनांक 26.12.2020 को निर्माण कार्य समाप्त कर दिया हूँ।
5. यह कि पथ के आरेखन में निजी जमीन होने के कारण कार्य सससय पूर्ण नहीं हो पाया है।
6. यह कि उक्त पथ का निर्माण का एकरानामा संख्या 35/SBD/2018-2019 एवं मापीपुस्त संख्या 2553 है।
7. यह कि इस योजना में दिनांक 26.12.2020 तक कि समय वृद्धि जरूरी है।
8. यह कि उक्त पथ निर्माण में समयावधि बढ़ाकर मुझे बकाया राशि का अविलम्ब भुगतान किये जाने की आवश्यकता है।
9. यह कि समयवृद्धि मिलने के उपरान्त मैं किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करूंगा।
10. यह कि मेरे द्वारा उद्घाषित बातें सही एवं सत्य है।

अधिवक्ता

[Signature]
24.12.2021

लेख्य प्रमाण नोटरी
जहानाबाद।

[Signature]
सपथकर्ता
24.12.2021
Notary
JEHANABAD



Notary
JEHANABAD

PAID

253

Remitted to Gangaachak Kosi

Schedule XLV-Form No. 134

EE. Roy (W) Jehanabad DIVISION

AE. Roy (W) Koko SUB-DIVISION

2553

Measurement Book

Alc 321644750 95

Attested.

26/2/2021

Executive Engineer
W. D. (W) Division
Jehanabad
26/02/2021

1
