

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक ५१३(३/२१) /पटना, दिनांक १०/०३/२०२१

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना ।

विषय :-

शीर्ष-3054 (गरम्माति) बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति-2018 योजना अन्तर्गत "REPAIR & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD (1) FROM DUMARI SULTANPUR ROAD PMGSY ROAD TO KHOKHANA (2) FROM DUMARI DUMARI DAULATPUR ROAD TO CHAK SULTANPUR IN BLOCK FATUHA IN BLOCK FATUHA OF PACKAGE NO.-MR-N/19-20/PATNA/06" निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसागिक पत्र के संदर्भ में कहना है शीर्ष-3054 (गरम्माति) बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति-2018 योजना अन्तर्गत "REPAIR & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD (1) FROM DUMARI SULTANPUR ROAD PMGSY ROAD TO KHOKHANA (2) FROM DUMARI DUMARI DAULATPUR ROAD TO CHAK SULTANPUR IN BLOCK FATUHA OF PACKAGE NO.-MR-N/19-20/PATNA/06" निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है ।

योजना का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है ।

1. स्थल विडियो गाफी का सी.डी.
2. दिनांक- ०१/३/२०२१ को स्थल निरीक्षण किया जा चुका है और कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पाया गया है ।
3. (i) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि-02.12.2019 है ।
(ii) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि-01.09.2020 है ।
(iii) कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तिथि-30.04.2021 है ।
4. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है । अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है ।
5. संलग्न सी.डी.- 1 अदद ।
6. फोटोग्राफ- अदद मूल में ।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय ।

अनु:- यथोक्त ।

विश्वासभोजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- BABA HANS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.,
ANANDPURI WEST BORING CANAL ROAD,
PATNA
2. Name of Work :- "REPAIR & FIVE YEARS MAINTENANCE OF
ROAD (1) FROM DUMARI SULTANPUR ROAD
PMGSY ROAD TO KHOKHANA (2) FROM
~~DUMARI~~ DUMARI DAULATPUR ROAD TO
CHAK SULTANPUR IN BLOCK FATUHA OF
PACKAGE NO.-MR-N/19-20/PATNA/06"
(Head of Expenditure) 3054(MR) BIHAR GRAMIN PATH NAI
ANURAKSHAN NITI 2018
3. Agreement No. :- 09-MBD/2019-20
4. Agreement Amount :- (1) Rs. 49,23,966.00 (2) Rs. 106,19,814.00
5. Date of Commencement of Work :- 02.12.2019
6. Date of Completion stipulated in the Agreement :- 01.09.2020
7. Period of Which Extension has been given previously :- No
8. Work done % :- 60 %
9. Period for which Extension now Applied for :- 30.04.2021
10. Reason for delay given by Contractor :- ① Coronavirus
② Land Dispute
fsh
11. Recommendation by J. E. :- Extension of Time may be granted
due to above reasons. fsh
5/3/2021
J.E.
12. Whether Programme of work approved :-
13. Whether fund available :-
14. If spill over from previous financial :-
15. Year whether included in the current :-
16. Work Programme or not :-
17. Recommendation of A. E. :- The above mentioned reason seems to be correct
Hence, extension of time may be granted.
fsh
05/03/21
Executive Engineer
R.W.D. (W) S Division
Patna
18. Recommendation of Executive Engineer :-
19. Recommendation of S. E. :-

Signature by Contractor



11/5/2011... Bebe (Bebe) Landry (Bebe) Landry
Deponent's Signature/L.T.I.

No. 939 Date 05/3/2017

ARUN KUMAR
NOTARY PUBLIC

ABA HANS CONSTRUCTIONS PVT. LTD., ANANDPURI WEST BORING
AL ROAD, PATNA शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ ।

यह कि मैं शीर्ष-3054 (गरम्भति) बिहार सागीण पथ नई अनुरक्षण नीति-2018 योजना अन्तर्गत "REPAIR & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD (1) FROM DUMARI SULTANPUR ROAD PMGSY ROAD TO KHOKHANA (2) FROM ~~XXXXXXXXXX~~ DUMARI DAULATPUR ROAD TO CHAK SULTANPUR IN BLOCK FATUHA OF PACKAGE NO.-MR-N/19-20/PATNA/06" का निर्माण कार्य जिसका एकरारनामा संख्या-09-MBD/2019-2020 है ।

2. यह कि उपरोक्त कार्य प्रारंभ करते समय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विवाद होने के कारण कार्य विलम्ब हुआ।
3. यह कि उपरोक्त कार्य में कोरोना के चलते कार्य में विलम्ब हुआ है।
4. यह कि उपरोक्त कार्य में विगत वर्ष भारी वर्षा होने के कारण कार्य बंद करना पड़ा जिसके कारण कार्य काफी विलम्ब हुआ।
5. यह कि उक्त कार्य मेरे द्वारा दिनांक-30.04.2021 को पूर्ण कर दिया जा रहा, अतएव दिनांक-30.04.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाय।

यह कि उपरोक्त बातें हमारी जानकारी में सही वो सत्य है ।



Identify the notary's signature
L.T.I. who has/have affirmed in
My Presence

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Cr. No.

VOID

ZK 0000254837

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :

03-MAR-2021 14:26:13

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREJ INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT, PATNA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0347C2123O491


e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 50

(Rupees Fifty Only)



BRCT0347C2123O491



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcesstamp.com details of this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Civil

VOID

ZK 0000254838

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :

03-MAR-2021 14:26:19

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREJ INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT, PATNA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0347C2123O492

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 50

(Rupees Fifty Only)



BRCT0347C2123O492



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.biharcourt.gov.in in case of any discrepancy in the details of this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

हुहॉ उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र संख्या-33

प्रखण्ड-फतुहॉ (पटना)

रंजन राम
(जिला परिषद सदस्य)

ग्राम+पो०-दौलतपुर गाँधी टोला
थाना-गौरीचक, पटना-803201
☎: 7463802552

पत्रांक D6/21

दिनांक : 02/03/2021

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़।

विषय :- डुमरी सुलतानपुर रोड से खोखना पथ में जमीन विवाद के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि खोखना गाँव में ग्रामीण श्री विनोद शर्मा द्वारा सड़क में अपना निजी जमीन बताकर सड़क के मरम्मत का कार्य बाधित किया गया था। जिसे स्थानीय ग्रामीणों की आपसी सहमति से जमीन विवाद को समाप्त कर दिया है तथा सविदक द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

विश्वासभाजन

रंजन राम
सदस्य
जिला परिषद क्षेत्र सं०-33
प्रखण्ड-फतुहॉ (पटना)

तुहौं उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र संख्या-33

प्रखण्ड-फतुहौं (पटना)

रंजन राम

(जिला परिषद सदस्य)

ग्राम+पो0-दौलतपुर गाँधी टोला

थाना-गौरीचक, पटना-803201

☎ : 7463802552

पत्रांक D6/21

दिनांक : 02/03/2021

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, बाढ़।

विषय :- डुमरी सुलतानपुर रोड से खोखना पथ में जमीन विवाद के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि खोखना गाँव में ग्रामीण श्री विनोद शर्मा द्वारा सड़क में अपना निजी जमीन बताकर सड़क के गरम्भति का कार्य बाधित किया गया था। जिसे स्थानीय ग्रामीणों की आपसी सहमति से जमीन विवाद को समाप्त कर दिया है तथा सविदक द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

विश्वासभाजन

रंजन राम

सदस्य

जिला परिषद् क्षेत्र सं०-33
प्रखण्ड-फतुहौं (पटना)

मुहौ उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र संख्या-33

प्रखण्ड-फतुहौ (पटना)

रंजन राम
(जिला परिषद सदस्य)

ग्राम+पो-दौलतपुर गाँधी टोला
थाना-गौरीचक, पटना-803201
☎: 7463802552

पत्रांक : 07/21

दिनांक : 09/03/2021.

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़।

विषय :- डुमरी दौलतपुर रोड से चक सुलतानपुर पथ में जमीन विवाद के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण श्री धीरज कुमार, ग्राम-सुलतानपुर एवं श्री ग्रामीण असफी यादव, ग्राम-नथुपुर द्वारा सड़क में अपना निजी जमीन बताकर सड़क के मरम्मत का कार्य बाधित किया गया था। जिसे स्थानीय ग्रामीणों की आपसी सहमति से जमीन विवाद को समाप्त कर दिया है तथा संवेदक द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

विश्वासभाजन

रंजन राम

सदस्य

जिला परिषद क्षेत्र सं-33
प्रखण्ड-फतुहौ (पटना)

DELL



सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम

योजना का नाम - सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम
 पथ की लंबाई - 1.000 कि.मी. वि. नं. 1.000 कि.मी. से 1.000 कि.मी.
 तकसिमा नं. 51. 591. 1472 - पथ का रुत नं. 1.000 कि.मी. से 1.000 कि.मी.
 पुनरुद्धार
 कार्य प्रारंभ की तिथि - 02.12.2019 कार्य समाप्ति की तिथि - 01.01.2020
 लेबल का नाम - बाबा सुभाष केंद्र, सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम
 कार्यकारी अधिकारी - कार्य, सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम

SPARK

विज्ञापन

सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम


योजना का नाम - सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम
 पथ की लंबाई - 1.000 कि.मी. वि. नं. 1.000 कि.मी. से 1.000 कि.मी.
 तकसिमा नं. 51. 591. 1472 - पथ का रुत नं. 1.000 कि.मी. से 1.000 कि.मी.
 पुनरुद्धार
 कार्य प्रारंभ की तिथि - 02.12.2019 कार्य समाप्ति की तिथि - 01.01.2020
 लेबल का नाम - बाबा सुभाष केंद्र, सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम
 कार्यकारी अधिकारी - कार्य, सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर	कुल
1.	सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्य	1.000 कि.मी.	1.000	1.000
2.	सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्य	1.000 कि.मी.	1.000	1.000
3.	सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्य	1.000 कि.मी.	1.000	1.000
4.	सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्य	1.000 कि.मी.	1.000	1.000
5.	सुसज्जित और आधुनिक पथ पुनरुद्धार कार्य	1.000 कि.मी.	1.000	1.000

SPARK



Joseph
 5/03/2021
 05.03.21

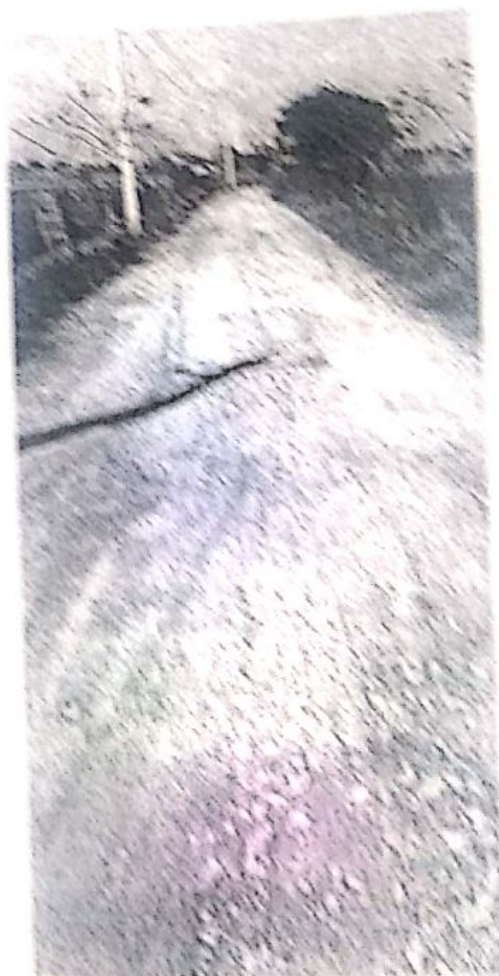

Chap
5/23/2021
J.D.

Mark
05/23/21
