

IN : 10365708009

.I. Number : U45400BR2011PTC017652

Mob. : 9030224936, 9852451492, 9284400555

EKTA RAJ CONSTRUCTION AND SERVICES PVT. LTD.

(ERCS Pvt. Ltd.)

Incorporated under the Companies Act. 1956

Nagarpalika Market, Near SBI Main Branch, Begusarai

Ref. :

Date : 15-8-21

सेवा में

कार्पेणालक अभियेता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्पे प्रमण्डल वलिया

विषय : - मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत
PMGSY रोड से पवन भादव होला पथ में समग्र
वृद्धि के सेवेद्य में।

प्रसंग - 13 (SBD) PMGSY (SC) 2020-21

महोदय निवेदन पूर्वक कहना है कि विषयोक्ति कार्य को
दिनांक - 21-9-21 तक पूर्ण करना था परन्तु स्थल
पर भूमि विवाद के चलते कार्य अभी पूर्ण नहीं
हुआ है जमीन भापी के वाद - 3 से 4 माह में
कार्य पूर्ण करा दूंगा।

अतः श्री भाग से अनुरोध है कि अपरोक्त
कार्य को ध्यान में रखते हुए समग्र वृद्धि की
स्वीकृति प्रदान करने की कृपा के लिये
विश्वास भागनी

Carriery/ATM
विवरण

EKTA RAJ CONSTRUCTION
AND SERVICES PVT. LTD
Rubi Kumari
Director

15-8-21


APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- 1 Name of Contractor :- Ektaraj construction & services pvt. Ltd.
- 2 Name of Work :- construction of road from PMGSY Road to power yard at Tola.
- 3 Agreement No. and Date :- 13/MMGSY (39/380/2020-21
- 4 Agreement Value :- 1.02.03.707 = 0
- 5 Date of Work order :- 22/9/2020
- 6 Contract date of Completion :- 21/9/2021
- 7 Actual date of completion :- In progress
- 8 Value of Work done :- 42,92,347 = 0
- 9 Extension if any granted No. :- No
- 10 Ground for extension :- land problem & Public hendness.
- 11 Extension Now Applied for :- 31/03/2022
- 12 Recommendation by the A.E. :- Due to Covid-19 and land Problem work is not completed on time. So time extension may be granted up to 31/03/2022.
 Time Extension may be granted up to 31/03/2022. work delay due to land problem & Public hendness
- 13 J.E. *[Signature]* 07/10/2021
S.D.O./A.E.
- 14 Recommendation by the E.E. *Due to land problem and in work interest time extension recommended up to 31/3/22.*

Due to land problem and in work interest time extension recommended up to 31/3/22.

[Signature]
Executive Engineer
Work's Division Bafra

EKTA RAJ CONSTRUCTION AND SERVICES PVT. LTD
Rubi Kumari
Director



एकता राज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज AC 977040
 ग्राम-साम्हा सरलाही, जिला-बेगूसराय, पिन कोड-851129
 के द्वारा पो. 07-10-21 का वेजिगेशन

श्री मान् लेख्य प्रमाणक महोदय,
 बेगूसराय।

शपथ-पत्र

मैं, रुबी कुमारी डायरेक्टर ऐकता राज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पति राजेश कुमार पता-ग्राम- साम्हा सरलाही, वार्ड नं०-12, पोस्ट-एस.एस.बशरी, थाना-साम्हा, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन कोड-851129 शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि :-

1. यह कि मैं ऐकता राज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ।
2. यह कि ऐकता राज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-बलिया में एकरारनामा संख्या-10/S.B.D/MMGSY(SC)/2020-21 के तहत Construction of Road With 5Years Maintenance For PMGSY to Pawan Yadav tola. का कार्य आवंटित हुआ है।
3. यह कि वर्णित कार्य के लिए मेरे द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया है।
4. यह कि वर्णित कार्य के समय-वृद्धि की स्वीकृति हो जाती तो मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा भविष्य में नहीं किया जायेगा।
5. यह कि शपथ-पत्र के उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सही है।

अधिवक्ता, बेगूसराय।

श्री शोक कुशुप
 7.10.21
 8.11.21

Ref: 07/10/2021
NOTARY
BEGUSARAI (BIHAR)
 Notary Public (11.6) of B. P. S.
 (11.6) of the District of Begusarai
 No. 189 (11.6) of B. P. S. 1999

Rubi Kumari
 शपथकर्ता

10857 07 OCT 2021

R/M:- PMGSY to Pawan yadav



06/10/21
S.E




06/10/2021
S.E

06/10/21
A.E

08/10/21

Executive Engineer
W D Work's Division Balia


R/N:- pmgsy to Pawan yadav.

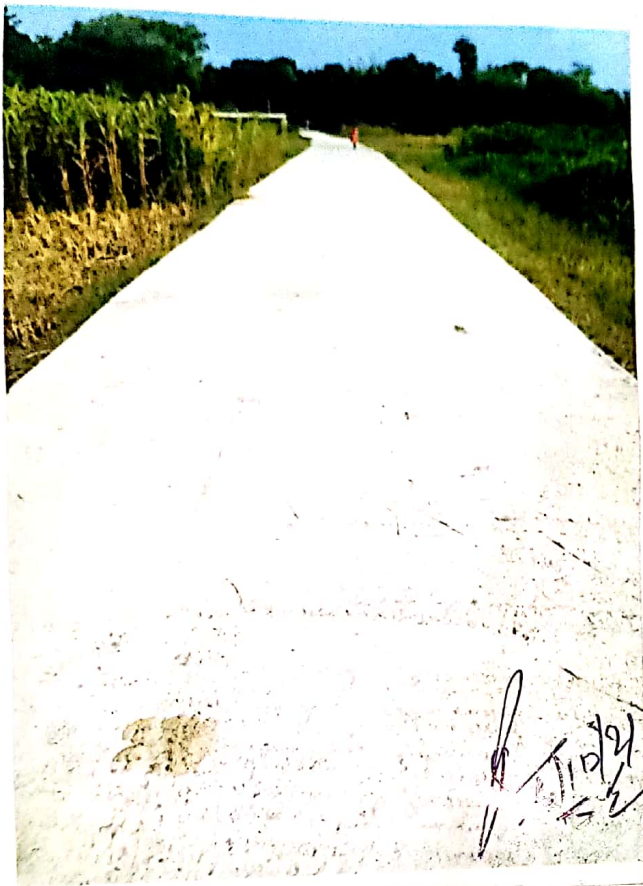

[Signature]
06/10/21
A.E

[Signature] 08/10/21
Executive Engineer
* W.D Work's Division Batla

R/M:- pm6sy to Pawan yadar.

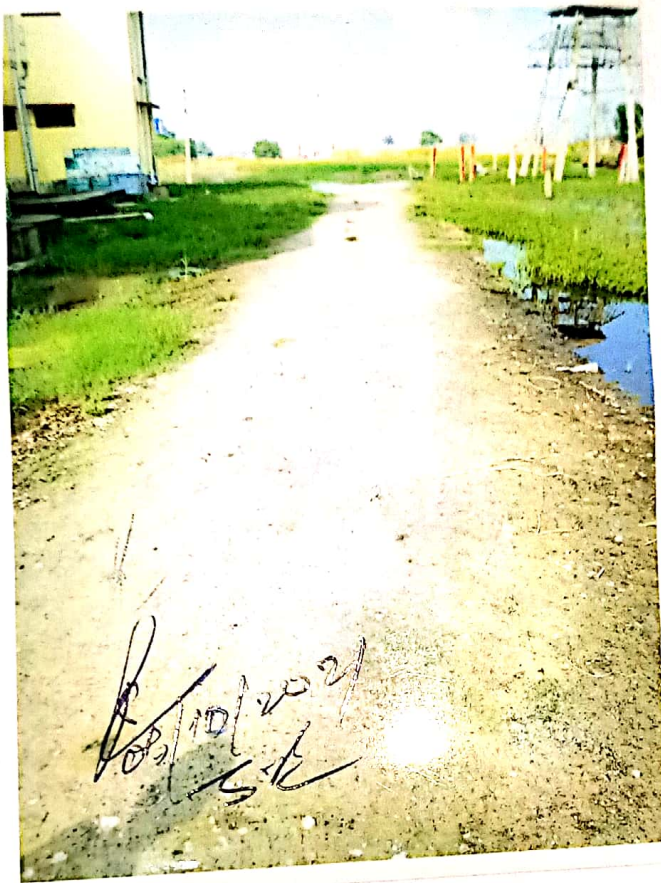

08/10/21
sk

08/10/21
AE

08/10/21
Executive Engineer
R.M.D. Work's Division Baha

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बलिया (बेगूसराय)

पत्रांक /

बलिया, दिनांक.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल बलिया

सेवा में,

अंचल अधिकारी
साहेबपुर कमाल, अंचल बेगूसराय।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत **PMGSY Road to Pawan Yadav tola Saadpur**
सड़क के निर्माण में उत्पन्न भूमि विवाद में विवादित भूमि का मापी कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- एकरारनामा संख्या- **10/SBD/MMGSY(SC)/2020-21**, अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र सिंह,
विविध संघ बलिया के द्वारा समर्पित नोटिस **80 CPC** के अन्तर्गत एवं इस कार्यालय का
पत्रांक- 230 बलिया दिनांक- 15.03.2021 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार
पटना का पत्रांक- 2037 अनु0 पटना दिनांक- 05.04.2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत **PMGSY Road to Pawan Yadav tola Saadpur** सड़क निर्माण का कार्य का एकरारनामा संवेदक एकता राज कन्स्ट्रक्शन एण्ड सर्विसेज प्रा0 लि0 के द्वारा किया गया है, जिसके उपरांत संवेदक द्वारा निट्टी का कार्य प्रारंभ किया गया । पथ के आरेखन में खेसरा नं0- 4828, 4829 एवं 4836 में श्री विरेन्द्र कुमार के द्वारा नीजी जमीन कहकर कार्य को रोकने का अनुरोध किया गया है, जिसका मापी सरकारी अमीन से कराना अतिआवश्यक है, तथा योजना का निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है। इस संबंध में पुनः अनुरोध है कि अपने निरीक्षण में सरकारी अमीन से जमीन का मापी कराकर उत्पन्न भूमि विवाद को समाप्त कराने की कृपा की जाए, ताकि पथ का निर्माण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

६/७

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल बलिया

बलिया, दिनांक.....

पत्रांक /

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया को सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से भी अंचल अधिकारी को भूमि की मापी सरकारी अमीन से कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

६/७

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल बलिया

पत्रांक/

बलिया, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा साहेबपुर कमाल / सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल साहेबपुर कमाल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि को छोड़कर शेष लंबाई में पथ का निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें ।


६७

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल बलिया

पत्रांक31/५...../

बलिया, दिनांक...06-04-2021

प्रतिलिपि:- संवेदक एकता राज कन्स्ट्रक्शन एण्ड सर्विसेज प्रा० लि० को निदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि को छोड़कर शेष लंबाई में पथ का निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें ।

 6/4/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल बलिया

 6/4/21

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

(35)

पत्रांक:-14/अ0प्र0-02-49/2021

3420 31-60

/पटना, दिनांक 27/7/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेगुसराय।

विषय:-

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-9372/2021 विरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-9372/2021 विरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित दायर याचिका की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपके पास भेजी जा रही है।

अतएव दायर याचिका में उठाये गये बिन्दुओं के आलोक में पूर्ण दस्तुस्थिति के साथ कंडिकावार तथ्यात्मक विवरणी तैयार कर विशेष दूत के माध्यम से तीन दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि ससमय माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जा सके।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे। किसी भी प्रकार के विलंब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:-14/अ0प्र0-02-49/2021

3420

/पटना, दिनांक 27/7/2021

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-03, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख


सेवा में,

सौध महोदय,

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार सरकार, बीरिंग केनाल रोड,
पटना।

अभियन्ता प्रमुख



50-14

॥ 2॥ जिला पदाधिकारी महोदय,
बेगूसराय।

॥ 3॥ कार्यपालक अभियन्ता महोदय,
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल, बलिया। बेगूसराय।

॥ 4॥ अधीक्षण अभियन्ता महोदय,
ग्रामीण कार्य विभाग
प्रमण्डल बेगूसराय।

॥ 5॥ अनुसंधानाधिकारी महोदय,
बलिया।

॥ 6॥ अंचलाधिकारी महोदय,
साहेबपुर कमाता।

॥ 7॥ सचिव,

एकता राज कन्सल्टन्ट एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
कार्य प्रमण्डल बलिया। बेगूसराय।

॥ 8॥ जिला योजना पदाधिकारी महोदय,
बेगूसराय।

विषय :- ती० डब्ल्यू० जे० ती० - 9372 /2021 टोकेन ए/ओ-
6911/2021 वीरेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार वगैरह के सम्बन्ध
में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सूचित करना है कि वीरेन्द्र कुमार

जे० स्व० श्रीनाथ महतो वाडे नं०-13 सा०- सादपुर थाना- साहेबपुर

कृ०पृ०उ०-

1826-0249/21
pwt-up-12/4/21
13/4/21
