

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक864..... मोतिहारी, दिनांक 09/10/2021...../

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- कार्य प्रमंडल मोतिहारी के अधीन PMGSY अन्तर्गत पैकेज संख्या- BR-112R-14 Mahopur Nijamat to Bahahi के समयवृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक- 2447 अनु0 दिनांक-07.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि कार्य प्रमंडल मोतिहारी के अधीन PMGSY अन्तर्गत पैकेज संख्या- BR-112R-14 Mahopur Nijamat to Bahahi के समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी अपने पत्रांक-2447, अनु0 दिनांक-07.10.2021 के द्वारा कोविड-19 एवं बाढ़ के कारण का उल्लेख करते हुए दिनांक-26.02.2022 तक समयवृद्धि का आवेदन पत्र अनुशंसा के साथ साक्ष्य सहित समर्पित किए हैं। संवेदक का नाम डिबार अथवा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा इसकी अनुशंसा नहीं किया गया है।

अतः कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समयवृद्धि स्वीकृति हेतु संवेदक का मूल आवेदन पत्र, संवेदक द्वारा समय वृद्धि होने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करने का शपथ पत्र, पथ निर्माण कार्य का रंगीन फोटोग्राफ एवं समय वृद्धि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक-26.02.2022 तक समयवृद्धि के स्वीकृति का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

- अनु0- 1) मूल आवेदन पत्र
2) कार्यपालक अभियंता का अग्रसारण पत्र की छाया प्रति
3) पथ का रंगीन फोटोग्राफ
4) समयवृद्धि हेतु साक्ष्य।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी

8/10/21

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

पत्रांक.....2447अनु0..... / दिनांक 07.10.2021.....
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय :-

PMGSY योजनान्तर्गत BR-112R-14 पथ निर्माण कार्य के समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य पूर्ण हो चुका है। एकरानामा सं०-46 SBD /2020-21 के अनुसार कार्य दिनांक-26.08.2021 तक पूरा करना था परंतु Covid -19 एवं बाढ़ के कारण Madhopur Nijamat to Bagahi (BR-112R- 14) कार्य को पूर्ण करने हेतु संवेदक द्वारा आवेदन विहित प्रपत्र में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा दिनांक- 26.02.2022 तक समय वृद्धि हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संवेदक का आवेदन पत्र, विहित प्रपत्र में समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०- यथोक्त:-

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

समयवृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari

पेश कुमार सिंह

चिकनौटा, पो0-छपरा बहास, थाना-सुगौली,
जिला-पूर्वी चम्पारण-845435
मो0-9631525721

Registration No. : 2190716

ID : 733824856568

GSTIN : 10BGWPS0083G1ZA

PAN No. : BGWPS0083G

पत्रांक.....

दिनांक: 9/07/21

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, मोतिहारी ।

विषय :- समय वृद्धि देने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मुझे PMGSY योजना के अंतर्गत

Madhopur Nijamat To Baghi Package No. : BR11P2R-14

Under PMGSY II रोड़ का निर्माण कार्य कराने हेतु दिनांक - 27.08.2020 को

एकरारनामा किया गया है । जिसे दिनांक -26.08.2021 को पूर्ण कराना था । उक्त रोड़

का निर्माण कराया जा रहा था । अप्रैल माह में Covid-19 महामारी के कारण Lock

Down से कार्य बाधित रहा । साथ ही साथ कार्य कराने हेतु पर्याप्त मजदूर भी उपलब्ध नहीं

हो पाये, जिससे कार्य सूचारु रूप से नहीं हो पाया । माह जून-जुलाई में अतिवर्षा एवं बाढ़

के कारण कार्य स्थल पूर्ण रूप से पानी में डूबा रहा और अभी तक कार्य करने योग्य स्थिति

नहीं है ।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर ध्यान देते

हुए कार्य पूर्ण कराने हेतु 6 (छः) माह का अतिरिक्त समय स्वीकृत करने की कृपा प्रदान की

जाए । इसके हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करूँगा । इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा

आभारी रहूँगा ।

पेश कुमार सिंह
आपका विश्वासी



AFFIDAVIT (शपथ-पत्र) ₹269 05/10/21

₹269
05/10/21

Advocate
and who affirms and declares the facts
mentioned in the affidavit before the
Magistrate

समस्त
लेख्य प्रमाणक,
मोतिहारी प्रदीप चम्पारण

विद्वेषी सिंह

शपथ-पत्र

मैं रमेश कुमार सिंह पत्नी बिन्दुवती सिंह साठ चिकनौटा, पो-
दपरा बहाल, ग्राम सुजौली, जिला प्रदीप चम्पारण शपथ-पत्रक
कमान करता हूँ कि:-

(1) यह कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत माधोपुर निजामत
से कगही पैकेज नं० BR11P2R-14 under PMGSY II का पत्र का
निर्माण मेरे द्वारा कराया जा रहा है जिसका एकराशनामा नं० S.B.D.
46 SBD/2020-2021 है।

(2) यह कि कार्य होने के दौरान काफी बारिश एवं वाद आने के कारण
एवं कोविड-19 में लॉक डाउन लगने के कारण समय पर कार्य
पूरा नहीं हो सका।

(3) यह कि कार्य स्थल पर भारी जल जमाव हो गया था जिसका
फोटो इस आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

(3) यह कि मेरे द्वारा वर्क प्रोग्राम दिया गया है जिसमें मुझे कार्य
स्वप्नादित करने हेतु 26-2-2022 तक का समय दिया जाये।

(4) यह कि मेरे द्वारा दिया गया वर्क प्रोग्राम सही है।

(5) यह कि समय वृद्धि के पश्चात मेरे द्वारा दूसरा अन्य विधि
दावा नहीं किया जायेगा

अतः शपथ-पत्र है।

Advocate
SANJAY KUMAR
Motihari, Champaran
Reg. No. 101/2019
Govt. of India

05/10/21-दि.
एव शपथकर्ता

सत्यापन

मैं रमेश कुमार सिंह पुनः लच लच एकराशनामा हूँ कि उपरोक्त
लिखि गई सारी बातें सही दो सत्य हैं।

Rajesh Kumar

05/10/21-दि.

एव पहचानकर्ता 05/10/21

एव शपथकर्ता

पेश कुमार सिंह

म-चिकनौटा, पो-छपरा बहास, थाना-सुगौली,
जिला-पूर्वी चम्पारण-845435
मो-9631525721

Registration No. : 2190716

ID : 733824856568

GSTIN : 10BGWPS0083G1ZA

PAN No. : BGWPS0083G

दिनांक: 05/10/21

पत्रांक.....
मुद्रा/शाखा
07/10/21
7/10/21

Work Programme

Name of work— Madhopur Nijamat To Baghi
Package NO: BR11P2R-14
Under PMGSY II
Road

GSB— Done
WBM II— Done
WBM III— Done
Mix Seal— Done
BM— Done
SDBC— Done
P.C.C.— December 2021
पुलिया
Rat— Done
Wall-2 Lift— Done
Deck slab— January 2022
Return wall— February 2022
Approach— February 2022 - 26.2

पेश कुमार सिंह



Latitude: 26.804133
Longitude: 84.787516
Elevation: 67.93±7 m
Accuracy: 4.3 m
Time: 10-07-2021 09:24

Powered by Mapbox

Name of Work - Madhopur Nijamat To Baghi Panchayat
BR11P2R-14 under PMGSY II


05/10/21
J.F.


05/10/21
A.E.


05/10/21
R.W.D. (W) Division

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari



Latitude: 26.803446
Longitude: 84.787751
Elevation: 66.94±8 m
Accuracy: 4.6 m
Time: 10-07-2021 09:28

Powered by NoteCam



प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क : माधोपुर निजामत से बगही : पैकेज नं. : BR-11/CR-14.
कुल लम्बाई : 3.678 किमी. अनु. लागत : 2084.5184 लाख रु.
5 वर्ष तक सामान्य अनुरक्षण की लागत : 2118949 लाख रु.

आरंभ पूर्ण

कार्य : 27-08-2020 26-08-2021

अनुरक्षण : पाँच वर्ष

संवर्द्धक का नाम : रुपेश कुमार सिंह, चिकनौटा, सुगौली, यू. च.
कार्य निष्पादन द्वारा : ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, बिहार सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम

Latitude: 26.800756

Longitude: 84.787804

Elevation: 71.31±9 m


Accuracy: 4.9 m

Time: 04-10-2021 10:22

Note: Madhavpur nizamat to Bhaudhi


Powered by Moxia map

itude: 26.800731
 ngitude: 84.787848
 vation: 71.63±14 m
 uracy: 6.4 m
 he: 04-10-2021 10:21
 e: Madhavpur nizamat to

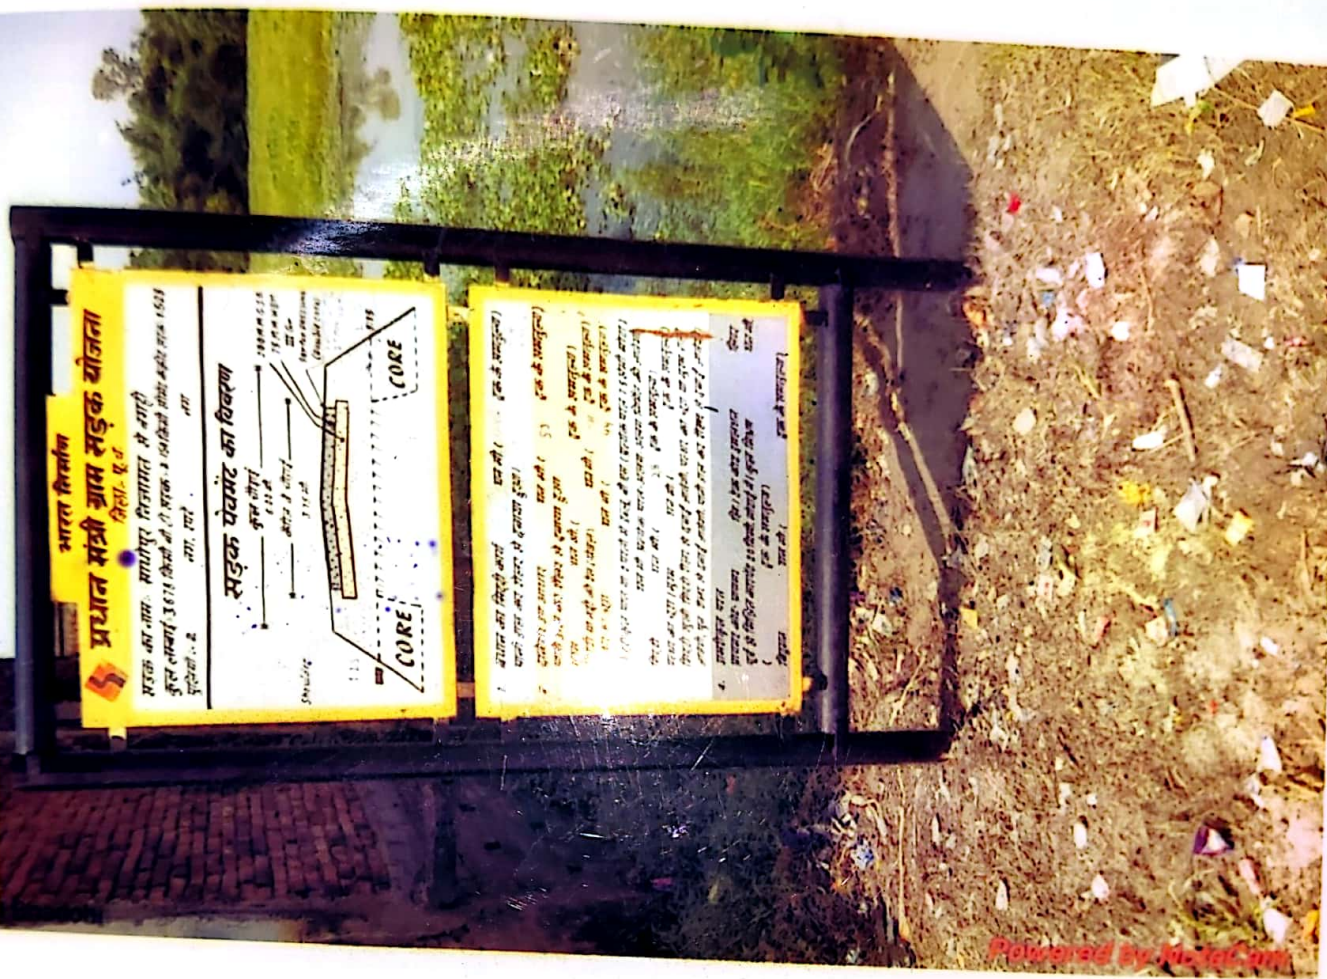

भारत निर्माण
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
 विभाग: पू. व.

सड़क का नाम: साधपुर निजामत से साधपुर
 कुल लम्बाई: 3.675 कि.मी. की (1) सड़क - 3.675 कि.मी. सड़क का नाम: 15.53
 कुल लागत: ₹. 2.00 करोड़



1. साधपुर का निर्माण कार्य: सड़क की लम्बाई: 3.675 कि.मी. (1) सड़क - 3.675 कि.मी. सड़क का नाम: 15.53
2. साधपुर का निर्माण कार्य: सड़क की लम्बाई: 3.675 कि.मी. (1) सड़क - 3.675 कि.मी. सड़क का नाम: 15.53
3. साधपुर का निर्माण कार्य: सड़क की लम्बाई: 3.675 कि.मी. (1) सड़क - 3.675 कि.मी. सड़क का नाम: 15.53
4. साधपुर का निर्माण कार्य: सड़क की लम्बाई: 3.675 कि.मी. (1) सड़क - 3.675 कि.मी. सड़क का नाम: 15.53



Latitude: 26.822264
Longitude: 84.78276
Elevation: 75.95±7 m
Accuracy: 5.6 m
Time: 04-10-2021 10:32
Note: Madhavpur nizamat to Bhadohi

Powered By NoteCam



Latitude: 26.820027
Longitude: 84.780786
Elevation: 71.77±6 m
Accuracy: 295.4 m
Time: 02-07-2021 10:56
Note: b

Powered by

Name of work -

Name of work - Madhopur Nijamat To Baghi Package NO:
BR1P2R-14 under PMGSY II

05/10/21
J.E

✓ AH
05/10/21
AE.

✓
05/10/21
EE

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari
